

総括監督員	主任監督員	監督員

令和 年 月 日

総括監督員 ○○ ○ 様

株式会社 ○○電機
現場代理人 □□ ○○

作 業 要 領 書

(○○棟停電切替作業)

作業名を記入すること。

工事名 下水処理センター○○電気設備工事

上記工事について、別紙のとおり作業要領書を提出しますので、ご承認下さいますようお願いいたします。

記

1. 日程

令和 4 年 1 月 19 日 (水) 23:00 ～ 20 日 (木) 7:30

2. 作業管理体制表

別紙のとおり

3. 作業手順

別紙のとおり


準備から原状復帰までの所要時間を記入すること。

4. 図面

別紙のとおり

以上

2. 作業管理体制表

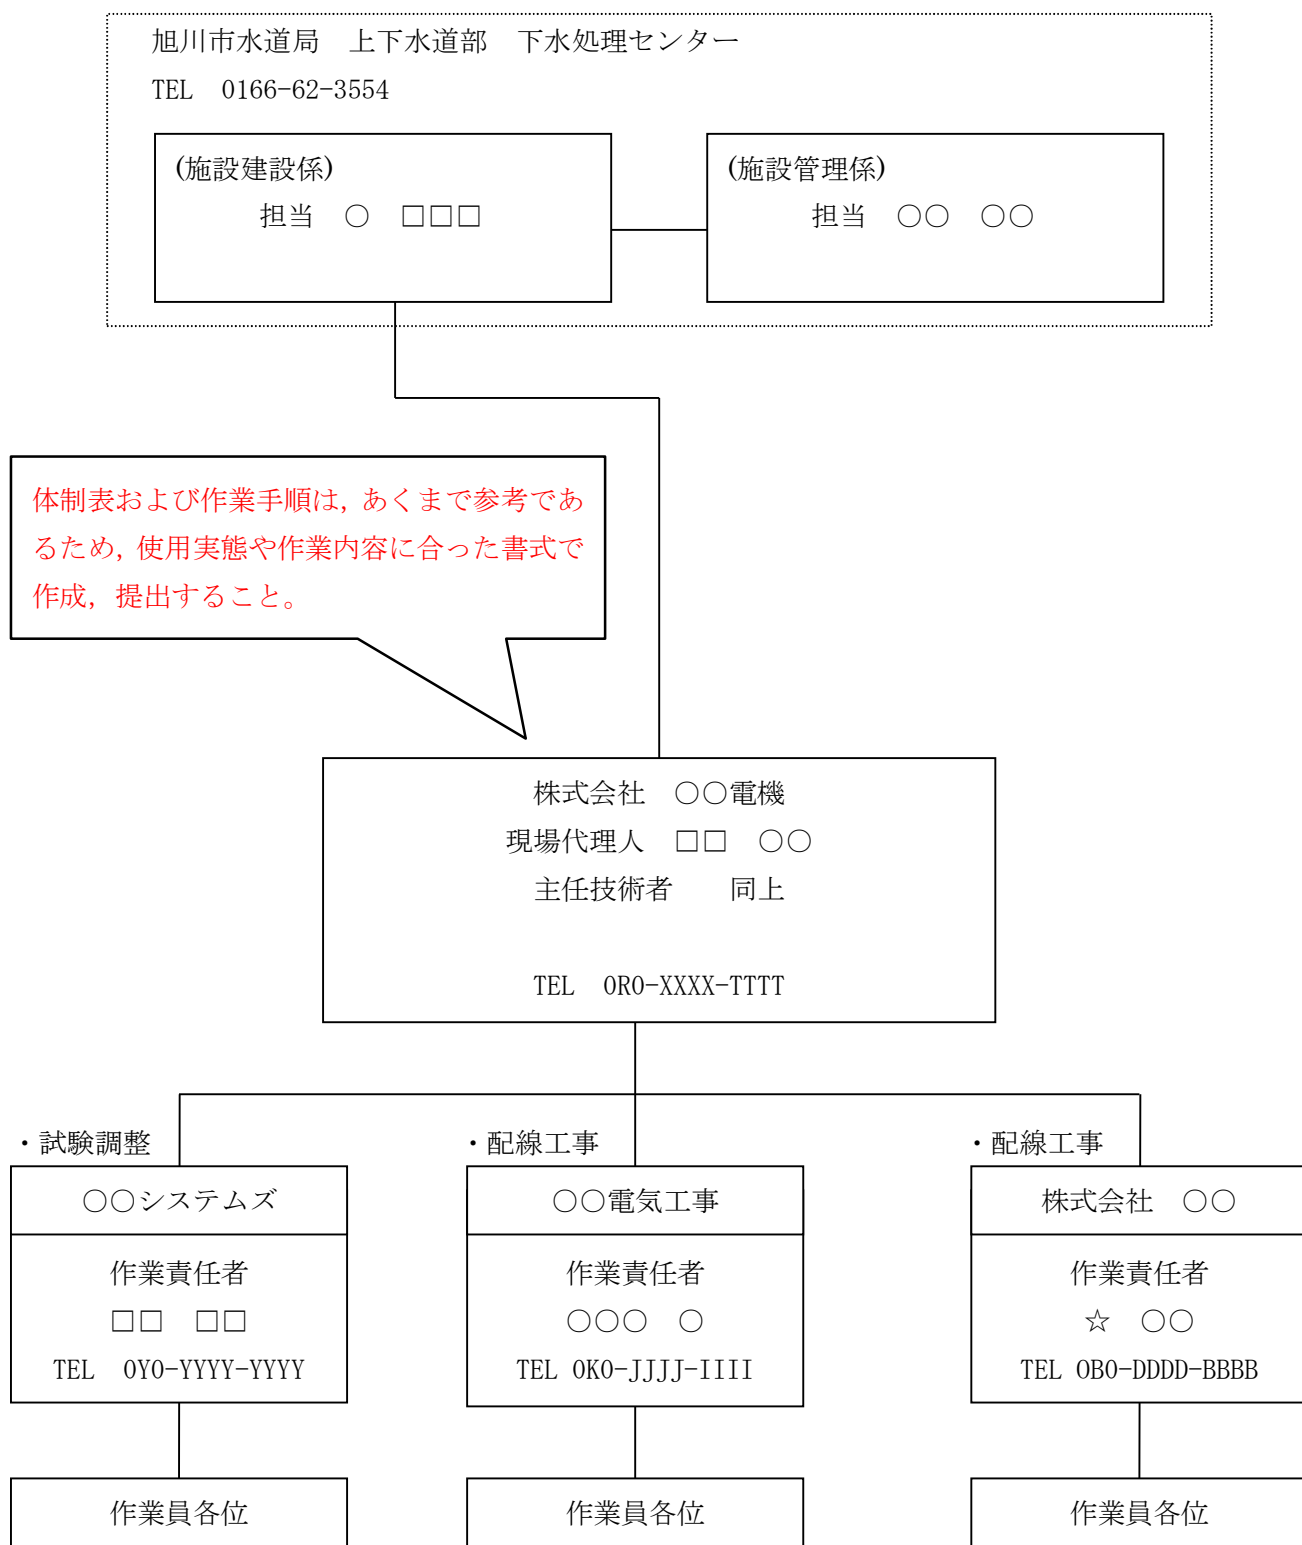

※別紙1において、有資格者を示す

(別紙 1) 有資格者名簿

[illegible]

3. 作業手順

チャート図および各工程ごとの手順書類を添付すること。

作業工程	作業実施内容	備考
23 : 00～23 : 30	切替準備のため養生（コーン，仮設電灯，発電機等）	汚水処理停止準備をお願いします。（運転管理担当者様）
19 日 23 : 30 ～ 20 日 0 : 00	- 安全確認及び作業前ミーティング（全員参加をお願いします） - 準備のため〇〇棟，□□棟移動	ミーティング終了次第停電作業に移行します。
0 : 00～0 : 30	〇〇棟，□□棟にて施設停電 仮設電灯設備の運転開始 - 本館～〇〇棟き電回路停電	既設の機器停止および停電操作をお願いします。（運転管理担当者様）
0 : 30～2 : 30	〇〇棟配線切替(既設～新設盤) □□棟，〇〇棟機器試験調整（配線作業終了後に〇〇棟試験）	
2 : 30～3 : 00	□□棟作業完了報告（監督員様へ） □□棟停電復帰操作（運転管理担当者様）	□□棟の運転は，この時点で再開可能です。
3 : 00～5 : 00	〇〇棟機器試験調整 〇〇棟配線撤去（不要分）	盤撤去は後日実施します。
5 : 00～6 : 30	〇〇棟仮復帰（本館き電回路含め） 〇〇棟停電試験（系統保護）	本館既設盤の操作をお願いします。（運転管理担当者様）
6 : 30～7 : 00	〇〇棟停電復帰 - 作業完了報告（監督員様へ）	停電復帰後に〇〇棟の運転を再開してください。
7 : 00～7 : 30	- 運転状況確認（〇〇システムズ） - 後片付け（その他）	運転不具合対応は〇〇システムズで実施します。（立ち上げ～安定まで）

本例は施設影響が大きいため，維持管理担当との事前打合せに協力すること。
