

旭川市公共施設等総合管理計画 第1期アクションプログラム施設保全計画表取組状況【令和3年度版】

■施設保全計画策定時(平成31年3月)の施設の状況


施設の状況	件数	割合
1 「A:劣化・損傷がない」又は「B:わずかな劣化損傷のみ」がみられるが、補修・修繕を施す程度には至っていない」項目のみ	68	66.7%
2 「C:ある程度の劣化・損傷が見られるため、進行経過を注視し、計画的に補修・修繕する必要がある」項目がある	8	7.8%
3 「D:劣化・損傷が著しく、危害を及ぼすおそれがあるため、直ちに補修・修繕を必要とする」項目がある	3	2.9%
- 評価なし(個別施設計画作成中)	23	22.5%
計	102	100.0%

※個別施設保全計画未作成施設(16施設23件)
 ※学校(59施設)を除く

○施設の状況の区分(複数区分に該当の場合は、低い区分に分類)

- 区分1 予防保全部位に指摘がない
- 区分2 予防保全部位に「要是正(既存不適格)」の項目がある
- 区分3 予防保全部位に「要是正」の項目がある

※定期点検・通常点検結果の判定区分の変更に合わせて、4区分から3区分に修正している。
 ※既存不適格：建築基準法等が改正及び施行され、建築物の全部又は一部が適法しなくなった状態をいう。基本的には、迅速に適合させるための改修はしなくてよいが、増築、改築等の工事を行う際は、適合させなければならない。

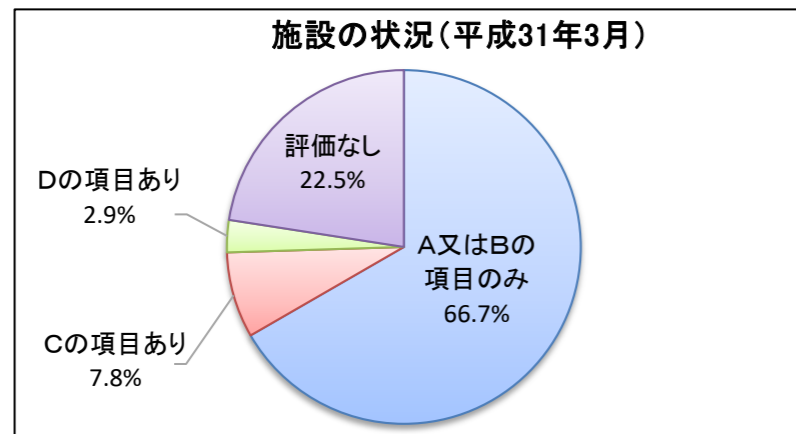



■令和2年度末の施設状況及び計画的な更新状況

施設の状況	件数	割合	計画的な更新状況	件数	割合
1 予防保全部位に指摘がない	47	46.5%	1 「Ⅰ:計画通り実施(予定を含む)」の項目のみ	3	3.0%
2 予防保全部位に「要是正(既存不適格)」の項目がある	1	1.0%	2 「Ⅱ:一部実施(予定を含む)」の項目がある	0	0.0%
3 予防保全部位に「要是正」の項目がある	53	52.5%	3 「Ⅲ:未更新のまま」の項目がある	78	77.2%
-			- 未更新の項目なし	20	19.8%
計	101	100.0%	計	101	100.0%

※学校(60施設)を除く
 ※追加施設:緑が丘地域活動センター(新築)
 ※除外施設:南消防署忠和出張所,旭山動物園爬虫類舎(定期点検対象外となったため)

○計画的な更新状況の区分(複数区分に該当の場合は、低い区分に分類)

- 区分1 「Ⅰ:計画どおり実施(予定を含む)」の項目のみ
- 区分2 「Ⅱ:一部実施(予定を含む)」の項目がある
- 区分3 「Ⅲ:未更新のまま」の項目がある
- 区分なし 更新周期を経過した項目がないもの

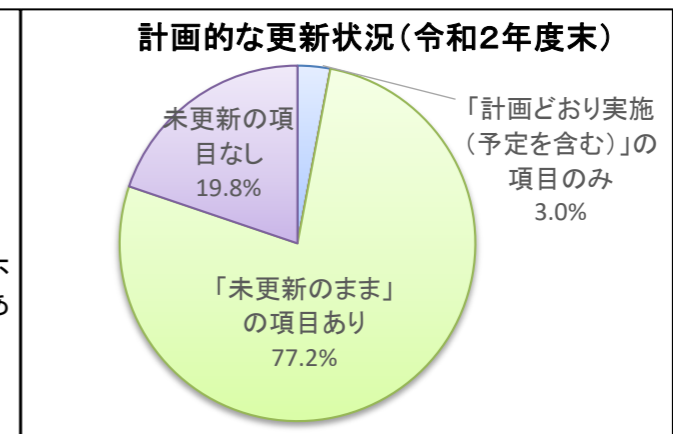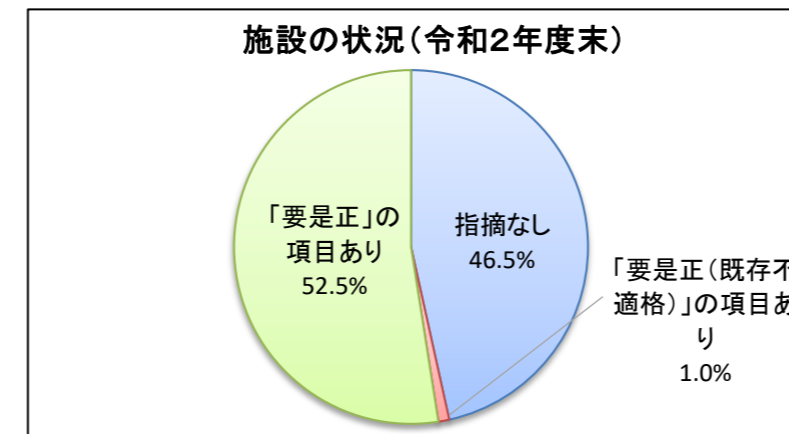

■令和2年度末の状況

- ・施設の状況としては、予防保全部位に「要是正」の項目がある施設が53.5%となっており、約半数の施設において、何らかの補修や修繕が必要になっています。
- ・計画的な更新状況は、77.2%の施設が未更新のままの予防保全部位がある状況となっています。この中には、更新周期も10年以上経過し、「要是正」となっている予防保全部位がある施設も含まれており、必要な更新が十分に実施できていない状況となっています。

旭川市公共施設等総合管理計画 第1期アクションプログラム施設保全計画表取組状況【令和3年度版】

※2019～2021年度の予定欄は、更新周期を経過していないものは「-」とした。
 ※主な更新周期は各施設の長期修繕計画を参考とした。

【施設保全計画表】（平成31年3月時点）										令和2年度末の状況							
大分類	No.	施設(建物名)	予防保全部位	更新後等の経過年数～2018	第1期アクションプログラム期間(H31～R9)			施設の状況	未更新等の経過期間(3区分)	予防保全部位	2019～2021年度(令和元～3年度)の予定	2019～2021年度の内容			施設の状況	未更新等の経過期間(3区分)	
					2019～2021	2022～2024	2025～2027					2019実績(令和元年度)	2020実績(令和2年度)	2021予定(令和3年度)			
市民文化系施設	1	ときわ市民ホール 延床面積 4,927.28㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	30年	未更新(防水等)			A	5年以内	屋上・屋根	Ⅲ:未更新のまま				指摘なし	5年以内	
			外壁	30年	未更新(塗装等)			A	10年超え	外壁	Ⅲ:未更新のまま				指摘なし	10年超え	
			受変電	30年	未更新(受変電)			A	5年以内	受変電	I:計画通り実施(予定を含む)			更新予定(受変電)	指摘なし	5年以内	
			非常電源	30年	未更新(発電機)			A	5年以内	非常電源	Ⅲ:未更新のまま				指摘なし	5年以内	
			空調	30年	未更新(熱源機等)			A	10年超え	空調	Ⅲ:未更新のまま				指摘なし	10年超え	
			衛生	30年	未更新(ポンプ等)			A	5年以内	衛生	Ⅲ:未更新のまま				指摘なし	5年以内	
			防災	30年	未更新(ポンプ)	更新(中央監視)		A	10年超え	防災	Ⅲ:未更新のまま				要是正(既存不適格)	10年超え	
			昇降	30年	未更新(エレベーター)			A	5年以内	昇降	Ⅲ:未更新のまま				指摘なし	5年以内	
			概算費用(千円)					219,621	65,846	-		区分	3				2
市民文化系施設	2	勤労者福祉会館 延床面積 2,587.46㎡ 目標使用年数 65年 「要」耐震診断	屋上・屋根	37年	未更新(屋根等)			A	10年以内	屋上・屋根	Ⅲ:未更新のまま				指摘なし	10年以内	
			外壁	37年	未更新(塗装等)			A	10年超え	外壁	Ⅲ:未更新のまま				指摘なし	10年超え	
			受変電	37年	未更新(受変電)			A	10年以内	受変電	I:計画通り実施(予定を含む)			更新済み(受変電)	指摘なし	-	
			非常電源	37年	未更新(発電機)			A	10年以内	非常電源	Ⅲ:未更新のまま				指摘なし	10年以内	
			空調	37年	未更新(熱源機等)			A	10年以内	空調	Ⅲ:未更新のまま				指摘なし	10年以内	
			衛生	37年	未更新(ポンプ等)			A	10年以内	衛生	Ⅲ:未更新のまま				指摘なし	10年以内	
			防災	37年	未更新(ポンプ)			A	10年超え	防災	Ⅲ:未更新のまま				指摘なし	10年超え	
			昇降							昇降							
			概算費用(千円)					88,249	-	-		区分	3				1
市民文化系施設	3	東部住民センター 延床面積 1,497.03㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	36年	未更新(防水)			A	10年以内	屋上・屋根	Ⅲ:未更新のまま				指摘なし	10年以内	
			外壁	14年	-	更新(塗装等)			A	-	外壁	-				要是正	-
			受変電								受変電						
			非常電源								非常電源						
			空調	36年	未更新(空調配管)			A	10年以内	空調	Ⅲ:未更新のまま				指摘なし	10年以内	
			衛生	36年	未更新(給排水管)	更新(ポンプ)		A	10年以内	衛生	Ⅲ:未更新のまま				指摘なし	10年以内	
			防災							防災							
			昇降							昇降							
			概算費用(千円)					21,758	5,878	1,878		区分	3				3
市民文化系施設	4	北部住民センター 延床面積 1,255.35㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	33年	未更新(防水)			A	5年以内	屋上・屋根	Ⅲ:未更新のまま				要是正	10年以内	
			外壁	33年	未更新(塗装一部)	更新(塗装一部)			A	10年超え	外壁	Ⅲ:未更新のまま				要是正	10年超え
			受変電								受変電						
			非常電源								非常電源						
			空調	33年	未更新(配管)			A	5年以内	空調	Ⅲ:未更新のまま				指摘なし	10年以内	
			衛生	33年	未更新(給排水管)			A	5年以内	衛生	Ⅲ:未更新のまま				指摘なし	10年以内	
			防災							防災							
			昇降							昇降							
			概算費用(千円)					39,491	5,956	-		区分	3				3

旭川市公共施設等総合管理計画 第1期アクションプログラム施設保全計画表取組状況【令和3年度版】

※2019～2021年度の予定欄は、更新周期を経過していないものは「-」とした。
 ※主な更新周期は各施設の長期修繕計画を参考とした。

【施設保全計画表】（平成31年3月時点）										令和2年度末の状況							
大分類	No.	施設(建物名)	予防保全部位	更新後等の経過年数～2018	第1期アクションプログラム期間(H31～R9)			施設の状況	未更新等の経過期間(3区分)	予防保全部位	2019～2021年度(令和元～3年度)の予定	2019～2021年度の内容			施設の状況	未更新等の経過期間(3区分)	
					2019-2021	2022-2024	2025-2027					2019実績(令和元年度)	2020実績(令和2年度)	2021予定(令和3年度)			
市民文化系施設	5	永山住民センター 延床面積 1,260.08㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	32年	未更新(屋根等)			A	5年以内	屋上・屋根	Ⅲ:未更新のまま				指摘なし	5年以内	
			外壁	14年	-	更新(塗装等)			A	-	外壁	-				要是正	-
			受変電								受変電						
			非常電源								非常電源						
			空調	32年	未更新(熱源機等)				A	10年超え	空調	Ⅱ:一部実施(予定を含む)			更新予定(温風暖房機一部)	指摘なし	10年超え
			衛生	32年	未更新(ポンプ等)				A	5年以内	衛生	Ⅱ:一部実施(予定を含む)			更新予定(給水ポンプ)	指摘なし	5年以内
			防災								防災						
			昇降								昇降						
			概算費用(千円)			49,941	7,986	-				区分	3				3
市民文化系施設	6	神居住民センター 延床面積 1,260.08㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	30年	未更新(防水)			A	5年以内	屋上・屋根	Ⅲ:未更新のまま				指摘なし	5年以内	
			外壁	30年	未更新(塗装等)				A	10年超え	外壁	Ⅲ:未更新のまま				要是正	10年超え
			受変電								受変電						
			非常電源								非常電源						
			空調	30年	未更新(熱源機等)				A	10年超え	空調	Ⅲ:未更新のまま				指摘なし	10年超え
			衛生	30年	未更新(ポンプ等)				A	10年超え	衛生	Ⅲ:未更新のまま				要是正	10年超え
			防災								防災						
			昇降								昇降						
			概算費用(千円)			43,290	-	-				区分	3				3
市民文化系施設	7	末広地区センター 延床面積 827.76㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	28年	更新(防水)			A	-	屋上・屋根	Ⅲ:未更新のまま				指摘なし	5年以内	
			外壁	28年	未更新(塗装等)				A	10年以内	外壁	Ⅱ:一部実施(予定を含む)		更新(外壁塗装)		指摘なし	10年超え
			受変電								受変電						
			非常電源								非常電源						
			空調								空調	Ⅲ:未更新のまま				指摘なし	5年以内
			衛生	28年	更新(給排水管)				A	-	衛生	Ⅲ:未更新のまま				指摘なし	5年以内
			防災								防災						
			昇降								昇降						
			概算費用(千円)			31,125	-	-				区分	3				1
市民文化系施設	8	豊岡地区センター 延床面積 803.56㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	27年	更新(防水)			A	-	屋上・屋根	Ⅲ:未更新のまま				指摘なし	-	
			外壁	27年	未更新(塗装等)				A	10年以内	外壁	Ⅲ:未更新のまま				要是正	10年以内
			受変電								受変電						
			非常電源								非常電源						
			空調								空調						
			衛生	27年	更新(給排水管)				A	-	衛生	Ⅲ:未更新のまま				指摘なし	-
			防災								防災						
			昇降								昇降						
			概算費用(千円)			40,135	-	-				区分	3				3

旭川市公共施設等総合管理計画 第1期アクションプログラム施設保全計画表取組状況【令和3年度版】

※2019～2021年度の予定欄は、更新周期を経過していないものは「-」とした。
 ※主な更新周期は各施設の長期修繕計画を参考とした。

【施設保全計画表】（平成31年3月時点）										令和2年度末の状況						
大分類	No.	施設(建物名)	予防保全部位	更新後等の経過年数～2018	第1期アクションプログラム期間(H31～R9)			施設の状況	未更新等の経過期間(3区分)	予防保全部位	2019～2021年度(令和元～3年度)の予定	2019～2021年度の内容			施設の状況	未更新等の経過期間(3区分)
					2019～2021	2022～2024	2025～2027					2019実績(令和元年度)	2020実績(令和2年度)	2021予定(令和3年度)		
市民文化系施設	9	忠和地区センター 延床面積 810.75㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	27年	更新(防水)			A	-	屋上・屋根	Ⅲ:未更新のまま				要是正	-
			外壁	27年	未更新(塗装等)			A	10年以内	外壁	Ⅲ:未更新のまま				要是正	10年以内
			受変電							受変電						
			非常電源							非常電源						
			空調	27年	更新(空調配管)			A	-	空調	Ⅲ:未更新のまま				指摘なし	-
			衛生	27年	更新(給排水管)			A	-	衛生	Ⅲ:未更新のまま				指摘なし	-
			防災							防災						
			昇降							昇降						
			概算費用(千円)				30.903	-	-			区分	3			
市民文化系施設	10	啓明地区センター 延床面積 820.36㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	22年	-	-	更新(防水)	A	-	屋上・屋根	-				指摘なし	-
			外壁	22年	未更新(塗装等)			A	5年以内	外壁	Ⅲ:未更新のまま				指摘なし	5年以内
			受変電							受変電						
			非常電源							非常電源						
			空調	22年	-	-	更新(空調配管)	A	-	空調	-				指摘なし	-
			衛生	22年	-	-	更新(衛生配管)	A	-	衛生	-				指摘なし	-
			防災							防災						
			昇降							昇降						
			概算費用(千円)				14.071	-	32.256			区分	3			
市民文化系施設	11	神楽岡地区センター 延床面積 830.74㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	20年						屋上・屋根	-				指摘なし	-
			外壁	20年						外壁	Ⅲ:未更新のまま				指摘なし	5年以内
			受変電	20年						受変電						
			非常電源	20年			作成中			非常電源						
			空調	20年						空調	-				指摘なし	-
			衛生	20年						衛生	-				指摘なし	-
			防災	20年						防災						
			昇降							昇降						
			概算費用(千円)									区分	3			
市民文化系施設	12	新旭川地区センター 延床面積 827.63㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	19年						屋上・屋根	-				要是正	-
			外壁	19年						外壁	Ⅲ:未更新のまま				指摘なし	5年以内
			受変電	19年						受変電						
			非常電源	19年			作成中			非常電源						
			空調	19年						空調	-				指摘なし	-
			衛生	19年						衛生	-				指摘なし	-
			防災	19年						防災						
			昇降							昇降						
			概算費用(千円)									区分	3			

旭川市公共施設等総合管理計画 第1期アクションプログラム施設保全計画表取組状況【令和3年度版】

※2019～2021年度の予定欄は、更新周期を経過していないものは「-」とした。
 ※主な更新周期は各施設の長期修繕計画を参考とした。

【施設保全計画表】（平成31年3月時点）										令和2年度末の状況							
大分類	No.	施設(建物名)	予防保全部位	更新後等の経過年数～2018	第1期アクションプログラム期間(H31～R9)			施設の状況	未更新等の経過期間(3区分)	予防保全部位	2019～2021年度(令和元～3年度)の予定	2019～2021年度の内容			施設の状況	未更新等の経過期間(3区分)	
					2019-2021	2022-2024	2025-2027					2019実績(令和元年度)	2020実績(令和2年度)	2021予定(令和3年度)			
市民文化系施設	13	北星地区センター 延床面積 850.78㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	17年						屋上・屋根	-				指摘なし	-	
			外壁	17年						外壁	Ⅲ:未更新のまま				要是正	-	
			受変電	17年						受変電							
			非常電源	17年		作成中				非常電源							
			空調	17年						空調	-				指摘なし	-	
			衛生	17年						衛生	-				指摘なし	-	
			防災	17年						防災							
			昇降							昇降							
			概算費用(千円)								区分	3				3	
市民文化系施設	14	春光台地区センター 延床面積 1,101.15㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	17年	-	-	-	A	-	屋上・屋根	-				指摘なし	-	
			外壁	17年	更新(塗装等)				A	-	外壁	Ⅲ:未更新のまま				要是正	-
			受変電								受変電						
			非常電源								非常電源						
			空調	17年	-	-	-	A	-	空調	-				指摘なし	-	
			衛生	17年	-	-	-	A	-	衛生	-				指摘なし	-	
			防災								防災						
			昇降								昇降						
			概算費用(千円)		15,977	-	-				区分	3				3	
市民文化系施設	15	市民活動交流センター 延床面積 1,656.02㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	9年	-	-	-	A	-	屋上・屋根	-				要是正	-	
			外壁	9年	-	-	-	A	-	外壁	-				要是正	-	
			受変電	9年	-	-	-	A	-	受変電	-				指摘なし	-	
			非常電源	9年	-	-	-	A	-	非常電源	-				指摘なし	-	
			空調	9年	-	-	-	A	-	空調	-				指摘なし	-	
			衛生	9年	-	-	-	A	-	衛生	-				指摘なし	-	
			防災								防災						
			昇降	9年	-	-	-	A	-	昇降	-				指摘なし	-	
			概算費用(千円)		-	-	-				区分	-				3	
市民文化系施設	16	嵐山中央会館 延床面積 545.41㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	22年						屋上・屋根	-				指摘なし	-	
			外壁	22年						外壁	-				指摘なし	5年以内	
			受変電	22年						受変電							
			非常電源	22年		作成中				非常電源							
			空調	22年						空調	-				指摘なし	5年以内	
			衛生	22年						衛生	-				指摘なし	-	
			防災	22年						防災	-				指摘なし	5年以内	
			昇降							昇降	-						
			概算費用(千円)								区分	-				1	

旭川市公共施設等総合管理計画 第1期アクションプログラム施設保全計画表取組状況【令和3年度版】

※2019～2021年度の予定欄は、更新周期を超過していないものは「-」とした。
 ※主な更新周期は各施設の長期修繕計画を参考とした。

【施設保全計画表】（平成31年3月時点）										令和2年度末の状況						
大分類	No.	施設(建物名)	予防保全部位	更新後等の経過年数～2018	第1期アクションプログラム期間(H31～R9)			施設の状況	未更新等の経過期間(3区分)	予防保全部位	2019～2021年度(令和元～3年度)の予定	2019～2021年度の内容			施設の状況	未更新等の経過期間(3区分)
					2019-2021	2022-2024	2025-2027					2019実績(令和元年度)	2020実績(令和2年度)	2021予定(令和3年度)		
市民文化系施設	17	旭川市民生活館 延床面積 822.35㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	30年						屋上・屋根	I:計画通り実施(予定を含む)				指摘なし	5年以内
			外壁	30年						外壁	Ⅲ:未更新のまま				指摘なし	10年超え
			受変電	30年						受変電						
			非常電源	30年		作成中				非常電源						
			空調	30年						空調						
			衛生	30年						衛生	Ⅲ:未更新のまま				指摘なし	5年以内
			防災	30年						防災						
			昇降							昇降						
			概算費用(千円)				41,069					区分	3			1
市民文化系施設	18-1	神楽公民館 神楽市民交流センター 延床面積 5,258.98㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	29年	更新(屋根一部)			A	-	屋上・屋根	Ⅲ:未更新のまま				指摘なし	5年以内
			外壁	29年	未更新(シーリング)		更新(塗装等一部)	A	-	外壁	Ⅲ:未更新のまま				要是正	10年超え
			受変電	11年	更新(受変電)			A	-	受変電	-				指摘なし	-
			非常電源							非常電源						
			空調	29年	更新(暖房熱源等)		更新(冷暖房熱源)	A	-	空調	Ⅲ:未更新のまま				指摘なし	5年以内
			衛生	29年	更新(給排水管)		更新(ポンプ)	A	-	衛生	Ⅲ:未更新のまま				指摘なし	5年以内
			防災	29年	未更新(ポンプ等)			A	-	防災	Ⅲ:未更新のまま				指摘なし	5年以内
			昇降	11年	-	-	-	A	-	昇降	-				指摘なし	-
			概算費用(千円)				87,301		-	72,182		区分	3			3
市民文化系施設	18-2	木楽輪	屋上・屋根	29年	更新(屋根)			A	-	屋上・屋根	Ⅲ:未更新のまま				指摘なし	5年以内
			外壁	29年	未更新(塗装等)			A	10年以内	外壁	Ⅲ:未更新のまま				指摘なし	10年超え
			概算費用(千円)				9,116		-	-		区分	3		1	
市民文化系施設	18-3	別棟倉庫 延床面積 720.93㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	29年	更新(防水)			A	10年以内	屋上・屋根	Ⅲ:未更新のまま				指摘なし	5年以内
			外壁	29年	未更新(塗装等)			A	10年以内	外壁	Ⅲ:未更新のまま				指摘なし	10年超え
			非常電源	11年	-	-	-	A	-	非常電源	-		雷での障害による修繕実施		指摘なし	-
			概算費用(千円)				10,679		-	-		区分	3		1	
市民文化系施設	19	末広公民館 延床面積 692.82㎡ 目標使用年数 65年 「要」耐震診断	屋上・屋根	39年	未更新(防水)			A	10年以内	屋上・屋根	Ⅱ:一部実施(予定を含む)		屋上立上パラペット一部修繕		要是正	10年超え
			外壁	39年	未更新(塗装等)			D	10年超え	外壁	Ⅲ:未更新のまま				要是正	10年超え
			受変電							受変電						
			非常電源							非常電源						
			空調							空調						
			衛生	39年	未更新(給排水管)			A	10年以内	衛生	Ⅱ:一部実施(予定を含む)	一部給水管漏水修繕			指摘なし	10年超え
			防災							防災						
			昇降							昇降						
			概算費用(千円)				16,578		-	-		区分	3			3

旭川市公共施設等総合管理計画 第1期アクションプログラム施設保全計画表取組状況【令和3年度版】

※2019～2021年度の予定欄は、更新周期を経過していないものは「-」とした。
 ※主な更新周期は各施設の長期修繕計画を参考とした。

【施設保全計画表】（平成31年3月時点）										令和2年度末の状況							
大分類	No.	施設(建物名)	予防保全部位	更新後等の経過年数～2018	第1期アクションプログラム期間(H31～R9)			施設の状況	未更新等の経過期間(3区分)	予防保全部位	2019～2021年度(令和元～3年度)の予定	2019～2021年度の内容			施設の状況	未更新等の経過期間(3区分)	
					2019-2021	2022-2024	2025-2027					2019実績(令和元年度)	2020実績(令和2年度)	2021予定(令和3年度)			
市民文化系施設	20	東鷹栖公民館 延床面積 1,987.08㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	27年	更新(防水等)			A	-	屋上・屋根	Ⅲ:未更新のまま				指摘なし	-	
			外壁	27年	未更新(塗装等)			A	10年以内	外壁	Ⅲ:未更新のまま				指摘なし	10年以内	
			受変電	27年	更新(受変電)			A	-	受変電	Ⅲ:未更新のまま				指摘なし	-	
			非常電源	27年	更新(発電機)			A	-	非常電源	Ⅱ:一部実施(予定を含む)		不完全燃焼により一部修繕	電源バッテリーの交換等	指摘なし	-	
			空調	27年	未更新(空調一部)			A	10年以内	空調	Ⅱ:一部実施(予定を含む)		ボイラー設備一部補修		指摘なし	10年以内	
			衛生	27年	未更新(ポンプ)			A	10年以内	衛生	Ⅲ:未更新のまま				指摘なし	10年以内	
			防災	27年	未更新(ポンプ)			A	10年以内	防災	Ⅲ:未更新のまま				指摘なし	10年以内	
			昇降							昇降							
			概算費用(千円)			111,711	-	-			区分	3				1	
市民文化系施設	21	北星公民館 延床面積 714.99㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	36年	未更新(防水等)			A	10年以内	屋上・屋根	Ⅰ:計画通り実施(予定を含む)			屋根補修	要是正	10年以内	
			外壁	36年	未更新(塗装等)	更新(タイル)			A	10年超え	外壁	Ⅲ:未更新のまま				指摘なし	10年超え
			受変電								受変電						
			非常電源								非常電源						
			空調								空調						
			衛生	36年	未更新(給排水管)			A	10年以内	衛生	Ⅲ:未更新のまま				指摘なし	10年以内	
			防災							防災							
			昇降							昇降							
			概算費用(千円)			29,054	2,882	-			区分	3				3	
市民文化系施設	22	新旭川公民館 延床面積 723.51㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	35年	未更新(防水)			A	10年以内	屋上・屋根	Ⅲ:未更新のまま				指摘なし	10年以内	
			外壁	35年	未更新(塗装等)			A	10年超え	外壁	Ⅲ:未更新のまま				指摘なし	10年超え	
			受変電							受変電							
			非常電源							非常電源							
			空調							空調							
			衛生	35年	未更新(給排水管)			A	10年以内	衛生	Ⅲ:未更新のまま				指摘なし	10年以内	
			防災							防災							
			昇降							昇降							
			概算費用(千円)			25,291	-	-			区分	3				1	
市民文化系施設	23	春光台公民館 延床面積 727.14㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	3年	-	-	-	A	-	屋上・屋根	-				指摘なし	-	
			外壁	34年	未更新(塗装等)			A	10年超え	外壁	Ⅲ:未更新のまま				指摘なし	10年超え	
			受変電							受変電							
			非常電源							非常電源							
			空調							空調							
			衛生	34年	未更新(給排水管)			A	5年以内	衛生	Ⅲ:未更新のまま				指摘なし	10年以内	
			防災							防災							
			昇降							昇降							
			概算費用(千円)			11,038	-	-			区分	3				1	

旭川市公共施設等総合管理計画 第1期アクションプログラム施設保全計画表取組状況【令和3年度版】

※2019～2021年度の予定欄は、更新周期を超過していないものは「-」とした。
 ※主な更新周期は各施設の長期修繕計画を参考とした。

【施設保全計画表】（平成31年3月時点）										令和2年度末の状況							
大分類	No.	施設(建物名)	予防保全部位	更新後等の経過年数～2018	第1期アクションプログラム期間(H31～R9)			施設の状況	未更新等の経過期間(3区分)	予防保全部位	2019～2021年度(令和元～3年度)の予定	2019～2021年度の内容			施設の状況	未更新等の経過期間(3区分)	
					2019-2021	2022-2024	2025-2027					2019実績(令和元年度)	2020実績(令和2年度)	2021予定(令和3年度)			
市民文化系施設	24	愛宕公民館 延床面積 730.55㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	32年	未更新(防水)			A	5年以内	屋上・屋根	Ⅲ:未更新のまま				指摘なし	5年以内	
			外壁	32年	未更新(塗装等)				A	10年超え	外壁	Ⅲ:未更新のまま				指摘なし	10年超え
			受変電								受変電						
			非常電源								非常電源						
			空調								空調						
			衛生	32年	未更新(給排水管)				A	5年以内	衛生	Ⅲ:未更新のまま				指摘なし	5年以内
			防災								防災						
			昇降								昇降						
			概算費用(千円)				24,925	-	-			区分	3				1
市民文化系施設	25	末広地域活動センター 延床面積 763.12㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	4年	-	-	-	A	-	屋上・屋根	-				指摘なし	-	
			外壁	4年	-	-	-	A	-	外壁	-				指摘なし	-	
			受変電								受変電						
			非常電源								非常電源						
			空調	4年	-	-	-	A	-	空調	-				指摘なし	-	
			衛生	4年	-	-	-	A	-	衛生	-				指摘なし	-	
			防災								防災						
			昇降								昇降						
			概算費用(千円)				-	-	-			区分	-				1
市民文化系施設	26	緑が丘地域活動センター 延床面積 1,562.31㎡ 目標使用年数 80年	屋上・屋根							屋上・屋根	-				指摘なし	-	
			外壁							外壁	-				指摘なし	-	
			受変電								受変電						
			非常電源								非常電源						
			空調								空調	-				指摘なし	-
			衛生								衛生	-				指摘なし	-
			防災								防災	-				指摘なし	-
			昇降								昇降						
			概算費用(千円)									区分	-				1
市民文化系施設	27	大雪クリスタルホール 延床面積 9,698.78㎡ 目標使用年数 80年	屋上・屋根	25年	-	更新(防水一部)		A	-	屋上・屋根	-			更新予定(防水)	要是正	-	
			外壁	25年	未更新(塗装等)			A	5年以内	外壁	Ⅱ:一部実施(予定を含む)				要是正	10年以内	
			受変電	25年	-	更新(受変電)		A	-	受変電	-			一部更新(受電設備)	要是正(既存不適格)	-	
			非常電源	25年	未更新(電源装置)	更新(発電機)		A	5年以内	非常電源	Ⅱ:一部実施(予定を含む)	一部更新(電源装置)			要是正	10年以内	
			空調	25年	未更新(冷房熱源等)	更新(暖房熱源等)		A	5年以内	空調	Ⅰ:計画通り実施(予定を含む)				指摘なし	10年以内	
			衛生	25年	未更新(ポンプ)	更新(給排水管)		A	5年以内	衛生	Ⅰ:計画通り実施(予定を含む)				指摘なし	10年以内	
			防災	25年	未更新(ポンプ)			A	5年以内	防災	Ⅲ:未更新のまま				指摘なし	10年以内	
			昇降	25年	-	更新(エレベーター)		A	-	昇降	-				指摘なし	-	
			概算費用(千円)				185,636	430,822	-			区分	3				3

旭川市公共施設等総合管理計画 第1期アクションプログラム施設保全計画表取組状況【令和3年度版】

※2019～2021年度の予定欄は、更新周期を超過していないものは「-」とした。
 ※主な更新周期は各施設の長期修繕計画を参考とした。

【施設保全計画表】（平成31年3月時点）										令和2年度末の状況						
大分類	No.	施設(建物名)	予防保全部位	更新後等の経過年数～2018	第1期アクションプログラム期間(H31～R9)			施設の状況	未更新等の経過期間(3区分)	予防保全部位	2019～2021年度(令和元～3年度)の予定	2019～2021年度の内容			施設の状況	未更新等の経過期間(3区分)
					2019～2021	2022～2024	2025～2027					2019実績(令和元年度)	2020実績(令和2年度)	2021予定(令和3年度)		
社会教育施設	1	中央図書館 延床面積 6,214.03㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	24年	未更新(防水一部)	更新(防水)		A	5年以内	屋上・屋根	Ⅱ：一部実施(予定を含む)		更新(防水)	更新(防水)	要是正	10年以内
			外壁	24年	未更新(シーリング)			A	5年以内	外壁	Ⅲ：未更新のまま				要是正	10年以内
			受変電	24年	-	更新(受変電)		A	-	受変電						
			非常電源	13年	未更新(直流電源)			A	10年以内	非常電源	Ⅲ：未更新のまま				要是正	10年以内
			空調	24年	未更新(熱源機等)	更新(熱源機等)		A	5年以内	空調	Ⅲ：未更新のまま				要是正	10年以内
			衛生	24年	未更新(ポンプ)	更新(給湯機等)		A	5年以内	衛生	Ⅲ：未更新のまま				要是正	10年以内
			防災	24年	未更新(ポンプ)			A	-	防災	Ⅲ：未更新のまま				要是正	10年以内
			昇降	24年	-	更新(エレベーター)		A	-	昇降	-				要是正	-
			概算費用(千円)					95,012	171,998	-		区分	3			
社会教育施設	2	末広図書館 延床面積 999.43㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	26年	-	更新(防水)		A	-	屋上・屋根	-				指摘なし	-
			外壁	26年	未更新(塗装等)			A	10年以内	外壁	Ⅱ：一部実施(予定を含む)	一部(西面)更新			要是正	10年以内
			受変電	26年	-	更新(受変電)		A	-	受変電	-				指摘なし	-
			非常電源							非常電源						
			空調	26年	-	更新(熱源機等)		A	-	空調	-				要是正	-
			衛生	26年	未更新(ポンプ)	更新(衛生配管)		A	10年以内	衛生	Ⅲ：未更新のまま				指摘なし	10年以内
			防災	26年	未更新(中央監視)			A	10年以内	防災	Ⅲ：未更新のまま				指摘なし	10年以内
			昇降	26年	-	更新(エレベーター)		A	-	昇降	-				指摘なし	-
			概算費用(千円)					21,903	69,388	-		区分	3			
社会教育施設	3	東光図書館 延床面積 1,065.59㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	20年	未更新(防水)			A	5年以内	屋上・屋根	Ⅲ：未更新のまま				要是正	5年以内
			外壁	20年	未更新(塗装等)			A	5年以内	外壁	Ⅲ：未更新のまま				要是正	5年以内
			受変電	20年	-	-	-	A	-	受変電	-				指摘なし	-
			非常電源							非常電源						
			空調	20年	未更新(冷凍機)			A	5年以内	空調	Ⅲ：未更新のまま				指摘なし	5年以内
			衛生	20年	-	-	-	A	-	衛生	-				指摘なし	-
			防災							防災						
			昇降							昇降						
			概算費用(千円)					31,753	-	-		区分	3			
社会教育施設	4	井上靖記念館 延床面積 663.61㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	26年	-	更新(屋根)		C	-	屋上・屋根	-	笠木交換済、塗装未実施			要是正	-
			外壁	26年	未更新(塗装等)			A	10年以内	外壁	Ⅲ：未更新のまま				要是正	10年以内
			受変電	26年	-	更新(受変電)		A	-	受変電						
			非常電源							非常電源						
			空調	26年	未更新(熱源機)	更新(温水管)		A	10年以内	空調	Ⅲ：未更新のまま				指摘なし	10年以内
			衛生	26年	-	更新(給排水管)		A	-	衛生	Ⅰ：計画通り実施(予定を含む)	屋外地中給水管更新	館内床下給水管更新		指摘なし	-
			防災							防災						
			昇降							昇降						
			概算費用(千円)					32,500	35,500	-		区分	3			

旭川市公共施設等総合管理計画 第1期アクションプログラム施設保全計画表取組状況【令和3年度版】

※2019～2021年度の予定欄は、更新周期を経過していないものは「-」とした。
 ※主な更新周期は各施設の長期修繕計画を参考とした。

【施設保全計画表】（平成31年3月時点）										令和2年度末の状況						
大分類	No.	施設(建物名)	予防保全部位	更新後等の経過年数～2018	第1期アクションプログラム期間(H31～R9)			施設の状況	未更新等の経過期間(3区分)	予防保全部位	2019～2021年度(令和元～3年度)の予定	2019～2021年度の内容			施設の状況	未更新等の経過期間(3区分)
					2019-2021	2022-2024	2025-2027					2019実績(令和元年度)	2020実績(令和2年度)	2021予定(令和3年度)		
社会教育施設	5-1	科学館 延床面積 5,799.60㎡ 目標使用年数 80年	屋上・屋根	13年	-	-	更新(防水一部)	B	-	屋上・屋根	-				指摘なし	-
			外壁	13年	-	-	更新(塗装等)	A	-	外壁	-				指摘なし	-
			受変電	13年	-	-	-	A	-	受変電	-				指摘なし	-
			非常電源	13年	-	-	更新(直流電源)	B	-	非常電源	-				指摘なし	-
			空調	13年	-	-	更新(熱源機等)	B	-	空調	-				指摘なし	-
			衛生	13年	-	-	更新(ポンプ)	B	-	衛生	-				指摘なし	-
			防災	13年	-	-	更新(ポンプ)	A	-	防災	-				指摘なし	-
			昇降	13年	-	-	更新(リフト)	B	-	昇降	-				指摘なし	-
概算費用(千円)			-	-	148,984			区分	-				1			
社会教育施設	5-2	科学館 車庫 延床面積 344.25㎡ 目標使用年数 80年	屋上・屋根	13年	-	-	更新(防水)	C	-	屋上・屋根	-				指摘なし	-
			外壁	13年	-	-	更新(塗装等)	B	-	外壁	-				要是正	-
			概算費用(千円)			-	-	20,771			区分	-				3
スポーツレクリエーション施設	1	勤労者体育センター 延床面積 1,120.34㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	15年	-	更新(防水)	A	-	屋上・屋根	-				指摘なし	-	
			外壁	15年	-	更新(塗装等)	A	-	外壁	-				指摘なし	-	
			受変電	38年	未更新(受変電)			A	10年以内	受変電	I:計画通り実施(予定を含む)		更新済み(受変電)		指摘なし	-
			非常電源							非常電源						
			空調	22年	未更新(熱源機)			A	5年以内	空調	Ⅲ:未更新のまま				指摘なし	5年以内
			衛生	38年	未更新(給排水管)			A	10年以内	衛生	Ⅲ:未更新のまま				指摘なし	10年超え
			防災							防災						
			昇降							昇降						
概算費用(千円)			9,550	19,332	-			区分	3				1			
スポーツレクリエーション施設	2-1	カムイスキーリンクスセンターハウス 延床面積 2,352.72㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	34年						屋上・屋根	I:計画通り実施(予定を含む)	更新済み(板金等)			指摘なし	-
			外壁	34年						外壁	I:計画通り実施(予定を含む)	更新済み(板金等)			指摘なし	-
			受変電	34年		作成中				受変電	I:計画通り実施(予定を含む)		更新済み(屋外キュービクル)	更新予定(屋内キュービクル)	指摘なし	10年以内
			非常電源	34年						非常電源						
			空調	34年						空調	Ⅲ:未更新のまま				指摘なし	10年超え
			衛生	34年						衛生	Ⅱ:一部実施(予定を含む)		更新済み(浄化槽)		指摘なし	10年超え
			防災	34年						防災	Ⅲ:未更新のまま				指摘なし	10年超え
			昇降							昇降						
概算費用(千円)								区分	3				1			

旭川市公共施設等総合管理計画 第1期アクションプログラム施設保全計画表取組状況【令和3年度版】

※2019～2021年度の予定欄は、更新周期を経過していないものは「-」とした。
 ※主な更新周期は各施設の長期修繕計画を参考とした。

【施設保全計画表】（平成31年3月時点）										令和2年度末の状況						
大分類	No.	施設(建物名)	予防保全部位	更新後等の経過年数～2018	第1期アクションプログラム期間(H31～R9)			施設の状況	未更新等の経過期間(3区分)	予防保全部位	2019～2021年度(令和元～3年度)の予定	2019～2021年度の内容			施設の状況	未更新等の経過期間(3区分)
					2019-2021	2022-2024	2025-2027					2019実績(令和元年度)	2020実績(令和2年度)	2021予定(令和3年度)		
スポーツレクリエーション施設	2-2	カムイスキーリンクス ラーメンハウス 延床面積 287.01㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	33年						屋上・屋根	Ⅲ:未更新のまま				要是正	10年以内
			外壁	33年						外壁	Ⅲ:未更新のまま				要是正	10年超え
			受変電	33年						受変電						
			非常電源	33年						非常電源						
			空調	33年						空調	Ⅲ:未更新のまま				指摘なし	10年超え
			衛生	33年						衛生	Ⅲ:未更新のまま				指摘なし	10年以内
			防災	33年						防災						
			昇降							昇降						
			概算費用(千円)							区分	3				3	
スポーツレクリエーション施設	2-3	カムイスキーリンクス 山頂レストラン 延床面積 460.24㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	33年						屋上・屋根	I:計画通り実施(予定を含む)	更新済み(板金等)			要是正	-
			外壁	33年						外壁	I:計画通り実施(予定を含む)	更新済み(板金等)			要是正	-
			受変電	33年						受変電						
			非常電源	33年						非常電源						
			空調	0年						空調	-				指摘なし	-
			衛生	33年						衛生	I:計画通り実施(予定を含む)	更新済み(給水ポンプ)			指摘なし	10年以内
			防災	33年						防災						
			昇降							昇降						
			概算費用(千円)							区分	1				3	
スポーツレクリエーション施設	2-4	カムイスキーリンクス ゴンドラ山頂駅 延床面積 571.12㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	33年						屋上・屋根	I:計画通り実施(予定を含む)			更新予定(板金等)	要是正	10年以内
			外壁	33年						外壁	I:計画通り実施(予定を含む)			更新予定(板金等)	要是正	10年超え
			受変電	33年						受変電						
			非常電源	33年						非常電源						
			空調	33年						空調						
			衛生	33年						衛生						
			防災	33年						防災						
			昇降							昇降						
			概算費用(千円)							区分	1				3	
スポーツレクリエーション施設	2-5	カムイスキーリンクス ゴンドラ山麓駅舎 延床面積 1,282.78㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	33年						屋上・屋根	I:計画通り実施(予定を含む)			更新予定(板金等)	要是正	10年以内
			外壁	33年						外壁	I:計画通り実施(予定を含む)			更新予定(板金等)	要是正	10年超え
			受変電	33年						受変電						
			非常電源	33年						非常電源						
			空調	33年						空調						
			衛生	33年						衛生						
			防災	33年						防災						
			昇降							昇降						
			概算費用(千円)							区分	1				3	

旭川市公共施設等総合管理計画 第1期アクションプログラム施設保全計画表取組状況【令和3年度版】

※2019～2021年度の予定欄は、更新周期を経過していないものは「-」とした。
 ※主な更新周期は各施設の長期修繕計画を参考とした。

【施設保全計画表】（平成31年3月時点）										令和2年度末の状況						
大分類	No.	施設(建物名)	予防保全部位	更新後等の経過年数～2018	第1期アクションプログラム期間(H31～R9)			施設の状況	未更新等の経過期間(3区分)	予防保全部位	2019～2021年度(令和元～3年度)の予定	2019～2021年度の内容			施設の状況	未更新等の経過期間(3区分)
					2019-2021	2022-2024	2025-2027					2019実績(令和元年度)	2020実績(令和2年度)	2021予定(令和3年度)		
スポーツレクリエーション施設	3	総合体育館 延床面積 7,051.89㎡ 目標使用年数 80年 「要」耐震診断	屋上・屋根	39年						屋上・屋根	Ⅲ：未更新のまま				要是正	10年超え
			外壁	39年						外壁	Ⅲ：未更新のまま				要是正	10年超え
			受変電	1年						受変電	Ⅰ：計画通り実施(予定を含む)				指摘なし	-
			非常電源	39年		作成中				非常電源	Ⅰ：計画通り実施(予定を含む)		非常用発電機 ディーゼルエンジン(実施設計)	非常用発電機 ディーゼルエンジン	指摘なし	10年超え
			空調	39年						空調	Ⅲ：未更新のまま				指摘なし	10年超え
			衛生	39年						衛生	Ⅰ：計画通り実施(予定を含む)	給水配管			指摘なし	10年超え
			防災	39年						防災	Ⅰ：計画通り実施(予定を含む)				指摘なし	10年超え
			昇降							昇降						
			概算費用(千円)		543,049			3,261			区分	3				3
スポーツレクリエーション施設	4	東地区体育センター 延床面積 1,102.72㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	26年						屋上・屋根	-				指摘なし	-
			外壁	26年						外壁	Ⅲ：未更新のまま				指摘なし	10年以内
			受変電	26年						受変電						
			非常電源	26年		作成中				非常電源						
			空調	26年						空調	Ⅲ：未更新のまま				指摘なし	10年以内
			衛生	26年						衛生	-				指摘なし	-
			防災	26年						防災						
			昇降							昇降						
			概算費用(千円)								区分	3				1
スポーツレクリエーション施設	5	道北アークス大雪アリーナ(借上げ) 延床面積 713.15㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	32年	未更新(板金等)			A	5年以内	屋上・屋根	Ⅱ：一部実施(予定を含む)	更新済み(屋上防水)			指摘なし	5年以内
			外壁	32年	未更新(塗装)		更新(金属板等)	A	10年超え	外壁	Ⅲ：未更新のまま				要是正	10年超え
			受変電	32年	未更新(受変電)			A	5年以内	受変電	Ⅲ：未更新のまま				指摘なし	5年以内
			非常電源	32年	未更新(発電機)			A	5年以内	非常電源	Ⅲ：未更新のまま				指摘なし	5年以内
			空調	32年	未更新(熱源機等)			A	10年超え	空調	Ⅱ：一部実施(予定を含む)		更新(製水に関する部分)		指摘なし	10年超え
			衛生	32年	未更新(給排水管等)			A	10年超え	衛生	Ⅱ：一部実施(予定を含む)			予定(製水用温水発生器)	指摘なし	10年超え
			防災	32年	未更新(消火ポンプ)			A	10年超え	防災	Ⅱ：一部実施(予定を含む)		整備済み(防火扉)		要是正(既存不適格)	10年超え
			昇降							昇降						
			概算費用(千円)		574,600		-	-			区分	3				3
スポーツレクリエーション施設	6-1	21世紀の森森林学習展示館 延床面積 655.20㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	30年						屋上・屋根	Ⅲ：未更新のまま				指摘なし	5年以内
			外壁	30年						外壁	Ⅱ：一部実施(予定を含む)				要是正	10年超え
			受変電	30年						受変電						
			非常電源	30年		作成中				非常電源						
			空調	30年						空調						
			衛生	30年						衛生	Ⅲ：未更新のまま				指摘なし	5年以内
			防災	30年						防災						
			昇降							昇降						
			概算費用(千円)								区分	3				3

旭川市公共施設等総合管理計画 第1期アクションプログラム施設保全計画表取組状況【令和3年度版】

※2019～2021年度の予定欄は、更新周期を超過していないものは「-」とした。
 ※主な更新周期は各施設の長期修繕計画を参考とした。

【施設保全計画表】（平成31年3月時点）										令和2年度末の状況							
大分類	No.	施設(建物名)	予防保全部位	更新後等の経過年数～2018	第1期アクションプログラム期間(H31～R9)			施設の状況	未更新等の経過期間(3区分)	予防保全部位	2019～2021年度(令和元～3年度)の予定	2019～2021年度の内容			施設の状況	未更新等の経過期間(3区分)	
					2019-2021	2022-2024	2025-2027					2019実績(令和元年度)	2020実績(令和2年度)	2021予定(令和3年度)			
スポーツレクリエーション施設	6-2	21世紀の森ログハウス 延床面積 298.38㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	30年						屋上・屋根	Ⅲ:未更新のまま				指摘なし	5年以内	
			外壁	30年						外壁	Ⅲ:未更新のまま				指摘なし	10年超え	
			受変電	30年		作成中					受変電						
			非常電源	30年							非常電源						
			空調	30年						空調							
			衛生	30年						衛生	Ⅲ:未更新のまま				指摘なし	5年以内	
			防災	30年						防災							
			昇降							昇降							
			概算費用(千円)								区分	3				1	
スポーツレクリエーション施設	7-1	旭山動物園展示館 延床面積 268.80㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	36年	未更新(屋根)			A	10年以内	屋上・屋根	Ⅲ:未更新のまま				指摘なし	10年以内	
			外壁	36年	未更新(塗装等)			A	10年超え	外壁	Ⅲ:未更新のまま				指摘なし	10年超え	
			受変電							受変電							
			非常電源							非常電源							
			空調	36年	未更新(配管)			A	10年以内	空調	Ⅲ:未更新のまま				指摘なし	10年以内	
			衛生	36年	未更新(給排水管)			A	10年以内	衛生	Ⅲ:未更新のまま				指摘なし	10年以内	
			防災							防災							
			昇降							昇降							
			概算費用(千円)			5,588	-	-			区分	3				1	
スポーツレクリエーション施設	7-2	旭山動物園もうじゅう館 延床面積 611.67㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	20年	未更新(防水一部)			A	5年以内	屋上・屋根	Ⅲ:未更新のまま		更新(パラペット天板防水)	更新予定(パラペット天板防水)	要是正	5年以内	
			外壁	20年	未更新(塗装等)			D	5年以内	外壁	Ⅲ:未更新のまま				要是正	5年以内	
			受変電							受変電							
			非常電源							非常電源							
			空調	20年	-	-	-	A	-	空調	-					指摘なし	-
			衛生	20年	-	-	-	A	-	衛生	-					指摘なし	-
			防災							防災							
			昇降							昇降							
			概算費用(千円)			23,286	-	-			区分	3				3	
スポーツレクリエーション施設	7-3	旭山動物園さる山舎 延床面積 280.03㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	19年	-	-	-	A	-	屋上・屋根	-			更新予定(パラペット天板防水)	要是正	-	
			外壁	19年	更新(塗装等)			A	-	外壁	Ⅲ:未更新のまま				指摘なし	5年以内	
			受変電							受変電							
			非常電源							非常電源							
			空調	19年	-	-	-	A	-	空調	-					指摘なし	-
			衛生	19年	-	-	-	A	-	衛生	-					指摘なし	-
			防災							防災							
			昇降							昇降							
			概算費用(千円)			4,418	-	-			区分	3				3	

旭川市公共施設等総合管理計画 第1期アクションプログラム施設保全計画表取組状況【令和3年度版】

※2019～2021年度の予定欄は、更新周期を経過していないものは「-」とした。
 ※主な更新周期は各施設の長期修繕計画を参考とした。

【施設保全計画表】（平成31年3月時点）										令和2年度末の状況							
大分類	No.	施設(建物名)	予防保全部位	更新後等の経過年数～2018	第1期アクションプログラム期間(H31～R9)			施設の状況	未更新等の経過期間(3区分)	予防保全部位	2019～2021年度(令和元～3年度)の予定	2019～2021年度の内容			施設の状況	未更新等の経過期間(3区分)	
					2019～2021	2022～2024	2025～2027					2019実績(令和元年度)	2020実績(令和2年度)	2021予定(令和3年度)			
スポーツレクリエーション施設	7-4	旭山動物園 べんぎん館 延床面積 631.78㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	18年	更新(防水)			A	-	屋上・屋根	Ⅲ:未更新のまま				指摘なし	5年以内	
			外壁	18年	更新(塗装等)			A	-	外壁	Ⅲ:未更新のまま				指摘なし	5年以内	
			受変電								受変電						
			非常電源								非常電源						
			空調	18年	更新(熱源機)			A	-	空調	Ⅲ:未更新のまま				指摘なし	5年以内	
			衛生	18年	更新(給湯機)			A	-	衛生	-				指摘なし	-	
			防災							防災							
			昇降	18年	-	-	-	A	-	昇降	-				指摘なし	-	
			概算費用(千円)				19,019	-	-			区分	3				1
スポーツレクリエーション施設	7-5	旭山動物園 ほっきょくぐま館 延床面積 1,187.60㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	16年	-	更新(防水)		C	-	屋上・屋根	-				要是正	-	
			外壁	16年	-	更新(塗装等)		A	-	外壁	-				指摘なし	-	
			受変電								受変電						
			非常電源								非常電源						
			空調	16年	-	更新(熱源機)		A	-	空調	-				指摘なし	-	
			衛生	16年	-	更新(給湯機, ポンプ)		A	-	衛生	-				指摘なし	-	
			防災							防災							
			昇降	16年	-	-	-	A	-	昇降	-				指摘なし	-	
			概算費用(千円)				-	37,346	-			区分	-				3
スポーツレクリエーション施設	7-6	旭山動物園 あざらし館 延床面積 1,018.01㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	14年	-	更新(防水)		A	-	屋上・屋根	-				指摘なし	-	
			外壁	14年	-	更新(塗装等)		A	-	外壁	-				指摘なし	-	
			受変電								受変電						
			非常電源								非常電源						
			空調	14年	-	更新(熱源機)		A	-	空調	-				指摘なし	-	
			衛生	14年	-	更新(ポンプ)		A	-	衛生	-				指摘なし	-	
			防災							防災							
			昇降	14年	-	-	-	A	-	昇降	-				指摘なし	-	
			概算費用(千円)				-	23,178	-			区分	-				1
スポーツレクリエーション施設	7-7	旭山動物園 正面売札所 延床面積 309.89㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	13年	-	-		A	-	屋上・屋根	-				指摘なし	-	
			外壁	13年	更新(塗装等)			A	-	外壁	-				指摘なし	-	
			受変電								受変電						
			非常電源								非常電源						
			空調	13年	-	-		A	-	空調	-				指摘なし	-	
			衛生	13年	-	-		A	-	衛生	-				指摘なし	-	
			防災							防災							
			昇降							昇降							
			概算費用(千円)				1,288	-	-			区分	-				1

旭川市公共施設等総合管理計画 第1期アクションプログラム施設保全計画表取組状況【令和3年度版】

※2019～2021年度の予定欄は、更新周期を経過していないものは「-」とした。
 ※主な更新周期は各施設の長期修繕計画を参考とした。

【施設保全計画表】（平成31年3月時点）										令和2年度末の状況							
大分類	No.	施設(建物名)	予防保全部位	更新後等の経過年数～2018	第1期アクションプログラム期間(H31～R9)			施設の状況	未更新等の経過期間(3区分)	予防保全部位	2019～2021年度(令和元～3年度)の予定	2019～2021年度の内容			施設の状況	未更新等の経過期間(3区分)	
					2019～2021	2022～2024	2025～2027					2019実績(令和元年度)	2020実績(令和2年度)	2021予定(令和3年度)			
スポーツレクリエーション施設	7-8	旭山動物園 ちんぱんじー館 延床面積 1,118.06㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	12年	-	-	更新(防水)	A	-	屋上・屋根	-				指摘なし	-	
			外壁	12年	-	-	更新(塗装等)	A	-	外壁	-				指摘なし	-	
			受変電								受変電						
			非常電源								非常電源						
			空調	12年	-	-	更新(熱源機)	A	-	空調	-				指摘なし	-	
			衛生	12年	-	-	更新(給湯機)	A	-	衛生	-				指摘なし	-	
			防災								防災						
			昇降								昇降						
			概算費用(千円)		-	-	39,352				区分	-				1	
スポーツレクリエーション施設	7-9	旭山動物園 かば館 延床面積 1,685.26㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	5年	-	-	-	A	-	屋上・屋根	-				指摘なし	-	
			外壁	5年	-	-	-	A	-	外壁	-				指摘なし	-	
			受変電	5年	-	-	-	A	-	受変電	-				指摘なし	-	
			非常電源								非常電源						
			空調	5年	-	-	-	A	-	空調	-				指摘なし	-	
			衛生	5年	-	-	-	A	-	衛生	-				指摘なし	-	
			防災								防災						
			昇降	5年	-	-	-	A	-	昇降	-				指摘なし	-	
			概算費用(千円)		-	-	-				区分	-				1	
スポーツレクリエーション施設	8	江丹別若者の郷 若者センター 延床面積 742.54㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	33年	未更新(防水)		更新(板金)	A	5年以内	屋上・屋根	Ⅲ:未更新のまま				指摘なし	10年以内	
			外壁	33年	未更新(塗装等)				A	10年超え	外壁	Ⅲ:未更新のまま				指摘なし	10年超え
			受変電								受変電						
			非常電源								非常電源						
			空調	33年	未更新(空調配管)				A	5年以内	空調	Ⅲ:未更新のまま				指摘なし	10年以内
			衛生	33年	未更新(給排水管等)				A	5年以内	衛生	Ⅲ:未更新のまま				指摘なし	10年以内
			防災								防災						
			昇降								昇降						
			概算費用(千円)		18,610	-	4,010				区分	3				1	

旭川市公共施設等総合管理計画 第1期アクションプログラム施設保全計画表取組状況【令和3年度版】

※2019～2021年度の予定欄は、更新周期を超過していないものは「-」とした。
 ※主な更新周期は各施設の長期修繕計画を参考とした。

【施設保全計画表】（平成31年3月時点）										令和2年度末の状況						
大分類	No.	施設(建物名)	予防保全部位	更新後等の経過年数～2018	第1期アクションプログラム期間(H31～R9)			施設の状況	未更新等の経過期間(3区分)	予防保全部位	2019～2021年度(令和元～3年度)の予定	2019～2021年度の内容			施設の状況	未更新等の経過期間(3区分)
					2019-2021	2022-2024	2025-2027					2019実績(令和元年度)	2020実績(令和2年度)	2021予定(令和3年度)		
産業施設	1	西神楽市民交流センター 延床面積 1,486.88㎡ 目標使用年数 65年 ※西神楽支所・公民館の集約に伴い、西神楽農業構造改善センターから名称変更	屋上・屋根	28年	更新(防水等)			A	-	屋上・屋根	Ⅲ:未更新のまま				指摘なし	5年以内
			外壁	28年	未更新(塗装等)			C	10年以内	外壁	Ⅲ:未更新のまま				要是正	10年超え
			受変電	28年	更新(受変電)			A	-	受変電	Ⅰ:計画通り実施(予定を含む)	更新			指摘なし	-
			非常電源							非常電源						
			空調	28年	未更新(熱源機)			B	10年以内	空調	Ⅲ:未更新のまま				指摘なし	10年超え
			衛生	28年	未更新(ポンプ)			A	10年以内	衛生	Ⅲ:未更新のまま				指摘なし	10年超え
			防災							防災						
			昇降							昇降						
			概算費用(千円)		80,242	-	-				区分	3			3	
産業施設	2	東旭川農村環境改善センター 延床面積 1,934.71㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	28年						屋上・屋根	Ⅲ:未更新のまま				指摘なし	5年以内
			外壁	28年						外壁	Ⅲ:未更新のまま				要是正	10年超え
			受変電	28年		作成中				受変電	Ⅲ:未更新のまま				指摘なし	5年以内
			非常電源	28年						非常電源						
			空調	28年						空調	Ⅲ:未更新のまま				指摘なし	5年以内
			衛生	28年						衛生	Ⅲ:未更新のまま				指摘なし	5年以内
			防災	28年						防災						
			昇降							昇降						
			概算費用(千円)								区分	3			3	
産業施設	3	永山ふれあいセンター 延床面積 787.89㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	26年						屋上・屋根	Ⅲ:未更新のまま				指摘なし	-
			外壁	26年						外壁	-				要是正	-
			受変電	26年		作成中				受変電						
			非常電源	26年						非常電源						
			空調	26年						空調	Ⅲ:未更新のまま				指摘なし	-
			衛生	26年						衛生	Ⅲ:未更新のまま				要是正	-
			防災	26年						防災						
			昇降							昇降						
			概算費用(千円)								区分	3			3	
産業施設	4	東鷹栖農村活性化センター 延床面積 1,345.96㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	33年						屋上・屋根	-	更新(ホール屋根)			指摘なし	-
			外壁	33年						外壁	Ⅲ:未更新のまま				要是正	10年超え
			受変電	33年		作成中				受変電	Ⅲ:未更新のまま				指摘なし	10年以内
			非常電源	33年						非常電源						
			空調	33年						空調	Ⅲ:未更新のまま				指摘なし	10年超え
			衛生	33年						衛生	Ⅲ:未更新のまま				指摘なし	10年以内
			防災	33年						防災						
			昇降							昇降						
			概算費用(千円)								区分	3			3	

旭川市公共施設等総合管理計画 第1期アクションプログラム施設保全計画表取組状況【令和3年度版】

※2019～2021年度の予定欄は、更新周期を経過していないものは「-」とした。
 ※主な更新周期は各施設の長期修繕計画を参考とした。

【施設保全計画表】（平成31年3月時点）										令和2年度末の状況						
大分類	No.	施設(建物名)	予防保全部位	更新後等の経過年数～2018	第1期アクションプログラム期間(H31～R9)			施設の状況	未更新等の経過期間(3区分)	予防保全部位	2019～2021年度(令和元～3年度)の予定	2019～2021年度の内容			施設の状況	未更新等の経過期間(3区分)
					2019-2021	2022-2024	2025-2027					2019実績(令和元年度)	2020実績(令和2年度)	2021予定(令和3年度)		
産業施設	5	旭川工業技術センター 研究・機械工作棟 延床面積 2,651.47㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	8年	更新(塗装)	更新(塗装)		A	-	屋上・屋根	-				指摘なし	-
			外壁	9年	-	-	-	A	-	外壁	-				指摘なし	-
			受変電	30年	更新(受変電)			A	-	受変電	I:計画通り実施(予定を含む)			更新予定(受変電)	指摘なし	5年以内
			非常電源							非常電源						
			空調	9年	-	-	-	A	-	空調	-				指摘なし	-
			衛生	30年	更新(屋外給水管)			A	-	衛生	Ⅲ:未更新のまま				指摘なし	5年以内
			防災	30年	未更新(ポンプ)			A	10年以内	防災	Ⅲ:未更新のまま				指摘なし	10年超え
			昇降							昇降						
			概算費用(千円)		9,756	7,200	-			区分	3				1	
産業施設	6	市営牧場 格納庫 延床面積 286.11㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	35年						屋上・屋根	Ⅲ:未更新のまま				指摘なし	10年以内
			外壁	35年						外壁	Ⅲ:未更新のまま				指摘なし	10年超え
			受変電			作成中				受変電						
			非常電源							非常電源						
			空調							空調						
			衛生							衛生						
			防災							防災						
			昇降							昇降						
			概算費用(千円)							区分	3				1	
産業施設	7-1	農業センター 複合施設 延床面積 1,397.28㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	22年	未更新(防水)		更新(屋根)	A	5年以内	屋上・屋根	Ⅲ:未更新のまま				要是正	5年以内
			外壁	22年	未更新(塗装等)			A	5年以内	外壁	Ⅲ:未更新のまま				指摘なし	5年以内
			受変電							受変電						
			非常電源							非常電源						
			空調	22年	未更新(熱源機)		更新(空調配管)	A	5年以内	空調	Ⅲ:未更新のまま				要是正	5年以内
			衛生	22年	-	-	更新(給排水管)	A	5年以内	衛生	Ⅱ:一部実施(予定を含む)	更新(給湯管)			指摘なし	5年以内
			防災	22年	未更新(中央監視)			A	5年以内	防災	Ⅲ:未更新のまま				要是正	5年以内
			昇降							昇降						
			概算費用(千円)		38,448	-	46,086			区分	3				3	
産業施設	7-2	農業センター 展示温室棟・温室棟 延床面積 1,026.00㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	22年			更新(防水)	A	-	屋上・屋根	-				指摘なし	-
			外壁	22年	未更新(塗装等)			A	5年以内	外壁	Ⅲ:未更新のまま				指摘なし	5年以内
			受変電							受変電						
			非常電源							非常電源						
			空調	4年	-	-	-	A	-	空調	-				指摘なし	-
			衛生	22年	-	-	更新(給排水管)	A	-	衛生	-				指摘なし	-
			防災							防災						
			昇降							昇降						
			概算費用(千円)		975	-	17,542			区分	3				1	

旭川市公共施設等総合管理計画 第1期アクションプログラム施設保全計画表取組状況【令和3年度版】

※2019～2021年度の予定欄は、更新周期を経過していないものは「-」とした。
 ※主な更新周期は各施設の長期修繕計画を参考とした。

【施設保全計画表】（平成31年3月時点）										令和2年度末の状況							
大分類	No.	施設(建物名)	予防保全部位	更新後等の経過年数～2018	第1期アクションプログラム期間(H31～R9)			施設の状況	未更新等の経過期間(3区分)	予防保全部位	2019～2021年度(令和元～3年度)の予定	2019～2021年度の内容			施設の状況	未更新等の経過期間(3区分)	
					2019～2021	2022～2024	2025～2027					2019実績(令和元年度)	2020実績(令和2年度)	2021予定(令和3年度)			
産業施設	7-3	農業センター 農場管理棟 延床面積 550.00㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	22年	-	-	更新(防水等)	A	-	屋上・屋根	-		雨漏り修繕(屋根)		指摘なし	-	
			外壁	22年	未更新(塗装等)				A	5年以内	外壁	Ⅲ:未更新のまま				指摘なし	5年以内
			受変電								受変電						
			非常電源								非常電源						
			空調	22年	未更新(熱源機)				A	5年以内	空調	Ⅲ:未更新のまま				指摘なし	5年以内
			衛生	22年	-	-	-	更新(給排水管)	A	-	衛生	-				指摘なし	-
			防災								防災						
			昇降								昇降						
			概算費用(千円)				8,187	-	25,226			区分	3				1
子育て支援施設	1	北門児童センター 延床面積 420.00㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	4年				A	-	屋上・屋根	-				指摘なし	-	
			外壁	33年	未更新(塗装等)				A	10年超え	外壁	Ⅲ:未更新のまま				指摘なし	10年超え
			受変電								受変電						
			非常電源								非常電源						
			空調	33年	未更新(空調配管)				A	5年以内	空調	Ⅲ:未更新のまま				指摘なし	10年以内
			衛生	33年	未更新(給排水管)				A	5年以内	衛生	Ⅲ:未更新のまま				指摘なし	10年以内
			防災								防災						
			昇降								昇降						
			概算費用(千円)				4,957	-	-			区分	3				1
子育て支援施設	2	春光住民児童センター 延床面積 493.10㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	30年	未更新(屋根, 防水)			A	5年以内	屋上・屋根	Ⅲ:未更新のまま				指摘なし	5年以内	
			外壁	30年	未更新(塗装等)				A	10年以内	外壁	Ⅲ:未更新のまま				指摘なし	10年超え
			受変電								受変電						
			非常電源								非常電源						
			空調	30年	未更新(空調配管)				A	5年以内	空調	Ⅲ:未更新のまま				指摘なし	5年以内
			衛生	30年	未更新(給排水管)				A	5年以内	衛生	Ⅲ:未更新のまま				指摘なし	5年以内
			防災								防災						
			昇降								昇降						
			概算費用(千円)				23,568	-	-			区分	3				1
子育て支援施設	3	北彩都子ども活動センター 延床面積 682.22㎡ 目標使用年数 80年	屋上・屋根	3年	-	-	-	A	-	屋上・屋根	-				指摘なし	-	
			外壁	3年	-	-	-	A	-	外壁	-				指摘なし	-	
			受変電								受変電						
			非常電源								非常電源						
			空調	3年	-	-	-	A	-	空調	-				指摘なし	-	
			衛生	3年	-	-	-	A	-	衛生	-				指摘なし	-	
			防災								防災						
			昇降								昇降						
			概算費用(千円)				-	-	-			区分	-				1

旭川市公共施設等総合管理計画 第1期アクションプログラム施設保全計画表取組状況【令和3年度版】

※2019～2021年度の予定欄は、更新周期を経過していないものは「-」とした。
 ※主な更新周期は各施設の長期修繕計画を参考とした。

【施設保全計画表】（平成31年3月時点）										令和2年度末の状況						
大分類	No.	施設(建物名)	予防保全部位	更新後等の経過年数～2018	第1期アクションプログラム期間(H31～R9)			施設の状況	未更新等の経過期間(3区分)	予防保全部位	2019～2021年度(令和元～3年度)の予定	2019～2021年度の内容			施設の状況	未更新等の経過期間(3区分)
					2019-2021	2022-2024	2025-2027					2019実績(令和元年度)	2020実績(令和2年度)	2021予定(令和3年度)		
保健・福祉系施設	1	いきいきセンター新旭川 延床面積 994.97㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	1年	-	-	-	A	-	屋上・屋根	-				指摘なし	-
			外壁	25年	未更新(塗装等)	-	-	C	5年以内	外壁	Ⅲ:未更新のまま				要是正	10年以内
			受変電							受変電						
			非常電源							非常電源						
			空調	9年	-	更新(空調配管)	-	A	-	空調	-				指摘なし	-
			衛生	25年	未更新(ポンプ)	更新(給排水管)	-	A	5年以内	衛生	Ⅲ:未更新のまま				指摘なし	10年以内
			防災							防災						
			昇降							昇降						
			概算費用(千円)				10,825	29,064	-			区分	3			
保健・福祉系施設	2	いきいきセンター神楽 延床面積 1,727.50㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	10年	-	-	-	A	-	屋上・屋根	-				指摘なし	-
			外壁	10年	-	-	-	A	-	外壁	-				要是正	-
			受変電	10年	-	-	-	A	-	受変電	-				指摘なし	-
			非常電源							非常電源						
			空調	10年	-	-	-	A	-	空調	-				指摘なし	-
			衛生	10年	-	-	-	A	-	衛生	-				指摘なし	-
			防災							防災						
			昇降							昇降						
			概算費用(千円)				-	-	-			区分	-			
保健・福祉系施設	3	北部老人福祉センター 延床面積 928.89㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	39年	未更新(防水等)			A	10年以内	屋上・屋根	Ⅲ:未更新のまま				要是正	10年超え
			外壁	18年	更新(タイル・塗装等)			A	-	外壁	Ⅲ:未更新のまま				要是正	5年以内
			受変電	1年	-	-	-		-	受変電	-				指摘なし	-
			非常電源							非常電源						
			空調	39年	未更新(一部空調管)	-	-	A	10年以内	空調	Ⅲ:未更新のまま				要是正	10年超え
			衛生	10年	-	-	-	A	-	衛生	-				要是正	-
			防災							防災						
			昇降							昇降						
			概算費用(千円)				25,478	-	-			区分	3			

旭川市公共施設等総合管理計画 第1期アクションプログラム施設保全計画表取組状況【令和3年度版】

※2019～2021年度の予定欄は、更新周期を経過していないものは「-」とした。
 ※主な更新周期は各施設の長期修繕計画を参考とした。

【施設保全計画表】（平成31年3月時点）										令和2年度末の状況						
大分類	No.	施設(建物名)	予防保全部位	更新後等の経過年数～2018	第1期アクションプログラム期間(H31～R9)			施設の状況	未更新等の経過期間(3区分)	予防保全部位	2019～2021年度(令和元～3年度)の予定	2019～2021年度の内容			施設の状況	未更新等の経過期間(3区分)
					2019-2021	2022-2024	2025-2027					2019実績(令和元年度)	2020実績(令和2年度)	2021予定(令和3年度)		
保健・福祉系施設	4	東部老人福祉センター 延床面積 946.00㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	18年	-	-	-	A	-	屋上・屋根	-				指摘なし	-
			外壁	23年	未更新(塗装等)		更新(サイディング)	A	5年以内	外壁	Ⅲ:未更新のまま				指摘なし	10年以内
			受変電	38年	未更新(受変電)			A	10年以内	受変電	I:計画通り実施(予定を含む)		更新(受変電)		指摘なし	-
			非常電源							非常電源						
			空調	14年	-	-	-	-	-	空調	-				指摘なし	-
			衛生	16年	-	更新(ポンプ)	更新(給湯機)	A	-	衛生	-				指摘なし	-
			防災							防災						
			昇降							昇降						
			概算費用(千円)		8,442	1,878	5,845			区分	3				1	
保健・福祉系施設	5	神居デイサービスセンター 延床面積 1,728.88㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	22年	-	-	更新(防水等)	A	-	屋上・屋根	-				指摘なし	-
			外壁	22年	未更新(塗装等)			A	5年以内	外壁	Ⅲ:未更新のまま				指摘なし	5年以内
			受変電							受変電						
			非常電源							非常電源						
			空調	22年	-	-	更新(熱源機)	A	-	空調	-				指摘なし	-
			衛生	22年	-	-	更新(給排水管)	A	-	衛生	-				指摘なし	-
			防災							防災						
			昇降							昇降						
			概算費用(千円)		26,712	-	76,044			区分	3				1	
保健・福祉系施設	6	近文市民ふれあいセンター 延床面積 3,398.66㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	22年	未更新(防水)		更新(屋根)	A	5年以内	屋上・屋根	Ⅲ:未更新のまま				指摘なし	5年以内
			外壁	22年	未更新(塗装等一部)			B	5年以内	外壁	Ⅲ:未更新のまま				要是正	5年以内
			受変電	22年	-	-	更新(受変電)	A	-	受変電	-				指摘なし	-
			非常電源							非常電源						
			空調	22年	未更新(熱源機)		更新(熱源機等)	A	5年以内	空調	Ⅲ:未更新のまま				指摘なし	5年以内
			衛生	22年	未更新(ポンプ)		更新(給排水管)	A	5年以内	衛生	I:計画通り実施(予定を含む)		更新(ポンプ)		指摘なし	5年以内
			防災	22年	未更新(ポンプ)			A	5年以内	防災	Ⅲ:未更新のまま				指摘なし	5年以内
			昇降	22年	-	-	更新(エレベーター)	A	-	昇降	-				指摘なし	-
			概算費用(千円)		47,098	-	150,292			区分	3				3	
保健・福祉系施設	7	障害者福祉センター 延床面積 5,692.41㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	17年	更新(防水)			A	-	屋上・屋根	Ⅲ:未更新のまま				要是正	-
			外壁	17年	更新(塗装等)			A	-	外壁	Ⅲ:未更新のまま				指摘なし	-
			受変電	17年	-			A	-	受変電	-				指摘なし	-
			非常電源	17年	更新(電源装置)			B	-	非常電源	Ⅲ:未更新のまま				指摘なし	-
			空調	17年	更新(冷房熱源等)			A	-	空調	Ⅱ:一部実施(予定を含む)		修繕済み(ACU-2)	更新予定(ACU-1)	指摘なし	-
			衛生	17年	更新(ポンプ)			A	-	衛生	Ⅲ:未更新のまま				要是正	-
			防災	17年	更新(中央監視)			A	-	防災	I:計画通り実施(予定を含む)		更新済み(中央監視)		指摘なし	-
			昇降	17年	-			A	-	昇降	-				指摘なし	-
			概算費用(千円)		131,321	-	-			区分	3				3	

旭川市公共施設等総合管理計画 第1期アクションプログラム施設保全計画表取組状況【令和3年度版】

※2019～2021年度の予定欄は、更新周期を経過していないものは「-」とした。
 ※主な更新周期は各施設の長期修繕計画を参考とした。

【施設保全計画表】（平成31年3月時点）										令和2年度末の状況								
大分類	No.	施設(建物名)	予防保全部位	更新後等の経過年数～2018	第1期アクションプログラム期間(H31～R9)			施設の状況	未更新等の経過期間(3区分)	予防保全部位	2019～2021年度(令和元～3年度)の予定	2019～2021年度の内容			施設の状況	未更新等の経過期間(3区分)		
					2019～2021	2022～2024	2025～2027					2019実績(令和元年度)	2020実績(令和2年度)	2021予定(令和3年度)				
保健・福祉系施設	8	愛育センター 延床面積 2,782.70㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	37年	未更新(防水)			A	10年以内	屋上・屋根	Ⅲ:未更新のまま				要是正	10年以内		
			外壁	37年	未更新(塗装)				A	10年超え	外壁	Ⅲ:未更新のまま				要是正	10年超え	
			受変電	0年	-	-	-	-	A	-	受変電	-				指摘なし	-	
			非常電源	37年	未更新(発電機)				A	10年以内	非常電源	Ⅱ:一部実施(予定を含む)				指摘なし	10年以内	
			空調	1年	-	-	-	-	A	-	空調	-				指摘なし	-	
			衛生	37年	未更新(排水管)				A	10年以内	衛生	Ⅲ:未更新のまま				要是正	10年以内	
			防災	37年	未更新(ポンプ)				A	10年超え	防災	Ⅱ:一部実施(予定を含む)				指摘なし	10年超え	
			昇降								昇降							
			概算費用(千円)			129,353	-	-				区分	3				3	
行政系施設	1	江丹別支所 延床面積 948.13㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	18年	-	-	-	A	-	屋上・屋根	-	長尺鋼板屋根部分のみ葺き替え実施			指摘なし	-		
			外壁	18年	更新(塗装等)				A	-	外壁	Ⅲ:未更新のまま				指摘なし	5年以内	
			受変電	18年	-	-	-	-	A	-	受変電	-				指摘なし	-	
			非常電源								非常電源							
			空調	18年	-	-	-	-	A	-	空調	-				指摘なし	-	
			衛生	18年	更新(ポンプ)				A	-	衛生	Ⅲ:未更新のまま				指摘なし	5年以内	
			防災								防災							
			昇降								昇降							
			概算費用(千円)			9,657	-	-				区分	3				1	
行政系施設	2	永山支所 延床面積 5,200.58㎡ 目標使用年数 80年	屋上・屋根	24年	-	更新(防水)		A	-	屋上・屋根	-				指摘なし	-		
			外壁	24年	未更新(塗装等)				D	5年以内	外壁	Ⅲ:未更新のまま				指摘なし	10年以内	
			受変電	24年	-	更新(受変電)				A	-	受変電	-				指摘なし	-
			非常電源	24年	未更新(電源装置)	更新(発電機)				A	5年以内	非常電源	Ⅱ:一部実施(予定を含む)			更新予定(自家発電装置)	指摘なし	10年以内
			空調	24年	未更新(冷温水熱源)	更新(暖房熱源等)				A	5年以内	空調	Ⅱ:一部実施(予定を含む)	一部更新済(電動パタ弁等)	一部更新済(冷発装置等)		指摘なし	10年以内
			衛生	24年	未更新(ポンプ)	更新(給排水管)				A	5年以内	衛生	Ⅱ:一部実施(予定を含む)	一部更新済(雑用水ポンプ)	一部更新済(給湯配管タンク取替)		要是正	10年以内
			防災	24年	未更新(ポンプ)					A	5年以内	防災	Ⅱ:一部実施(予定を含む)		一部更新済(SPポンプ等)		指摘なし	10年以内
			昇降	24年	-	更新(エレベーター)				A	-	昇降	-	一部更新済(作動油等)	一部更新済(ガイドローラ等)		指摘なし	-
			概算費用(千円)			74,513	320,601	-				区分	3				3	
行政系施設	3	東鷹栖地域センター 延床面積 1,418.58㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	19年	-	-	-	A	-	屋上・屋根	-				指摘なし	-		
			外壁	19年	更新(シーリング)				C	-	外壁	Ⅲ:未更新のまま				指摘なし	5年以内	
			受変電	19年	-	-	-	-	A	-	受変電	-				指摘なし	-	
			非常電源								非常電源							
			空調	19年	更新(熱源機)					A	-	空調	-				指摘なし	-
			衛生	19年	更新(給湯機)					A	-	衛生	-				指摘なし	-
			防災								防災							
			昇降	19年	-	-	-	-	A	-	昇降	-				指摘なし	-	
			概算費用(千円)			5,676	-	-				区分	3				1	

旭川市公共施設等総合管理計画 第1期アクションプログラム施設保全計画表取組状況【令和3年度版】

※2019～2021年度の予定欄は、更新周期を経過していないものは「-」とした。
 ※主な更新周期は各施設の長期修繕計画を参考とした。

【施設保全計画表】（平成31年3月時点）										令和2年度末の状況							
大分類	No.	施設(建物名)	予防保全部位	更新後等の経過年数～2018	第1期アクションプログラム期間(H31～R9)			施設の状況	未更新等の経過期間(3区分)	予防保全部位	2019～2021年度(令和元～3年度)の予定	2019～2021年度の内容			施設の状況	未更新等の経過期間(3区分)	
					2019-2021	2022-2024	2025-2027					2019実績(令和元年度)	2020実績(令和2年度)	2021予定(令和3年度)			
行政系施設	4	東部まちづくりセンター 延床面積 982.11㎡ 目標使用年数 80年	屋上・屋根	4年	-	-	-	A	-	屋上・屋根	-				要是正	-	
			外壁	4年	-	-	-	A	-	外壁	-				指摘なし	-	
			受変電								受変電						
			非常電源								非常電源						
			空調	4年	-	-	-	A	-	空調	-				指摘なし	-	
			衛生	4年	-	-	-	A	-	衛生	-				指摘なし	-	
			防災								防災						
			昇降								昇降						
			概算費用(千円)		-	-	-				区分	-				3	
行政系施設	5	南消防署神楽出張所 延床面積 866.28㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	16年	-	更新(防水一部)		A		屋上・屋根	-				指摘なし	-	
			外壁	16年	-	更新(塗装等)		A		外壁	-				要是正	-	
			受変電								受変電						
			非常電源								非常電源						
			空調	16年	-	-	-	A	-	空調	-				指摘なし	-	
			衛生	16年	-	-	-	A	-	衛生	-				指摘なし	-	
			防災								防災						
			昇降								昇降						
			概算費用(千円)		-	4,279	-				区分	-				3	
行政系施設	6-1	北消防署 延床面積 1,918.36㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	27年		更新(防水)		A	-	屋上・屋根	Ⅲ:未更新のまま				指摘なし	-	
			外壁	27年		未更新(塗装等)		A	10年以内	外壁	Ⅲ:未更新のまま				要是正	10年以内	
			受変電	27年		更新(受変電)		A	-	受変電	Ⅲ:未更新のまま					-	
			非常電源								非常電源						
			空調	27年		更新(熱源機等)		A	-	空調	Ⅲ:未更新のまま				要是正	-	
			衛生	27年		更新(給排水管)		A	-	衛生	Ⅲ:未更新のまま				要是正	-	
			防災								防災						
			昇降								昇降						
			概算費用(千円)		105,254	-	-				区分	3				3	
行政系施設	6-2	北消防署 附属体育館棟 延床面積 437.29㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	27年		未更新(防水)		A	10年以内	屋上・屋根	Ⅲ:未更新のまま				指摘なし	10年以内	
			外壁	27年		未更新(塗装等)		A	10年以内	外壁	Ⅲ:未更新のまま				要是正	10年以内	
			受変電								受変電						
			非常電源								非常電源						
			空調	27年		更新(空調配管)		A	-	空調	Ⅲ:未更新のまま				指摘なし	-	
			衛生	27年		更新(給排水管)		A	-	衛生	Ⅲ:未更新のまま				指摘なし	-	
			防災								防災						
			昇降								昇降						
			概算費用(千円)		19,232	-	-				区分	3				3	

旭川市公共施設等総合管理計画 第1期アクションプログラム施設保全計画表取組状況【令和3年度版】

※2019～2021年度の予定欄は、更新周期を経過していないものは「-」とした。
 ※主な更新周期は各施設の長期修繕計画を参考とした。

【施設保全計画表】（平成31年3月時点）										令和2年度末の状況						
大分類	No.	施設(建物名)	予防保全部位	更新後等の経過年数～2018	第1期アクションプログラム期間(H31～R9)			施設の状況	未更新等の経過期間(3区分)	予防保全部位	2019～2021年度(令和元～3年度)の予定	2019～2021年度の内容			施設の状況	未更新等の経過期間(3区分)
					2019-2021	2022-2024	2025-2027					2019実績(令和元年度)	2020実績(令和2年度)	2021予定(令和3年度)		
行政系施設	7-1	クリーンセンター事業所 延床面積 1,282.92㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	38年						屋上・屋根	Ⅲ：未更新のまま				指摘なし	10年超え
			外壁	38年						外壁	Ⅲ：未更新のまま				指摘なし	10年超え
			受変電	38年						受変電	Ⅲ：未更新のまま				指摘なし	10年超え
			非常電源	38年		作成中				非常電源						
			空調	38年						空調	Ⅱ：一部実施(予定を含む)				指摘なし	10年超え
			衛生	38年						衛生	Ⅱ：一部実施(予定を含む)		給湯ボイラー更新		要是正	10年超え
			防災	38年						防災	Ⅲ：未更新のまま				指摘なし	10年超え
			昇降	38年						昇降						
			概算費用(千円)								区分	3				3
行政系施設	7-2	クリーンセンター車庫 延床面積 1,534.54㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	38年						屋上・屋根	Ⅲ：未更新のまま				指摘なし	10年超え
			外壁	38年						外壁	Ⅲ：未更新のまま				指摘なし	10年超え
			受変電	38年						受変電	Ⅲ：未更新のまま				指摘なし	10年超え
			非常電源	38年		作成中				非常電源						
			空調	38年						空調	Ⅲ：未更新のまま				要是正	10年超え
			衛生	38年						衛生	Ⅲ：未更新のまま				要是正	10年超え
			防災	38年						防災						
			昇降	38年						昇降						
			概算費用(千円)								区分	3				3
行政系施設	8-1	土木事業所管理棟 延床面積 1,031.45㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	37年						屋上・屋根	Ⅲ：未更新のまま				指摘なし	10年以内
			外壁	37年						外壁	Ⅲ：未更新のまま				指摘なし	10年超え
			受変電	37年						受変電	Ⅰ：計画通り実施(予定を含む)		更新予定(受変電)		要是正	10年以内
			非常電源	37年		作成中				非常電源	Ⅲ：未更新のまま				指摘なし	10年以内
			空調	37年						空調	Ⅲ：未更新のまま				指摘なし	10年超え
			衛生	37年						衛生	Ⅲ：未更新のまま				指摘なし	10年以内
			防災	37年						防災						
			昇降	37年						昇降						
			概算費用(千円)								区分	3				3
行政系施設	8-2	土木事業所整備場 延床面積 605.85㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	37年						屋上・屋根	Ⅲ：未更新のまま				指摘なし	10年以内
			外壁	37年						外壁	Ⅲ：未更新のまま				指摘なし	10年超え
			受変電	37年						受変電						
			非常電源	37年		作成中				非常電源						
			空調	37年						空調						
			衛生	37年						衛生						
			防災	37年						防災						
			昇降	37年						昇降						
			概算費用(千円)								区分	3				1

旭川市公共施設等総合管理計画 第1期アクションプログラム施設保全計画表取組状況【令和3年度版】

※2019～2021年度の予定欄は、更新周期を超過していないものは「-」とした。
 ※主な更新周期は各施設の長期修繕計画を参考とした。

【施設保全計画表】（平成31年3月時点）										令和2年度末の状況							
大分類	No.	施設(建物名)	予防保全部位	更新後等の経過年数～2018	第1期アクションプログラム期間(H31～R9)			施設の状況	未更新等の経過期間(3区分)	予防保全部位	2019～2021年度(令和元～3年度)の予定	2019～2021年度の内容			施設の状況	未更新等の経過期間(3区分)	
					2019-2021	2022-2024	2025-2027					2019実績(令和元年度)	2020実績(令和2年度)	2021予定(令和3年度)			
行政系施設	8-3	土木事業所車庫 延床面積 324.00㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	29年						屋上・屋根	Ⅲ:未更新のまま				指摘なし	5年以内	
			外壁	29年						外壁	Ⅲ:未更新のまま				指摘なし	10年超え	
			受変電	29年						受変電							
			非常電源	29年		作成中				非常電源							
			空調	29年						空調							
			衛生	29年						衛生							
			防災	29年						防災							
			昇降	29年						昇降							
			概算費用(千円)								区分	3				1	
行政系施設	9-1	北海道エアポート(株)旭川空港事務所 延床面積 1,124.96㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	37年	未更新(屋根)			C	-	屋上・屋根	Ⅱ:一部実施(予定を含む)	一部更新(部分補修)			要是正	10年以内	
			外壁	37年	未更新(塗装等)			C	-	外壁	Ⅱ:一部実施(予定を含む)	一部更新(部分補修)			要是正	10年超え	
			受変電	37年	未更新(受変電)			A		受変電	Ⅱ:一部実施(予定を含む)	更新済み(VCB等のみ)			指摘なし	10年以内	
			非常電源	37年	未更新(発電機)			A		非常電源	Ⅲ:未更新のまま				指摘なし	10年超え	
			空調							空調							
			衛生	37年	未更新(給排水管)			A	-	衛生	Ⅲ:未更新のまま				指摘なし	10年以内	
			防災	37年	未更新(ポンプ)			A		防災	Ⅲ:未更新のまま				指摘なし	10年超え	
			昇降							昇降							
			概算費用(千円)		195,783	-	-				区分	3				3	
行政系施設	9-2	旭川空港消防車庫A棟 延床面積 333.50㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	7年	-	-	-	A	-	屋上・屋根	-				指摘なし	-	
			外壁	7年	-	-	-	A	-	外壁	-				指摘なし	-	
			受変電								受変電						
			非常電源								非常電源						
			空調	7年	-	-	-	A	-	空調	-				指摘なし	-	
			衛生	7年	-	-	-	A	-	衛生	-				指摘なし	-	
			防災								防災						
			昇降								昇降						
			概算費用(千円)		-	-	-				区分	-				1	
行政系施設	9-3	旭川空港消防車庫B棟 延床面積 792.07㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	23年	-	-	更新(防水)	A	-	屋上・屋根	-				指摘なし	-	
			外壁	23年	未更新(塗装等)				A	5年以内	外壁	Ⅲ:未更新のまま				指摘なし	10年以内
			受変電	23年	-	-	更新(受変電)	A	-	受変電	-				指摘なし	-	
			非常電源								非常電源						
			空調	23年	未更新(熱源機)			更新(空調配管)	A	5年以内	空調	Ⅲ:未更新のまま				指摘なし	10年以内
			衛生	23年	-	-	更新(給排水管)	A	-	衛生	-				指摘なし	-	
			防災								防災						
			昇降								昇降						
			概算費用(千円)		9,702	-	21,839				区分	3				1	

旭川市公共施設等総合管理計画 第1期アクションプログラム施設保全計画表取組状況【令和3年度版】

※2019～2021年度の予定欄は、更新周期を超過していないものは「-」とした。
 ※主な更新周期は各施設の長期修繕計画を参考とした。

【施設保全計画表】（平成31年3月時点）										令和2年度末の状況							
大分類	No.	施設(建物名)	予防保全部位	更新後等の経過年数～2018	第1期アクションプログラム期間(H31～R9)			施設の状況	未更新等の経過期間(3区分)	予防保全部位	2019～2021年度(令和元～3年度)の予定	2019～2021年度の内容			施設の状況	未更新等の経過期間(3区分)	
					2019～2021	2022～2024	2025～2027					2019実績(令和元年度)	2020実績(令和2年度)	2021予定(令和3年度)			
行政系施設	9-4	旭川空港除雪車庫1号棟 延床面積 557.01㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	22年	-	-	更新(防水)	A	-	屋上・屋根	-				指摘なし	-	
			外壁	22年	未更新(塗装等)				A	5年以内	外壁	Ⅲ:未更新のまま				指摘なし	5年以内
			受変電								受変電						
			非常電源								非常電源						
			空調								空調						
			衛生								衛生						
			防災								防災						
			昇降								昇降						
			概算費用(千円)		5,706	-	11,537				区分	3				1	
行政系施設	9-5	旭川空港除雪車庫2号棟 延床面積 499.50㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	5年	-	-	-	A	-	屋上・屋根	-				指摘なし	-	
			外壁	21年	未更新(塗装等)				A	5年以内	外壁	Ⅲ:未更新のまま				指摘なし	5年以内
			受変電								受変電						
			非常電源								非常電源						
			空調								空調						
			衛生	21年	-	-	更新(給排水管)	A	-	衛生	-					指摘なし	-
			防災								防災						
			昇降								昇降						
			概算費用(千円)		6,711	-	2,439				区分	3				1	
行政系施設	9-6	旭川空港除雪車庫3号棟 延床面積 553.87㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	20年	-	-	-	A	-	屋上・屋根	-				指摘なし	-	
			外壁	20年	未更新(塗装等)				A	5年以内	外壁	Ⅲ:未更新のまま				指摘なし	5年以内
			受変電								受変電						
			非常電源								非常電源						
			空調								空調						
			衛生	20年	-	-	-	A	-	衛生	-					指摘なし	-
			防災								防災						
			昇降								昇降						
			概算費用(千円)		4,798	-	-				区分	3				1	
行政系施設	10	旭川市総合防災センター 延床面積 4,959.45㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	10年	-	-	-	A	-	屋上・屋根	-				要是正	-	
			外壁	10年	-	-	-	A	-	外壁	-				要是正	-	
			受変電	10年	-	-	-	A	-	受変電	-				指摘なし	-	
			非常電源	10年	-	-	-	A	-	非常電源	-				指摘なし	-	
			空調	10年	-	-	-	A	-	空調	-				指摘なし	-	
			衛生	10年	-	-	-	A	-	衛生	-				指摘なし	-	
			防災	10年	-	-	-	A	-	防災	-				指摘なし	-	
			昇降	10年	-	-	-	A	-	昇降	-				指摘なし	-	
			概算費用(千円)		-	-	-				区分	-				3	

旭川市公共施設等総合管理計画 第1期アクションプログラム施設保全計画表取組状況【令和3年度版】

※2019～2021年度の予定欄は、更新周期を超過していないものは「-」とした。
 ※主な更新周期は各施設の長期修繕計画を参考とした。

【施設保全計画表】（平成31年3月時点）										令和2年度末の状況								
大分類	No.	施設(建物名)	予防保全部位	更新後等の経過年数～2018	第1期アクションプログラム期間(H31～R9)			施設の状況	未更新等の経過期間(3区分)	予防保全部位	2019～2021年度(令和元～3年度)の予定	2019～2021年度の内容			施設の状況	未更新等の経過期間(3区分)		
					2019～2021	2022～2024	2025～2027					2019実績(令和元年度)	2020実績(令和2年度)	2021予定(令和3年度)				
供給処理施設	1	中園廃棄物最終処分場 汚水処理棟 延床面積 543.23㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	17年	-	-	-	A	-	屋上・屋根	-				要是正	-		
			外壁	17年	-	-	-	A	-	外壁	-				指摘なし	-		
			受変電	17年	未更新(受変電)				A	10年超え	受変電	-				要是正	-	
			非常電源								非常電源							
			空調	17年	更新(熱源機)				A	-	空調	Ⅲ:未更新のまま				指摘なし	5年以内	
			衛生	17年	更新(ポンプ)				A	-	衛生	-				指摘なし	-	
			防災								防災							
			昇降								昇降							
			概算費用(千円)				20,700	-	-			区分	3				3	
			供給処理施設	2	環境センター管理棟・ポンプ室 延床面積 3,177.54㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	28年	未更新(防水)			A	10年以内	屋上・屋根	Ⅲ:未更新のまま				要是正
外壁	28年	未更新(塗装等)							A	10年以内	外壁	Ⅲ:未更新のまま				要是正	10年超え	
受変電	28年	更新(受変電)							A	-	受変電	Ⅲ:未更新のまま				要是正	5年以内	
非常電源											非常電源							
空調	28年	更新(熱源機等)							A	-	空調	Ⅲ:未更新のまま				要是正	10年超え	
衛生	28年	更新(ポンプ)							A	-	衛生	Ⅱ:一部実施(予定を含む)			圧送ポンプ補修	要是正	10年超え	
防災	28年	更新(ポンプ)							A	-	防災	Ⅲ:未更新のまま				指摘なし	10年超え	
昇降											昇降							
概算費用(千円)								-	-			区分	3				3	
供給処理施設	3	廃棄物処分場 浸出水処理棟・管理棟 延床面積 3,197.52㎡ 目標使用年数 65年				屋上・屋根	16年	-	-	-	A	-	屋上・屋根	-				要是正
			外壁	16年	-	更新(塗装等)			A	-	外壁	-				要是正	-	
			受変電	16年	-	-	-		A	-	受変電	-				要是正	-	
			非常電源	16年	-	-	-		A	-	非常電源	-				指摘なし	-	
			空調	16年	-	-	-		A	-	空調	-				要是正	-	
			衛生	16年	-	-	-		A	-	衛生	-				指摘なし	-	
			防災								防災							
			昇降								昇降							
			概算費用(千円)				-	50,000	-			区分	-				3	

旭川市公共施設等総合管理計画 第1期アクションプログラム施設保全計画表取組状況【令和3年度版】

※2019～2021年度の予定欄は、更新周期を経過していないものは「-」とした。
 ※主な更新周期は各施設の長期修繕計画を参考とした。

【施設保全計画表】（平成31年3月時点）										令和2年度末の状況							
大分類	No.	施設(建物名)	予防保全部位	更新後等の経過年数～2018	第1期アクションプログラム期間(H31～R9)			施設の状況	未更新等の経過期間(3区分)	予防保全部位	2019～2021年度(令和元～3年度)の予定	2019～2021年度の内容			施設の状況	未更新等の経過期間(3区分)	
					2019-2021	2022-2024	2025-2027					2019実績(令和元年度)	2020実績(令和2年度)	2021予定(令和3年度)			
その他	1	旭川聖苑 延床面積 6,252.98㎡ 目標使用年数 80年	屋上・屋根	19年	-	-	-	A	-	屋上・屋根	-				指摘なし	-	
			外壁	19年	更新(塗装等)				C	-	外壁	Ⅲ:未更新のまま				指摘なし	5年以内
			受変電	19年	-	-	-	A	-	受変電	-				指摘なし	-	
			非常電源	19年	-	-	-	A	-	非常電源	-	更新済み(制御盤)			指摘なし	-	
			空調	19年	-			A	-	空調	Ⅲ:未更新のまま				指摘なし	5年以内	
			衛生	19年	更新(ポンプ)			A	-	衛生	Ⅲ:未更新のまま				指摘なし	5年以内	
			防災	19年	更新(ポンプ)			A	-	防災	Ⅲ:未更新のまま				指摘なし	5年以内	
			昇降	19年	-	-	-	A	-	昇降	-				指摘なし	-	
			概算費用(千円)					33,381	-	-			区分	3			
その他	2	動物愛護センター 延床面積 734.54㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	6年	-	-	-	A	-	屋上・屋根	-				指摘なし	-	
			外壁	6年	-	-	-	A	-	外壁	-				指摘なし	-	
			受変電								受変電						
			非常電源								非常電源						
			空調	6年	-	-	-	A	-	空調	-				指摘なし	-	
			衛生	6年	-	-	-	A	-	衛生	-				指摘なし	-	
			防災								防災						
			昇降	6年	-	-	-	A	-	昇降	-				指摘なし	-	
			概算費用(千円)					-	-	-			区分	-			
その他	3	旭川駅前広場駐車 駐輪場 延床面積 2,436.72㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	6年	-	-	-	A	-	屋上・屋根	-	一部修繕(屋上)			指摘なし	-	
			外壁	6年	-	-	-	A	-	外壁	-				指摘なし	-	
			受変電								受変電						
			非常電源								非常電源						
			空調								空調						
			衛生	6年	-	-	-	A	-	衛生	-				指摘なし	-	
			防災								防災						
			昇降								昇降						
			概算費用(千円)					-	-	-			区分	-			
