

旭川市公共施設等総合管理計画 第1期アクションプログラム施設保全計画表取組状況【令和5年度版】

■施設保全計画策定時(平成31年3月)の施設の状況

施設の状況	件数	割合
1 「A:劣化・損傷がない」又は「B:わずかな劣化損傷のみ」がみられるが、補修・修繕を施す程度には至っていない」項目のみ	68	66.7%
2 「C:ある程度の劣化・損傷が見られるため、進行経過を注視し、計画的に補修・修繕する必要がある」項目がある	8	7.8%
3 「D:劣化・損傷が著しく、危害を及ぼすおそれがあるため、直ちに補修・修繕を必要とする」項目がある	3	2.9%
- 評価なし(個別施設計画作成中)	23	22.5%
計	102	100.0%

※個別施設保全計画未作成施設(16施設23件)  
※学校(59施設)を除く

■令和5年度当初の施設状況及び計画的な更新状況

施設の状況	件数	割合	計画的な更新状況	件数	割合
1 予防保全部位に指摘がない	52	50.5%	1 「I:計画通り実施(予定を含む)」の項目のみ	3	2.9%
2 予防保全部位に「要是正(既存不適格)」の項目がある	1	1.0%	2 「II:一部実施(予定を含む)」の項目がある	3	2.9%
3 予防保全部位に「要是正」の項目がある	50	48.5%	3 「III:未更新のまま」の項目がある	79	76.7%
-			- 未更新の項目なし	18	17.5%
計	103	100.0%	計	103	100.0%

※個別施設保全計画未作成施設(16施設23件)  
※学校を除く




○施設の状況の区分(複数区分に該当の場合は、低い区分に分類)

- 区分1 予防保全部位に指摘がない
- 区分2 予防保全部位に「要是正(既存不適格)」の項目がある
- 区分3 予防保全部位に「要是正」の項目がある

※定期点検・通常点検結果の判定区分の変更に合わせて、4区分から3区分に修正している。  
※既存不適格：建築基準法等が改正及び施行され、建築物の全部又は一部が適法しなくなってしまう状態をいう。基本的には、迅速に適合させるための改修はしなくてよいが、増築、改築等の工事を行う際は、適合させなければならない。

○計画的な更新状況の区分(複数区分に該当の場合は、低い区分に分類)

- 区分1 「I:計画どおり実施(予定を含む)」の項目のみ
- 区分2 「II:一部実施(予定を含む)」の項目がある
- 区分3 「III:未更新のまま」の項目がある
- 区分なし 更新周期を経過した項目がないもの

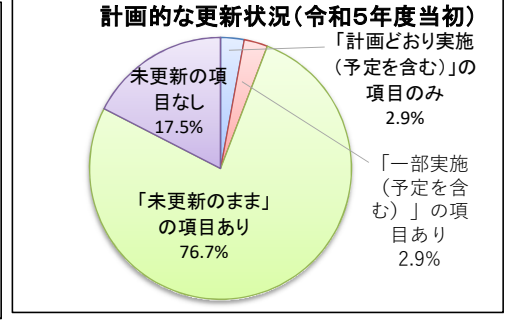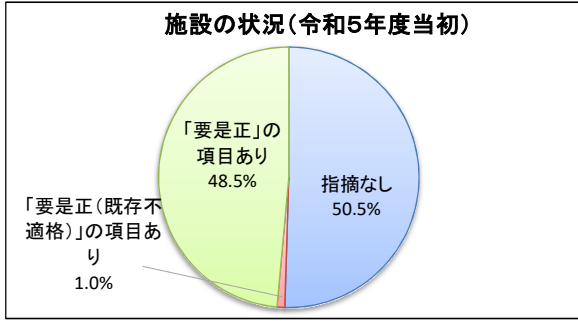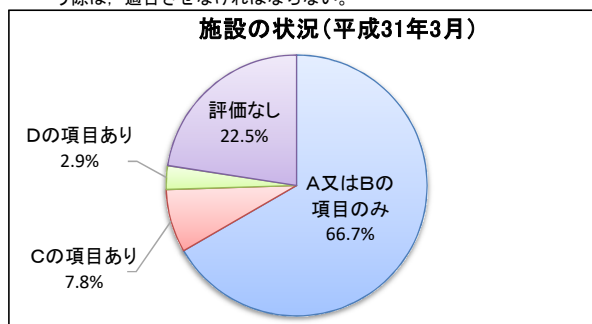

■令和5年度当初の状況

- ・施設の状況としては、予防保全部位に「要是正」の項目がある施設が48.5%となっており、昨年度から1ポイント改善されていますが、依然として約半数の施設において、何らかの補修や修繕が必要になっています。
- ・計画的な更新状況は、76.7%の施設が未更新のままの予防保全部位がある状況となっています。この中には、更新周期も10年以上経過し、「要是正」となっている予防保全部位がある施設も含まれており、必要な更新が十分に実施できていない状況となっています。

旭川市公共施設等総合管理計画

第1期アクションプログラム 施設保全計画表取組状況【令和5年度版】

※未更新等の経過期間は、更新周期を経過していないものは「-」とした。  
 ※主な更新周期は各施設の長期修繕計画を参考とした。

【施設保全計画表】(平成31年3月時点)									令和5年4月1日の状況									
大分類	No.	施設(建物名)	予防保全部位	更新後等の経過年数~2018	第1期アクションプログラム期間(H31~R9)			施設の状況	未更新等の経過期間(3区分)	予防保全部位	2023(令和5)年4月1日の更新状況	2019~2021年度		2022~2024年度の内容			施設の状況	未更新等の経過期間(3区分)
					2019~2021	2022~2024	2025~2027					実績	2022実績(令和4年度)	2023予定(令和5年度)	2024予定(令和6年度)			
市民文化系施設	1	ときわ市民ホール 延床面積 4,927.28㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	30年	未更新(防水等)			A	5年以内	屋上・屋根	Ⅲ:未更新のまま					指摘なし	5年以内	
			外壁	30年	未更新(塗装等)			A	10年超え	外壁	Ⅲ:未更新のまま					指摘なし	10年超え	
			受変電	30年	未更新(受変電)			A	5年以内	受変電	I:計画通り実施(予定を含む)	更新(受変電)				指摘なし	-	
			非常電源	30年	未更新(発電機)			A	5年以内	非常電源	Ⅲ:未更新のまま					指摘なし	5年以内	
			空調	30年	未更新(熱源機等)			A	10年超え	空調	Ⅲ:未更新のまま					指摘なし	10年超え	
			衛生	30年	未更新(ポンプ等)			A	5年以内	衛生	Ⅱ:一部実施(予定を含む)	更新(給湯設備)					指摘なし	5年以内
			防災	30年	未更新(ポンプ)		更新(中央監視)		A	10年超え	防災	Ⅲ:未更新のまま				更新(中央監視)	要是正(既存不適格)	10年超え
			昇降	30年	未更新(エレベーター)				A	5年以内	昇降	Ⅲ:未更新のまま					指摘なし	5年以内
			概算費用(千円)			219,621	65,846	-			区分	3					2	
市民文化系施設	2	勤労者福祉会館 延床面積 2,587.46㎡ 目標使用年数 65年 「要」耐震診断	屋上・屋根	37年	未更新(屋根等)			A	10年以内	屋上・屋根	Ⅲ:未更新のまま					指摘なし	10年超え	
			外壁	37年	未更新(塗装等)			A	10年超え	外壁	Ⅲ:未更新のまま					指摘なし	10年超え	
			受変電	37年	未更新(受変電)			A	10年以内	受変電	I:計画通り実施(予定を含む)	更新済み(受変電)				指摘なし	-	
			非常電源	37年	未更新(発電機)			A	10年以内	非常電源	Ⅲ:未更新のまま					指摘なし	10年超え	
			空調	37年	未更新(熱源機等)			A	10年以内	空調	Ⅲ:未更新のまま					指摘なし	10年超え	
			衛生	37年	未更新(ポンプ等)			A	10年以内	衛生	Ⅲ:未更新のまま					指摘なし	10年超え	
			防災	37年	未更新(ポンプ)			A	10年超え	防災	Ⅲ:未更新のまま					指摘なし	10年超え	
			昇降								昇降							
			概算費用(千円)			88,249	-	-			区分	3					1	
市民文化系施設	3	東部住民センター 延床面積 1,497.03㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	36年	未更新(防水)			A	10年以内	屋上・屋根	Ⅲ:未更新のまま					要是正	10年超え	
			外壁	14年	-	更新(塗装等)			A	-	外壁	-				更新(塗装等)	要是正	-
			受変電								受変電							
			非常電源								非常電源							
			空調	36年	未更新(空調配管)			A	10年以内	空調	Ⅲ:未更新のまま					指摘なし	10年超え	
			衛生	36年	未更新(給排水管)		更新(ポンプ)		A	10年以内	衛生	Ⅲ:未更新のまま					指摘なし	10年超え
			防災								防災							
			昇降								昇降							
			概算費用(千円)			21,758	5,878	1,878			区分	3					3	

旭川市公共施設等総合管理計画

第1期アクションプログラム 施設保全計画表取組状況【令和5年度版】

※未更新等の経過期間は、更新周期を経過していないものは「-」とした。  
 ※主な更新周期は各施設の長期修繕計画を参考とした。

【施設保全計画表】(平成31年3月時点)									令和5年4月1日の状況										
大分類	No.	施設(建物名)	予防保全部位	更新後等の経過年数~2018	第1期アクションプログラム期間(H31~R9)			施設の状況	未更新等の経過期間(3区分)	予防保全部位	2023(令和5年4月1日)の更新状況	2019~2021年度		2022~2024年度の内容			施設の状況	未更新等の経過期間(3区分)	
					2019~2021	2022~2024	2025~2027					実績	2022実績(令和4年度)	2023予定(令和5年度)	2024予定(令和6年度)				
市民文化系施設	4	北部住民センター 延床面積 1,255.35㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	33年	未更新(防水)			A	5年以内	屋上・屋根	I:計画通り実施(予定を含む)			更新(塗装)	更新(屋根二重化)		指摘なし	10年以内	
			外壁	33年	未更新(塗装一部)	更新(塗装一部)			A	10年超え	外壁	III:未更新のまま						要是正	10年超え
			受変電								受変電								
			非常電源								非常電源								
			空調	33年	未更新(配管)				A	5年以内	空調	III:未更新のまま						指摘なし	10年以内
			衛生	33年	未更新(給排水管)				A	5年以内	衛生	III:未更新のまま						指摘なし	10年以内
			防災								防災								
			昇降								昇降								
			概算費用(千円)			39,491	5,956	-				区分	3						3
市民文化系施設	5	永山住民センター 延床面積 1,260.08㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	32年	未更新(屋根等)			A	5年以内	屋上・屋根	III:未更新のまま						要是正	10年以内	
			外壁	14年	-	更新(塗装等)			A	-	外壁	-			更新(塗装等)		要是正	-	
			受変電								受変電								
			非常電源								非常電源								
			空調	32年	未更新(熱源機等)				A	10年超え	空調	II:一部実施(予定を含む)	更新(温風暖房機一部)					指摘なし	10年超え
			衛生	32年	未更新(ポンプ等)				A	5年以内	衛生	II:一部実施(予定を含む)	更新(給水ポンプ)					指摘なし	10年以内
			防災								防災								
			昇降								昇降								
			概算費用(千円)			49,941	7,986	-				区分	3						3
市民文化系施設	6	神居住民センター 延床面積 1,260.08㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	30年	未更新(防水)			A	5年以内	屋上・屋根	III:未更新のまま						指摘なし	5年以内	
			外壁	30年	未更新(塗装等)				A	10年超え	外壁	III:未更新のまま						要是正	10年超え
			受変電								受変電								
			非常電源								非常電源								
			空調	30年	未更新(熱源機等)				A	10年超え	空調	III:未更新のまま						指摘なし	10年超え
			衛生	30年	未更新(ポンプ等)				A	10年超え	衛生	III:未更新のまま						要是正	10年超え
			防災								防災								
			昇降								昇降								
			概算費用(千円)			43,290	-	-				区分	3						3

旭川市公共施設等総合管理計画

第1期アクションプログラム 施設保全計画表取組状況【令和5年度版】

※未更新等の経過期間は、更新周期を経過していないものは「-」とした。  
 ※主な更新周期は各施設の長期修繕計画を参考とした。

【施設保全計画表】(平成31年3月時点)										令和5年4月1日の状況										
大分類	No.	施設(建物名)	予防保全部位	更新後等の経過年数 ~2018	第1期アクションプログラム期間(H31~R9)			施設の状況	未更新等の経過期間 (3区分)	予防保全部位	2023(令和5年) 4月1日の更新状況	2019~2021年度		2022~2024年度の内容			施設の状況	未更新等の経過期間 (3区分)		
					2019~2021	2022~2024	2025~2027					実績	2022実績 (令和4年度)	2023予定 (令和5年度)	2024予定 (令和6年度)					
市民文化系施設	7	末広地区センター 延床面積 827.76㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	28年	更新(防水)			A	-	屋上・屋根	Ⅲ:未更新のまま						指摘なし	5年以内		
			外壁	28年	未更新(塗装等)				A	10年以内	外壁	Ⅱ:一部実施(予定を含む)	更新(外壁塗装)					指摘なし	10年超え	
			受変電								受変電									
			非常電源								非常電源									
			空調								空調	Ⅱ:一部実施(予定を含む)		更新(温風暖房機一部)				指摘なし	5年以内	
			衛生	28年	更新(給排水管)				A	-	衛生	Ⅲ:未更新のまま						指摘なし	5年以内	
			防災								防災									
			昇降								昇降									
			概算費用(千円)				31,125	-	-			区分	3						1	
			市民文化系施設	8	豊岡地区センター 延床面積 803.56㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	27年	更新(防水)			A	-	屋上・屋根	Ⅲ:未更新のまま						要是正
外壁	27年	未更新(塗装等)							A	10年以内	外壁	Ⅲ:未更新のまま						要是正	10年超え	
受変電											受変電									
非常電源											非常電源									
空調											空調									
衛生	27年	更新(給排水管)							A	-	衛生	Ⅲ:未更新のまま						指摘なし	5年以内	
防災											防災									
昇降											昇降									
概算費用(千円)							40,135	-	-			区分	3						3	
市民文化系施設	9	忠和地区センター 延床面積 810.75㎡ 目標使用年数 65年				屋上・屋根	27年	更新(防水)			A	-	屋上・屋根	Ⅲ:未更新のまま						要是正
			外壁	27年	未更新(塗装等)				A	10年以内	外壁	Ⅲ:未更新のまま						要是正	10年超え	
			受変電								受変電									
			非常電源								非常電源									
			空調	27年	更新(空調配管)				A	-	空調	Ⅲ:未更新のまま						指摘なし	5年以内	
			衛生	27年	更新(給排水管)				A	-	衛生	Ⅲ:未更新のまま						指摘なし	5年以内	
			防災								防災									
			昇降								昇降									
			概算費用(千円)				30,903	-	-			区分	3						3	

旭川市公共施設等総合管理計画

第1期アクションプログラム 施設保全計画表取組状況【令和5年度版】

※未更新等の経過期間は、更新周期を経過していないものは「-」とした。  
 ※主な更新周期は各施設の長期修繕計画を参考とした。

【施設保全計画表】（平成31年3月時点）										令和5年4月1日の状況									
大分類	No.	施設(建物名)	予防保全部位	更新後等の経過年数～2018	第1期アクションプログラム期間(H31～R9)			施設の状況	未更新等の経過期間(3区分)	予防保全部位	2023(令和5年)4月1日の更新状況	2019-2021年度		2022～2024年度の内容			施設の状況	未更新等の経過期間(3区分)	
					2019-2021	2022-2024	2025-2027					実績	2022実績(令和4年度)	2023予定(令和5年度)	2024予定(令和6年度)				
市民文化系施設	10	啓明地区センター 延床面積 820.36㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	22年	-	-	更新(防水)	A	-	屋上・屋根	-					指摘なし	-		
			外壁	22年	未更新(塗装等)				A	5年以内	外壁	Ⅲ:未更新のまま					指摘なし	10年以内	
			受変電								受変電								
			非常電源								非常電源								
			空調	22年	-	-	更新(空調配管)	A	-	空調	-						指摘なし	-	
			衛生	22年	-	-	更新(衛生配管)	A	-	衛生	-						指摘なし	-	
			防災								防災								
			昇降								昇降								
			概算費用(千円)				14,071	-	32,256			区分	3					1	
			市民文化系施設	11	神楽岡地区センター 延床面積 830.74㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	20年						屋上・屋根	-					指摘なし
外壁	20年									外壁	Ⅲ:未更新のまま					指摘なし	5年以内		
受変電	20年									受変電									
非常電源	20年					作成中				非常電源									
空調	20年									空調	Ⅱ:一部実施(予定を含む)		更新(温風暖房機一部)				指摘なし	-	
衛生	20年									衛生	-						指摘なし	-	
防災	20年									防災									
昇降										昇降									
概算費用(千円)											区分	3						1	
市民文化系施設	12	新旭川地区センター 延床面積 827.63㎡ 目標使用年数 65年				屋上・屋根	19年						屋上・屋根	-					指摘なし
			外壁	19年						外壁	Ⅲ:未更新のまま					指摘なし	5年以内		
			受変電	19年						受変電									
			非常電源	19年		作成中				非常電源									
			空調	19年						空調	-						指摘なし	-	
			衛生	19年						衛生	-						指摘なし	-	
			防災	19年						防災									
			昇降							昇降									
			概算費用(千円)								区分	3						1	

旭川市公共施設等総合管理計画

第1期アクションプログラム 施設保全計画表取組状況【令和5年度版】

※未更新等の経過期間は、更新周期を経過していないものは「-」とした。  
 ※主な更新周期は各施設の長期修繕計画を参考とした。

【施設保全計画表】(平成31年3月時点)										令和5年4月1日の状況								
大分類	No.	施設(建物名)	予防保全部位	更新後等の経過年数~2018	第1期アクションプログラム期間(H31~R9)			施設の状況	未更新等の経過期間(3区分)	予防保全部位	2023(令和5年4月1日の更新状況)	2019~2021年度		2022~2024年度の内容			施設の状況	未更新等の経過期間(3区分)
					2019~2021	2022~2024	2025~2027					実績	2022実績(令和4年度)	2023予定(令和5年度)	2024予定(令和6年度)			
市民文化系施設	13	北星地区センター 延床面積 850.78㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	17年						屋上・屋根	-						指摘なし	-
			外壁	17年						外壁	Ⅲ:未更新のまま						要是正	5年以内
			受変電	17年						受変電								
			非常電源	17年		作成中				非常電源								
			空調	17年						空調	-						指摘なし	-
			衛生	17年						衛生	-						指摘なし	-
			防災	17年						防災								
			昇降							昇降								
			概算費用(千円)							区分	3						3	
市民文化系施設	14	春光台地区センター 延床面積 1,101.15㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	17年	-	-	-	A	-	屋上・屋根	-						要是正	-
			外壁	17年	更新(塗装等)				A	-	外壁	Ⅲ:未更新のまま					要是正	5年以内
			受変電								受変電							
			非常電源								非常電源							
			空調	17年	-	-	-	A	-	空調	-						指摘なし	-
			衛生	17年	-	-	-	A	-	衛生	-						指摘なし	-
			防災								防災							
			昇降								昇降							
			概算費用(千円)	15,977	-	-				区分	3						3	
市民文化系施設	15	市民活動交流センター 延床面積 1,656.02㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	9年	-	-	-	A	-	屋上・屋根	-						要是正	-
			外壁	9年	-	-	-	A	-	外壁	-						要是正	-
			受変電	9年	-	-	-	A	-	受変電	-						指摘なし	-
			非常電源	9年	-	-	-	A	-	非常電源	-						指摘なし	-
			空調	9年	-	-	-	A	-	空調	-						指摘なし	-
			衛生	9年	-	-	-	A	-	衛生	-						指摘なし	-
			防災								防災							
			昇降	9年	-	-	-	A	-	昇降	-						指摘なし	-
			概算費用(千円)	-	-	-				区分	-						3	

旭川市公共施設等総合管理計画

第1期アクションプログラム 施設保全計画表取組状況【令和5年度版】

※未更新等の経過期間は、更新周期を経過していないものは「-」とした。

※主な更新周期は各施設の長期修繕計画を参考とした。

【施設保全計画表】（平成31年3月時点）										令和5年4月1日の状況									
大分類	No.	施設(建物名)	予防保全部位	更新後等の経過年数～2018	第1期アクションプログラム期間(H31～R9)			施設の状況	未更新等の経過期間(3区分)	予防保全部位	2023(令和5年)4月1日の更新状況	2019-2021年度		2022～2024年度の内容			施設の状況	未更新等の経過期間(3区分)	
					2019-2021	2022-2024	2025-2027					実績	2022実績(令和4年度)	2023予定(令和5年度)	2024予定(令和6年度)				
市民文化系施設	16	嵐山中央会館 延床面積 545.41㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	22年						屋上・屋根	-						指摘なし	-	
			外壁	22年						外壁	Ⅲ:未更新のまま						指摘なし	10年以内	
			受変電	22年		作成中				受変電									
			非常電源	22年						非常電源									
			空調	22年						空調	Ⅲ:未更新のまま							指摘なし	10年以内
			衛生	22年						衛生	-							指摘なし	-
			防災	22年						防災	Ⅲ:未更新のまま							指摘なし	10年以内
			昇降							昇降									
			概算費用(千円)								区分	3						1	
			市民文化系施設	17	旭川市民生活館 延床面積 822.35㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	30年						屋上・屋根	Ⅱ:一部実施(予定を含む)	屋上防水改修及び屋根塗装塗替				
外壁	30年									外壁	Ⅲ:未更新のまま						指摘なし	10年超え	
受変電	30年									受変電									
非常電源	30年					作成中				非常電源									
空調	30年									空調									
衛生	30年									衛生	Ⅲ:未更新のまま							指摘なし	5年以内
防災	30年									防災									
昇降										昇降									
概算費用(千円)		41,069									区分	3						1	

旭川市公共施設等総合管理計画

第1期アクションプログラム 施設保全計画表取組状況【令和5年度版】

※未更新等の経過期間は、更新周期を経過していないものは「-」とした。  
 ※主な更新周期は各施設の長期修繕計画を参考とした。

【施設保全計画表】(平成31年3月時点)										令和5年4月1日の状況							
大分類	No.	施設(建物名)	予防保全部位	更新後等の経過年数~2018	第1期アクションプログラム期間(H31~R9)			施設の状況	未更新等の経過期間(3区分)	予防保全部位	2023(令和5年)4月1日の更新状況	2019~2021年度		2022~2024年度の内容		施設の状況	未更新等の経過期間(3区分)
					2019~2021	2022~2024	2025~2027					実績	2022実績(令和4年度)	2023予定(令和5年度)	2024予定(令和6年度)		
市民文化系施設	18-1	神楽公民館 神楽市民交流センター 延床面積 5,258.98㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	29年	更新(屋根一部)			A	-	屋上・屋根	Ⅲ:未更新のまま					指摘なし	5年以内
			外壁	29年	未更新(シーリング)		更新(塗装等一部)	A	-	外壁	Ⅲ:未更新のまま					要是正	10年超え
			受変電	11年	更新(受変電)			A	-	受変電	-					指摘なし	-
			非常電源							非常電源							
			空調	29年	更新(暖房熱源等)		更新(冷暖房熱源)	A	-	空調	Ⅲ:未更新のまま					指摘なし	5年以内
			衛生	29年	更新(給排水管)		更新(ホップ)	A	-	衛生	Ⅲ:未更新のまま					指摘なし	5年以内
			防災	29年	未更新(ホップ等)			A	-	防災	Ⅲ:未更新のまま					指摘なし	5年以内
			昇降	11年	-	-	-	A	-	昇降	-					指摘なし	-
	概算費用(千円)			87,301	-	72,182			区分	3					3		
	18-2	木楽輪	屋上・屋根	29年	更新(屋根)			A	-	屋上・屋根	Ⅲ:未更新のまま			更新(屋根)		指摘なし	5年以内
			外壁	29年	未更新(塗装等)			A	10年以内	外壁	Ⅲ:未更新のまま			更新(サイディング)		指摘なし	10年超え
			概算費用(千円)			9,116	-	-			区分	3				1	
18-3	別棟倉庫 延床面積 720.93㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	29年	更新(防水)			A	10年以内	屋上・屋根	Ⅲ:未更新のまま					指摘なし	5年以内	
		外壁	29年	未更新(塗装等)			A	10年以内	外壁	Ⅲ:未更新のまま					指摘なし	10年超え	
		非常電源	11年	-	-	-	A	-	非常電源	Ⅱ:一部実施(予定を含む)	雷での障害による修繕実施				指摘なし	-	
		概算費用(千円)			10,679	-	-			区分	3				1		
市民文化系施設	19	末広公民館 延床面積 692.82㎡ 目標使用年数 65年 「要」耐震診断	屋上・屋根	39年	未更新(防水)			A	10年以内	屋上・屋根	Ⅱ:一部実施(予定を含む)	屋上立上バラベット一部修繕				要是正	10年超え
			外壁	39年	未更新(塗装等)			D	10年超え	外壁	Ⅲ:未更新のまま					要是正	10年超え
			受変電							受変電							
			非常電源							非常電源							
			空調							空調							
			衛生	39年	未更新(給排水管)			A	10年以内	衛生	Ⅱ:一部実施(予定を含む)	外部埋設給水館修繕				指摘なし	10年超え
			防災							防災							
			昇降							昇降							
概算費用(千円)			16,578	-	-			区分	3					3			



旭川市公共施設等総合管理計画

第1期アクションプログラム 施設保全計画表取組状況【令和5年度版】

※未更新等の経過期間は、更新周期を経過していないものは「-」とした。  
 ※主な更新周期は各施設の長期修繕計画を参考とした。

【施設保全計画表】(平成31年3月時点)										令和5年4月1日の状況									
大分類	No.	施設(建物名)	予防保全部位	更新後等の経過年数~2018	第1期アクションプログラム期間(H31~R9)			施設の状況	未更新等の経過期間(3区分)	予防保全部位	2023(令和5年)4月1日の更新状況	2019~2021年度		2022~2024年度の内容			施設の状況	未更新等の経過期間(3区分)	
					2019~2021	2022~2024	2025~2027					実績	2022実績(令和4年度)	2023予定(令和5年度)	2024予定(令和6年度)				
市民文化系施設	20	東鷹栖公民館 延床面積 1,987.08㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	27年	更新(防水等)			A	-	屋上・屋根	Ⅲ:未更新のまま						指摘なし	5年以内	
			外壁	27年	未更新(塗装等)				A	10年以内	外壁	Ⅲ:未更新のまま						指摘なし	10年超え
			受変電	27年	更新(受変電)				A	-	受変電	Ⅲ:未更新のまま						指摘なし	5年以内
			非常電源	27年	更新(発電機)				A	-	非常電源	Ⅱ:一部実施(予定を含む)	不完全燃焼により一部修繕 電源バッテリーの交換等					指摘なし	5年以内
			空調	27年	未更新(空調一部)				A	10年以内	空調	Ⅱ:一部実施(予定を含む)	ボイラー設備一部補修					指摘なし	10年超え
			衛生	27年	未更新(ポンプ)				A	10年以内	衛生	Ⅲ:未更新のまま						指摘なし	10年超え
			防災	27年	未更新(ポンプ)				A	10年以内	防災	Ⅲ:未更新のまま						指摘なし	10年超え
			昇降								昇降								
概算費用(千円)				111,711	-	-			区分	3						1			
市民文化系施設	21	北星公民館 延床面積 714.99㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	36年	未更新(防水等)			A	10年以内	屋上・屋根	Ⅰ:計画通り実施(予定を含む)	屋根補修					指摘なし	10年超え	
			外壁	36年	未更新(塗装等)	更新(タイル)			A	10年超え	外壁	Ⅲ:未更新のまま						指摘なし	10年超え
			受変電								受変電								
			非常電源								非常電源								
			空調								空調								
			衛生	36年	未更新(給排水管)				A	10年以内	衛生	Ⅲ:未更新のまま						指摘なし	10年超え
			防災								防災								
			昇降								昇降								
概算費用(千円)				29,054	2,882	-			区分	3						1			
市民文化系施設	22	新旭川公民館 延床面積 723.51㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	35年	未更新(防水)			A	10年以内	屋上・屋根	Ⅲ:未更新のまま						指摘なし	10年以内	
			外壁	35年	未更新(塗装等)				A	10年超え	外壁	Ⅲ:未更新のまま						指摘なし	10年超え
			受変電								受変電								
			非常電源								非常電源								
			空調								空調								
			衛生	35年	未更新(給排水管)				A	10年以内	衛生	Ⅲ:未更新のまま						指摘なし	10年以内
			防災								防災								
			昇降								昇降								
概算費用(千円)				25,291	-	-			区分	3						1			

旭川市公共施設等総合管理計画

第1期アクションプログラム 施設保全計画表取組状況【令和5年度版】

※未更新等の経過期間は、更新周期を経過していないものは「-」とした。  
 ※主な更新周期は各施設の長期修繕計画を参考とした。

【施設保全計画表】（平成31年3月時点）		令和5年4月1日の状況																	
大分類	No.	施設(建物名)	予防保全部位	更新後等の経過年数 ~2018	第1期アクションプログラム期間(H31~R9)			施設の状況	未更新等の経過期間 (3区分)	予防保全部位	2023(令和5年4月1日)の更新状況	2019~2021年度		2022~2024年度の内容			施設の状況	未更新等の経過期間 (3区分)	
					2019~2021	2022~2024	2025~2027					実績	2022実績 (令和4年度)	2023予定 (令和5年度)	2024予定 (令和6年度)				
市民文化系施設	23	春光台公民館 延床面積 727.14㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	3年	-	-	-	A	-	屋上・屋根	-						指摘なし	-	
			外壁	34年	未更新(塗装等)				A	10年超え	外壁	Ⅲ:未更新のまま						指摘なし	10年超え
			受変電								受変電								
			非常電源								非常電源								
			空調								空調								
			衛生	34年	未更新(給排水管)				A	5年以内	衛生	Ⅲ:未更新のまま						指摘なし	10年以内
			防災								防災								
			昇降								昇降								
			概算費用(千円)			11,038	-	-				区分	3						1
市民文化系施設	24	愛宕公民館 延床面積 730.55㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	32年	未更新(防水)			A	5年以内	屋上・屋根	Ⅲ:未更新のまま						指摘なし	10年以内	
			外壁	32年	未更新(塗装等)				A	10年超え	外壁	Ⅲ:未更新のまま						指摘なし	10年超え
			受変電								受変電								
			非常電源								非常電源								
			空調								空調								
			衛生	32年	未更新(給排水管)				A	5年以内	衛生	Ⅲ:未更新のまま						指摘なし	10年以内
			防災								防災								
			昇降								昇降								
			概算費用(千円)			24,925	-	-				区分	3						1
市民文化系施設	25	末広地域活動センター 延床面積 763.12㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	4年	-	-	-	A	-	屋上・屋根	-						指摘なし	-	
			外壁	4年	-	-	-	A	-	外壁	-						指摘なし	-	
			受変電								受変電								
			非常電源								非常電源								
			空調	4年	-	-	-	A	-	空調	-						指摘なし	-	
			衛生	4年	-	-	-	A	-	衛生	-						指摘なし	-	
			防災								防災								
			昇降								昇降								
			概算費用(千円)			-	-	-				区分	-						1

旭川市公共施設等総合管理計画

第1期アクションプログラム 施設保全計画表取組状況【令和5年度版】

※未更新等の経過期間は、更新周期を経過していないものは「-」とした。  
 ※主な更新周期は各施設の長期修繕計画を参考とした。

【施設保全計画表】(平成31年3月時点)								令和5年4月1日の状況										
大分類	No.	施設(建物名)	予防保全部位	更新後等の経過年数~2018	第1期アクションプログラム期間(H31~R9)			施設の状況	未更新等の経過期間(3区分)	予防保全部位	2023(令和5年)4月1日の更新状況	2019~2021年度		2022~2024年度の内容			施設の状況	未更新等の経過期間(3区分)
					2019~2021	2022~2024	2025~2027					実績	2022実績(令和4年度)	2023予定(令和5年度)	2024予定(令和6年度)			
市民文化系施設	26	緑が丘地域活動センター 延床面積 1,562.31㎡ 目標使用年数 80年	屋上・屋根							屋上・屋根	-					指摘なし	-	
			外壁							外壁	-					指摘なし	-	
			受変電							受変電								
			非常電源							非常電源								
			空調							空調	-						指摘なし	-
			衛生							衛生	-						指摘なし	-
			防災							防災	-						指摘なし	-
			昇降							昇降								
概算費用(千円)								区分	-						1			
市民文化系施設	27	大雪クリスタルホール 延床面積 0,698.78㎡ 目標使用年数 80年	屋上・屋根	25年	-	更新(防水一部)	A	-	屋上・屋根	Ⅱ:一部実施(予定を含む)		更新(防水)				要是正	-	
			外壁	25年	未更新(塗装等)			A	5年以内	外壁	Ⅲ:未更新のまま						要是正	10年以内
			受変電	25年	-	更新(受変電)	A	-	受変電	Ⅱ:一部実施(予定を含む)		一部更新(受電設備)			更新(受変電)	要是正	-	
			非常電源	25年	未更新(電源装置)	更新(発電機)	A	5年以内	非常電源	Ⅱ:一部実施(予定を含む)	一部更新(電源装置)		更新(発電機)			指摘なし	10年以内	
			空調	25年	未更新(冷房熱源等)	更新(暖房熱源等)	A	5年以内	空調	Ⅱ:一部実施(予定を含む)				更新(チラー)	要是正	10年以内		
			衛生	25年	未更新(ポンプ)	更新(給排水管)	A	5年以内	衛生	Ⅲ:未更新のまま						指摘なし	10年以内	
			防災	25年	未更新(ポンプ)		A	5年以内	防災	Ⅲ:未更新のまま						要是正	10年以内	
			昇降	25年	-	更新(エレベーター)	A	-	昇降	Ⅲ:未更新のまま						要是正	-	
概算費用(千円)			185,636	430,822	-			区分	3						3			
社会教育施設	1	中央図書館 延床面積 6,214.03㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	24年	未更新(防水一部)	更新(防水)	A	5年以内	屋上・屋根	Ⅱ:一部実施(予定を含む)	更新(防水) (2022,2021年度に実施)	更新(防水)				指摘なし	-	
			外壁	24年	未更新(シーリング)			A	5年以内	外壁	Ⅲ:未更新のまま						要是正	10年以内
			受変電	24年	-	更新(受変電)	A	-	受変電	Ⅱ:一部実施(予定を含む)			更新(受変電)				指摘なし	-
			非常電源	13年	未更新(直流電源)			A	10年以内	非常電源	Ⅲ:未更新のまま						指摘なし	10年以内
			空調	24年	未更新(熱源機等)	更新(熱源機等)	A	5年以内	空調	Ⅱ:一部実施(予定を含む)				更新(空調和機)	要是正	10年以内		
			衛生	24年	未更新(ポンプ)	更新(給湯機等)	A	5年以内	衛生	Ⅲ:未更新のまま						要是正	10年以内	
			防災	24年	未更新(ポンプ)		A	-	防災	Ⅲ:未更新のまま						要是正	10年以内	
			昇降	24年	-	更新(エレベーター)	A	-	昇降	-						要是正(既存不適格)	-	
概算費用(千円)			95,012	171,998	-			区分	3						3			

旭川市公共施設等総合管理計画

第1期アクションプログラム 施設保全計画表取組状況【令和5年度版】

※未更新等の経過期間は、更新周期を経過していないものは「-」とした。  
 ※主な更新周期は各施設の長期修繕計画を参考とした。

【施設保全計画表】(平成31年3月時点)										令和5年4月1日の状況								
大分類	No.	施設(建物名)	予防保全部位	更新後等の経過年数~2018	第1期アクションプログラム期間(H31~R9)			施設の状況	未更新等の経過期間(3区分)	予防保全部位	2023(令和5年4月1日の更新状況)	2019~2021年度		2022~2024年度の内容			施設の状況	未更新等の経過期間(3区分)
					2019~2021	2022~2024	2025~2027					実績	2022実績(令和4年度)	2023予定(令和5年度)	2024予定(令和6年度)			
社会教育施設	2	末広図書館 延床面積 999.43㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	26年	-	更新(防水)		A	-	屋上・屋根	-			更新(防水)			指摘なし	5年以内
			外壁	26年	未更新(塗装等)			A	10年以内	外壁	Ⅱ:一部実施(予定を含む)	一部(西面)更新					要是正	10年超え
			受変電	26年	-	更新(受変電)		A	-	受変電	-						指摘なし	5年以内
			非常電源							非常電源								
			空調	26年	-	更新(熱源機等)		A	-	空調	-						要是正	5年以内
			衛生	26年	未更新(ホップ)	更新(衛生配管)		A	10年以内	衛生	Ⅲ:未更新のまま						指摘なし	10年超え
			防災	26年	未更新(中央監視)			A	10年以内	防災	Ⅲ:未更新のまま						指摘なし	10年超え
			昇降	26年	-	更新(エレベーター)		A	-	昇降	-						指摘なし	5年以内
			概算費用(千円)		21,903		69,388		-		区分	3						3
社会教育施設	3	東光図書館 延床面積 1,065.59㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	20年	未更新(防水)			A	5年以内	屋上・屋根	Ⅲ:未更新のまま						要是正	5年以内
			外壁	20年	未更新(塗装等)			A	5年以内	外壁	Ⅲ:未更新のまま						要是正	5年以内
			受変電	20年	-	-		A	-	受変電	-						指摘なし	-
			非常電源							非常電源								
			空調	20年	未更新(冷凍機)			A	5年以内	空調	Ⅲ:未更新のまま						指摘なし	5年以内
			衛生	20年	-	-		A	-	衛生	-						指摘なし	-
			防災							防災								
			昇降							昇降								
			概算費用(千円)		31,753		-		-		区分	3						3
社会教育施設	4	井上靖記念館 延床面積 663.61㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	26年	-	更新(屋根)		C	-	屋上・屋根	Ⅲ:未更新のまま 芝木交換済 塗装更新			更新(屋根)		要是正	5年以内	
			外壁	26年	未更新(塗装等)			A	10年以内	外壁	Ⅲ:未更新のまま					要是正	10年超え	
			受変電	26年	-	更新(受変電)		A	-	受変電	Ⅱ:一部実施(予定を含む)		更新(接地改修)	更新(キュービクル)		要是正	5年以内	
			非常電源							非常電源								
			空調	26年	未更新(熱源機)	更新(温水管)		A	10年以内	空調	Ⅲ:未更新のまま					指摘なし	10年超え	
			衛生	26年	-	更新(給排水管)		A	-	衛生	Ⅰ:計画通り実施(予定を含む)	屋外地中給水管更新 館内床下給水管更新				指摘なし	5年以内	
			防災							防災								
			昇降							昇降								
			概算費用(千円)		32,500		35,500		-		区分	3						3

旭川市公共施設等総合管理計画

第1期アクションプログラム 施設保全計画表取組状況【令和5年度版】

※未更新等の経過期間は、更新周期を経過していないものは「-」とした。  
 ※主な更新周期は各施設の長期修繕計画を参考とした。

【施設保全計画表】(平成31年3月時点)										令和5年4月1日の状況								
大分類	No.	施設(建物名)	予防保全部位	更新後等の経過年数~2018	第1期アクションプログラム期間(H31~R9)			施設の状況	未更新等の経過期間(3区分)	予防保全部位	2023(令和5年)4月1日の更新状況	2019~2021年度		2022~2024年度の内容			施設の状況	未更新等の経過期間(3区分)
					2019~2021	2022~2024	2025~2027					実績	2022実績(令和4年度)	2023予定(令和5年度)	2024予定(令和6年度)			
社会教育施設	5-1	科学館 延床面積 5,799.60㎡ 目標使用年数 80年	屋上・屋根	13年	-	-	更新(防水一部)	B	-	屋上・屋根	-				更新(防水)		指摘なし	-
			外壁	13年	-	-	更新(塗装等)	A	-	外壁	-						指摘なし	-
			受変電	13年	-	-	-	A	-	受変電	-						指摘なし	-
			非常電源	13年	-	-	更新(直流電源)	B	-	非常電源	-						指摘なし	-
			空調	13年	-	-	更新(熱源機等)	B	-	空調	-						指摘なし	-
			衛生	13年	-	-	更新(ポンプ)	B	-	衛生	-						指摘なし	-
			防災	13年	-	-	更新(ポンプ)	A	-	防災	-						指摘なし	-
			昇降	13年	-	-	更新(リフト)	B	-	昇降	-						指摘なし	-
概算費用(千円)			-	-	148,984			区分	-						1			
社会教育施設	5-2	科学館 車庫 延床面積 344.25㎡ 目標使用年数 80年	屋上・屋根	13年	-	-	更新(防水)	C	-	屋上・屋根	-					指摘なし	-	
			外壁	13年	-	-	更新(塗装等)	B	-	外壁	-					要是正	-	
			概算費用(千円)			-	-	20,771			区分	-					3	
スポーツレクリエーション施設	1	勤労者体育センター 延床面積 1,120.34㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	15年	-	更新(防水)	A	-	屋上・屋根	Ⅱ:一部実施(予定を含む)				更新(防水)		要是正	-	
			外壁	15年	-	更新(塗装等)	A	-	外壁	Ⅱ:一部実施(予定を含む)				更新(塗装等)		要是正	-	
			受変電	38年	未更新(受変電)			A	10年以内	受変電	Ⅰ:計画通り実施(予定を含む)	更新済み(受変電)					指摘なし	-
			非常電源							非常電源								
			空調	22年	未更新(熱源機)			A	5年以内	空調	Ⅲ:未更新のまま						指摘なし	10年以内
			衛生	38年	未更新(給排水管)			A	10年以内	衛生	Ⅲ:未更新のまま						指摘なし	10年超え
			防災							防災								
			昇降							昇降								
概算費用(千円)			9,550	19,332	-			区分	3						3			
スポーツレクリエーション施設	2-1	カムイスキーリンクスセンターハウス 延床面積 2,352.72㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	34年						屋上・屋根	Ⅰ:計画通り実施(予定を含む)	更新済み(板金等)				指摘なし	-	
			外壁	34年						外壁	Ⅰ:計画通り実施(予定を含む)	更新済み(板金等)				指摘なし	-	
			受変電	34年						受変電	Ⅰ:計画通り実施(予定を含む)	更新済み(屋外キュービクル) 更新(屋内キュービクル)				指摘なし	-	
			非常電源	34年						非常電源								
			空調	34年						空調	Ⅲ:未更新のまま					指摘なし	10年超え	
			衛生	34年						衛生	Ⅱ:一部実施(予定を含む)	更新済み(浄化槽)	更新済み(給湯ボイラー)				指摘なし	10年超え
			防災	34年						防災	Ⅲ:未更新のまま					更新(消防設備)	指摘なし	10年超え
			昇降							昇降								
概算費用(千円)								区分	3						1			

旭川市公共施設等総合管理計画

第1期アクションプログラム 施設保全計画表取組状況【令和5年度版】

※未更新等の経過期間は、更新周期を経過していないものは「-」とした。  
 ※主な更新周期は各施設の長期修繕計画を参考とした。

【施設保全計画表】(平成31年3月時点)										令和5年4月1日の状況									
大分類	No.	施設(建物名)	予防保全部位	更新後等の経過年数~2018	第1期アクションプログラム期間(H31~R9)			施設の状況	未更新等の経過期間(3区分)	予防保全部位	2023(令和5)年4月1日の更新状況				施設の状況	未更新等の経過期間(3区分)			
					2019-2021	2022-2024	2025-2027				2019-2021年度		2022~2024年度の内容						
										実績	2022実績(令和4年度)	2023予定(令和5年度)	2024予定(令和6年度)						
スポーツレクリエーション施設	2-2	カムイスキーリンクス ラーメンハウス 延床面積 287.01㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	33年						屋上・屋根	Ⅲ:未更新のまま					要是正	10年以内		
			外壁	33年						外壁	Ⅲ:未更新のまま					要是正	10年超え		
			受変電	33年						受変電									
			非常電源	33年						非常電源									
			空調	33年						空調	Ⅲ:未更新のまま						指摘なし	10年超え	
			衛生	33年						衛生	Ⅲ:未更新のまま						指摘なし	10年以内	
			防災	33年						防災									
			昇降							昇降									
			概算費用(千円)							区分	3						3		
			スポーツレクリエーション施設	2-3	カムイスキーリンクス 山頂レストラン 延床面積 460.24㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	33年						屋上・屋根	1:計画通り実施(予定を含む)	更新済み(板金等)				要是正
外壁	33年									外壁	1:計画通り実施(予定を含む)	更新済み(板金等)				要是正	-		
受変電	33年									受変電									
非常電源	33年									非常電源									
空調	0年									空調	-						指摘なし	-	
衛生	33年									衛生	1:計画通り実施(予定を含む)	更新済み(給水ポンプ)					指摘なし	10年以内	
防災	33年									防災									
昇降										昇降									
概算費用(千円)										区分	1						3		
スポーツレクリエーション施設	2-4	カムイスキーリンクス ゴンドラ山頂駅 延床面積 571.12㎡ 目標使用年数 65年				屋上・屋根	33年						屋上・屋根	1:計画通り実施(予定を含む)	更新(板金等)				要是正
			外壁	33年						外壁	1:計画通り実施(予定を含む)	更新(板金等)				要是正	-		
			受変電	33年						受変電									
			非常電源	33年						非常電源									
			空調	33年						空調									
			衛生	33年						衛生									
			防災	33年						防災									
			昇降							昇降									
			概算費用(千円)							区分	1						3		

旭川市公共施設等総合管理計画

第1期アクションプログラム 施設保全計画表取組状況【令和5年度版】

※未更新等の経過期間は、更新周期を経過していないものは「-」とした。  
 ※主な更新周期は各施設の長期修繕計画を参考とした。

【施設保全計画表】(平成31年3月時点)										令和5年4月1日の状況											
大分類	No.	施設(建物名)	予防保全部位	更新後等の経過年数 ~2018	第1期アクションプログラム期間(H31~R9)			施設の状況	未更新等の経過期間 (3区分)	予防保全部位	2023(令和5年)4月1日の更新状況		2019~2021年度		2022~2024年度の内容			施設の状況	未更新等の経過期間 (3区分)		
					2019~2021	2022~2024	2025~2027				実績	2022実績 (令和4年度)	2023予定 (令和5年度)	2024予定 (令和6年度)							
スポーツレクリエーション施設	2-5	カムイスキーリンクス ゴンドラ山麓駅舎 延床面積 1,282.78㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	33年						屋上・屋根	I:計画通り実施(予定を含む)							要是正	-		
			外壁	33年						外壁	I:計画通り実施(予定を含む)								要是正	-	
			受変電	33年						受変電											
			非常電源	33年						非常電源											
			空調	33年						空調											
			衛生	33年						衛生											
			防災	33年						防災											
			昇降							昇降											
			概算費用(千円)								区分	1								3	
			スポーツレクリエーション施設	3	総合体育館 (リアルター夢りんご 体育館) 延床面積 7,051.89㎡ 目標使用年数 80年 「要」耐震診断	屋上・屋根	39年						屋上・屋根	Ⅲ:未更新のまま							要是正
外壁	39年									外壁	Ⅲ:未更新のまま							要是正	10年超え		
受変電	1年									受変電	I:計画通り実施(予定を含む)							指摘なし	-		
非常電源	39年									非常電源	I:計画通り実施(予定を含む)	非常用発電機改修						指摘なし	-		
空調	39年									空調	Ⅲ:未更新のまま							要是正	10年超え		
衛生	39年									衛生	I:計画通り実施(予定を含む)	給水配管						指摘なし	10年超え		
防災	39年									防災	I:計画通り実施(予定を含む)							指摘なし	10年超え		
昇降										昇降											
概算費用(千円)		543,049						3,261			区分	3								3	
スポーツレクリエーション施設	4	東地区体育センター 延床面積 1,102.72㎡ 目標使用年数 65年				屋上・屋根	26年						屋上・屋根	-							指摘なし
			外壁	26年						外壁	Ⅲ:未更新のまま							要是正	10年超え		
			受変電	26年						受変電											
			非常電源	26年						非常電源											
			空調	26年						空調	Ⅲ:未更新のまま							指摘なし	10年超え		
			衛生	26年						衛生	-							指摘なし	5年以内		
			防災	26年						防災											
			昇降							昇降											
			概算費用(千円)								区分	3								3	

旭川市公共施設等総合管理計画  
第1期アクションプログラム 施設保全計画表取組状況【令和5年度版】

※未更新等の経過期間は、更新周期を経過していないものは「-」とした。  
※主な更新周期は各施設の長期修繕計画を参考とした。

【施設保全計画表】（平成31年3月時点）										令和5年4月1日の状況									
大分類	No.	施設(建物名)	予防保全部位	更新後等の経過年数～2018	第1期アクションプログラム期間(H31～R9)			施設の状況	未更新等の経過期間(3区分)	予防保全部位	2023(令和5年)4月1日の更新状況	2019-2021年度		2022～2024年度の内容			施設の状況	未更新等の経過期間(3区分)	
					2019-2021	2022-2024	2025-2027					実績	2022実績(令和4年度)	2023予定(令和5年度)	2024予定(令和6年度)				
スポーツレクリエーション施設	5	道北アークス大雪アリーナ(借上げ) 延床面積 9,460.28㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	32年	未更新(板金等)			A	5年以内	屋上・屋根	Ⅱ:一部実施(予定を含む)	更新済み(屋上防水)				指摘なし	10年以内		
			外壁	32年	未更新(塗装)			更新(金属板等)	A	10年超え	外壁	Ⅲ:未更新のまま					要是正	10年超え	
			受変電	32年	未更新(受変電)				A	5年以内	受変電	Ⅲ:未更新のまま					指摘なし	10年以内	
			非常電源	32年	未更新(発電機)				A	5年以内	非常電源	Ⅲ:未更新のまま					指摘なし	10年以内	
			空調	32年	未更新(熱源機等)				A	10年超え	空調	Ⅱ:一部実施(予定を含む)	更新(製氷に関する部分)				指摘なし	10年超え	
			衛生	32年	未更新(給排水管等)				A	10年超え	衛生	Ⅱ:一部実施(予定を含む)	更新(製氷用温水発生器)				指摘なし	10年超え	
			防災	32年	未更新(消火ポンプ)				A	10年超え	防災	Ⅱ:一部実施(予定を含む)	整備済み(防火扉)				要是正(既存不適格)	10年超え	
			昇降								昇降								
			概算費用(千円)			574,600		-				区分	3					3	
			スポーツレクリエーション施設	6-1	21世紀の森 森林学習展示館 延床面積 655.20㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	30年						屋上・屋根	Ⅲ:未更新のまま					指摘なし
外壁	30年									外壁	Ⅱ:一部実施(予定を含む)				改修工事	要是正	10年超え		
受変電	30年						作成中			受変電									
非常電源	30年						作成中			非常電源									
空調	30年						作成中			空調									
衛生	30年						作成中			衛生	Ⅲ:未更新のまま						指摘なし	5年以内	
防災	30年						作成中			防災									
昇降							作成中			昇降									
概算費用(千円)											区分	3					3		
スポーツレクリエーション施設	6-2	21世紀の森 ログハウス 延床面積 298.38㎡ 目標使用年数 65年				屋上・屋根	30年						屋上・屋根	Ⅲ:未更新のまま					指摘なし
			外壁	30年						外壁	Ⅲ:未更新のまま					指摘なし	10年超え		
			受変電	30年			作成中			受変電									
			非常電源	30年			作成中			非常電源									
			空調	30年			作成中			空調									
			衛生	30年			作成中			衛生	Ⅲ:未更新のまま						指摘なし	5年以内	
			防災	30年			作成中			防災									
			昇降				作成中			昇降									
			概算費用(千円)								区分	3					1		



旭川市公共施設等総合管理計画

第1期アクションプログラム 施設保全計画表取組状況【令和5年度版】

※未更新等の経過期間は、更新周期を経過していないものは「-」とした。  
 ※主な更新周期は各施設の長期修繕計画を参考とした。

【施設保全計画表】（平成31年3月時点）										令和5年4月1日の状況								
大分類	No.	施設(建物名)	予防保全部位	更新後等の経過年数～2018	第1期アクションプログラム期間(H31～R9)			施設の状況	未更新等の経過期間(3区分)	予防保全部位	2023(令和5年4月1日)の更新状況	2019～2021年度		2022～2024年度の内容			施設の状況	未更新等の経過期間(3区分)
					2019～2021	2022～2024	2025～2027					実績	2022実績(令和4年度)	2023予定(令和5年度)	2024予定(令和6年度)			
スポーツレクリエーション施設	7-1	旭山動物園展示館 延床面積 268.80㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	36年	未更新(屋根)			A	10年以内	屋上・屋根	Ⅲ:未更新のまま					指摘なし	10年超え	
			外壁	36年	未更新(塗装等)			A	10年超え	外壁	Ⅲ:未更新のまま					指摘なし	10年超え	
			受変電							受変電								
			非常電源							非常電源								
			空調	36年	未更新(配管)			A	10年以内	空調	Ⅲ:未更新のまま					指摘なし	10年超え	
			衛生	36年	未更新(給排水管)			A	10年以内	衛生	Ⅲ:未更新のまま					指摘なし	10年超え	
			防災							防災								
			昇降							昇降								
概算費用(千円)			5,588	-	-			区分	3					1				
スポーツレクリエーション施設	7-2	旭山動物園もうじゅう館 延床面積 611.67㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	20年	未更新(防水一部)			A	5年以内	屋上・屋根	Ⅱ:一部実施(予定を含む)	更新(バレット天板防水)(2020, 2021年度に実施)		更新(一部)	更新(残り)	指摘なし	5年以内	
			外壁	20年	未更新(塗装等)			D	5年以内	外壁	Ⅱ:一部実施(予定を含む)	一部補修		更新(一部)	更新(一部)	指摘なし	5年以内	
			受変電							受変電								
			非常電源							非常電源								
			空調	20年	-	-	-	A	-	空調	-					指摘なし	-	
			衛生	20年	-	-	-	A	-	衛生	-					指摘なし	-	
			防災							防災								
			昇降							昇降								
概算費用(千円)			23,286	-	-			区分	2					1				
スポーツレクリエーション施設	7-3	旭山動物園さる山舎 延床面積 280.03㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	19年	-	-	-	A	-	屋上・屋根	-		更新(バレット天板防水)		指摘なし	-		
			外壁	19年	更新(塗装等)			A	-	外壁	Ⅲ:未更新のまま					指摘なし	5年以内	
			受変電							受変電								
			非常電源							非常電源								
			空調	19年	-	-	-	A	-	空調	-					指摘なし	-	
			衛生	19年	-	-	-	A	-	衛生	-					指摘なし	-	
			防災							防災								
			昇降							昇降								
概算費用(千円)			4,418	-	-			区分	3					1				

旭川市公共施設等総合管理計画

第1期アクションプログラム 施設保全計画表取組状況【令和5年度版】

※未更新等の経過期間は、更新周期を経過していないものは「-」とした。  
 ※主な更新周期は各施設の長期修繕計画を参考とした。

【施設保全計画表】（平成31年3月時点）										令和5年4月1日の状況								
大分類	No.	施設(建物名)	予防保全部位	更新後等の経過年数 ~2018	第1期アクションプログラム期間(H31~R9)			施設の状況	未更新等の経過期間 (3区分)	予防保全部位	2023(令和5年4月1日)の更新状況	2019-2021年度		2022~2024年度の内容			施設の状況	未更新等の経過期間 (3区分)
					2019-2021	2022-2024	2025-2027					実績	2022実績 (令和4年度)	2023予定 (令和5年度)	2024予定 (令和6年度)			
スポーツレクリエーション施設	7-4	旭山動物園 ぺんぎん館 延床面積 631.78㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	18年	更新(防水)			A	-	屋上・屋根	Ⅲ:未更新のまま					指摘なし	5年以内	
			外壁	18年	更新(塗装等)			A	-	外壁	Ⅲ:未更新のまま					指摘なし	5年以内	
			受変電								受変電							
			非常電源								非常電源							
			空調	18年	更新(熱源機)				A	-	空調	Ⅲ:未更新のまま			更新(熱源機)		指摘なし	5年以内
			衛生	18年	更新(給湯機)				A	-	衛生	-					指摘なし	-
			防災								防災							
			昇降	18年	-	-	-	A	-	昇降	-						指摘なし	-
			概算費用(千円)		19,019	-	-			区分	3						1	
スポーツレクリエーション施設	7-5	旭山動物園 ほっきょくま館 延床面積 1,187.60㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	16年	-	更新(防水)		C	-	屋上・屋根	-			更新(防水)		指摘なし	5年以内	
			外壁	16年	-	更新(塗装等)		A	-	外壁	-			更新(塗装等)		指摘なし	5年以内	
			受変電								受変電							
			非常電源								非常電源							
			空調	16年	-	更新(熱源機)		A	-	空調	-			更新(熱源機)		指摘なし	5年以内	
			衛生	16年	-	更新(給湯機、ポンプ)		A	-	衛生	-			更新(ポンプ)		指摘なし	-	
			防災								防災							
			昇降	16年	-	-	-	A	-	昇降	-						指摘なし	-
			概算費用(千円)		-	37,346	-			区分	-						1	
スポーツレクリエーション施設	7-6	旭山動物園 あざらし館 延床面積 1,018.01㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	14年	-	更新(防水)		A	-	屋上・屋根	-				更新(防水)	指摘なし	-	
			外壁	14年	-	更新(塗装等)		A	-	外壁	-				更新(塗装等)	指摘なし	-	
			受変電								受変電							
			非常電源								非常電源							
			空調	14年	-	更新(熱源機)		A	-	空調	-				更新(熱源機)	指摘なし	-	
			衛生	14年	-	更新(ポンプ)		A	-	衛生	-				更新(ポンプ)	指摘なし	-	
			防災								防災							
			昇降	14年	-	-	-	A	-	昇降	-						指摘なし	-
			概算費用(千円)		-	23,178	-			区分	-						1	

旭川市公共施設等総合管理計画

第1期アクションプログラム 施設保全計画表取組状況【令和5年度版】

※未更新等の経過期間は、更新周期を経過していないものは「-」とした。  
 ※主な更新周期は各施設の長期修繕計画を参考とした。

【施設保全計画表】（平成31年3月時点）										令和5年4月1日の状況								
大分類	No.	施設(建物名)	予防保全部位	更新後等の経過年数 ~2018	第1期アクションプログラム期間(H31~R9)			施設の状況	未更新等の経過期間 (3区分)	予防保全部位	2023(令和5年 4月1日の更新状況)	2019-2021年度		2022~2024年度の内容			施設の状況	未更新等の経過期間 (3区分)
					2019-2021	2022-2024	2025-2027					実績	2022実績 (令和4年度)	2023予定 (令和5年度)	2024予定 (令和6年度)			
スポーツレクリエーション施設	7-7	旭山動物園 正面売札所 延床面積 309.89㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	13年	-	-	-	A	-	屋上・屋根	-					指摘なし	-	
			外壁	13年	更新(塗装等)			A	-	外壁	-						指摘なし	-
			受変電							受変電								
			非常電源							非常電源								
			空調	13年	-	-	-	A	-	空調	-						指摘なし	-
			衛生	13年	-	-	-	A	-	衛生	-						指摘なし	-
			防災							防災								
			昇降							昇降								
			概算費用(千円)		1,288	-	-			区分	-						1	
			スポーツレクリエーション施設	7-8	旭山動物園 ちんぼんじー館 延床面積 1,118.75㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	12年	-	-	更新(防水)	A	-	屋上・屋根	-				
外壁	12年	-				-	更新(塗装等)	A	-	外壁	-					指摘なし	-	
受変電										受変電								
非常電源										非常電源								
空調	12年	-				-	更新(熱源機)	A	-	空調	-						指摘なし	-
衛生	12年	-				-	更新(給湯機)	A	-	衛生	-						指摘なし	-
防災										防災								
昇降										昇降								
概算費用(千円)		-				-	39,352			区分	-						1	
スポーツレクリエーション施設	7-9	旭山動物園 かば館 延床面積 1,685.26㎡ 目標使用年数 65年				屋上・屋根	5年	-	-	-	A	-	屋上・屋根	-				
			外壁	5年	-	-	-	A	-	外壁	-					指摘なし	-	
			受変電	5年	-	-	-	A	-	受変電	-					指摘なし	-	
			非常電源							非常電源								
			空調	5年	-	-	-	A	-	空調	-					指摘なし	-	
			衛生	5年	-	-	-	A	-	衛生	-					指摘なし	-	
			防災							防災								
			昇降	5年	-	-	-	A	-	昇降	-					指摘なし	-	
			概算費用(千円)		-	-	-			区分	-						1	

旭川市公共施設等総合管理計画

第1期アクションプログラム 施設保全計画表取組状況【令和5年度版】

※未更新等の経過期間は、更新周期を経過していないものは「-」とした。  
 ※主な更新周期は各施設の長期修繕計画を参考とした。

【施設保全計画表】(平成31年3月時点)										令和5年4月1日の状況											
大分類	No.	施設(建物名)	予防保全部位	更新後等の経過年数~2018	第1期アクションプログラム期間(H31~R9)			施設の状況	未更新等の経過期間(3区分)	予防保全部位	2023(令和5年4月1日)の更新状況	2019-2021年度		2022~2024年度の内容			施設の状況	未更新等の経過期間(3区分)			
					2019-2021	2022-2024	2025-2027					実績	2022実績(令和4年度)	2023予定(令和5年度)	2024予定(令和6年度)						
スポーツレクリエーション施設	7-10	旭山動物園 えぞびくま館 延床面積 558.77㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	10年						屋上・屋根	-						指摘なし	-			
			外壁	10年						外壁	-							指摘なし	-		
			受変電	10年							受変電	-							指摘なし	-	
			非常電源	10年							非常電源	/	/	/	/	/	/	/	/		
			空調	10年							空調	-							指摘なし	-	
			衛生	10年							衛生	-								指摘なし	-
			防災	10年							防災	/	/	/	/	/	/	/	/		
			昇降	10年							昇降	-								指摘なし	-
概算費用(千円)			-	-	-			区分	-							1					
スポーツレクリエーション施設	8	江丹別若者の郷 若者センター 延床面積 742.54㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	33年	未更新(防水)		更新(板金)	A	5年以内	屋上・屋根	Ⅲ:未更新のまま						指摘なし	10年以内			
			外壁	33年	未更新(塗装等)				A	10年超え	外壁	Ⅲ:未更新のまま						指摘なし	10年超え		
			受変電	/	/	/	/	/	/	/	受変電	/	/	/	/	/	/	/	/		
			非常電源	/	/	/	/	/	/	/	非常電源	/	/	/	/	/	/	/	/		
			空調	33年	未更新(空調配管)				A	5年以内	空調	Ⅲ:未更新のまま						指摘なし	10年以内		
			衛生	33年	未更新(給排水管等)				A	5年以内	衛生	Ⅲ:未更新のまま						指摘なし	10年以内		
			防災	/	/	/	/	/	/	/	防災	/	/	/	/	/	/	/	/		
			昇降	/	/	/	/	/	/	/	昇降	/	/	/	/	/	/	/	/		
概算費用(千円)			18,610	-	4,010			区分	3							1					
産業施設	1	西神楽市民交流 センター 延床面積 1,486.88㎡ 目標使用年数 65年 ※西神楽支所・公民館 の集約に伴い、西神楽 農業構造改善センター から名称変更	屋上・屋根	28年	更新(防水等)			A	-	屋上・屋根	Ⅲ:未更新のまま						要是正	5年以内			
			外壁	28年	未更新(塗装等)				C	10年以内	外壁	Ⅲ:未更新のまま						要是正	10年超え		
			受変電	28年	更新(受変電)				A	-	受変電	I:計画通り実施(予定を含む)	更新					指摘なし	-		
			非常電源	/	/	/	/	/	/	/	非常電源	/	/	/	/	/	/	/	/		
			空調	28年	未更新(熱源機)				B	10年以内	空調	Ⅲ:未更新のまま						指摘なし	10年超え		
			衛生	28年	未更新(ポンプ)				A	10年以内	衛生	Ⅲ:未更新のまま						指摘なし	10年超え		
			防災	/	/	/	/	/	/	/	防災	/	/	/	/	/	/	/	/		
			昇降	/	/	/	/	/	/	/	昇降	/	/	/	/	/	/	/	/		
概算費用(千円)			80,242	-	-			区分	3							3					

旭川市公共施設等総合管理計画

第1期アクションプログラム 施設保全計画表取組状況【令和5年度版】

※未更新等の経過期間は、更新周期を経過していないものは「-」とした。  
 ※主な更新周期は各施設の長期修繕計画を参考とした。

【施設保全計画表】（平成31年3月時点）										令和5年4月1日の状況									
大分類	No.	施設(建物名)	予防保全部位	更新後等の経過年数～2018	第1期アクションプログラム期間(H31～R9)			施設の状況	未更新等の経過期間(3区分)	予防保全部位	2023(令和5年4月1日)の更新状況	2019～2021年度		2022～2024年度の内容			施設の状況	未更新等の経過期間(3区分)	
					2019～2021	2022～2024	2025～2027					実績	2022実績(令和4年度)	2023予定(令和5年度)	2024予定(令和6年度)				
産業施設	2	東旭川農村環境改善センター 延床面積 1,934.71㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	28年						屋上・屋根	Ⅲ：未更新のまま						指摘なし	5年以内	
			外壁	28年						外壁	Ⅲ：未更新のまま						要是正	10年超え	
			受変電	28年		作成中					受変電	Ⅲ：未更新のまま						指摘なし	5年以内
			非常電源	28年							非常電源								
			空調	28年							空調	Ⅲ：未更新のまま						指摘なし	5年以内
			衛生	28年							衛生	Ⅲ：未更新のまま						指摘なし	5年以内
			防災	28年							防災								
			昇降								昇降								
			概算費用(千円)								区分	3						3	
産業施設	3	永山ふれあいセンター 延床面積 787.89㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	26年						屋上・屋根	Ⅲ：未更新のまま						指摘なし	5年以内	
			外壁	26年						外壁	-						要是正	-	
			受変電	26年		作成中					受変電								
			非常電源	26年							非常電源								
			空調	26年							空調	Ⅲ：未更新のまま						指摘なし	5年以内
			衛生	26年							衛生	Ⅲ：未更新のまま						要是正	5年以内
			防災	26年							防災								
			昇降								昇降								
			概算費用(千円)								区分	3						3	
産業施設	4	東鷹栖農村活性化センター 延床面積 1,344.34㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	33年						屋上・屋根	-	更新(ホール屋根)				指摘なし	-		
			外壁	33年						外壁	Ⅲ：未更新のまま						要是正	10年超え	
			受変電	33年		作成中					受変電	Ⅲ：未更新のまま						指摘なし	10年以内
			非常電源	33年							非常電源								
			空調	33年							空調	Ⅲ：未更新のまま						指摘なし	10年超え
			衛生	33年							衛生	Ⅲ：未更新のまま						指摘なし	10年以内
			防災	33年							防災	Ⅱ：一部実施(予定を含む)		更新(消火栓ポンプ・配管)			指摘なし	10年以内	
			昇降								昇降								
			概算費用(千円)								区分	3						3	

旭川市公共施設等総合管理計画

第1期アクションプログラム 施設保全計画表取組状況【令和5年度版】

※未更新等の経過期間は、更新周期を経過していないものは「-」とした。  
 ※主な更新周期は各施設の長期修繕計画を参考とした。

【施設保全計画表】(平成31年3月時点)										令和5年4月1日の状況								
大分類	No.	施設(建物名)	予防保全部位	更新後等の経過年数~2018	第1期アクションプログラム期間(H31~R9)			施設の状況	未更新等の経過期間(3区分)	予防保全部位	2023(令和5年4月1日)の更新状況	2019~2021年度		2022~2024年度の内容			施設の状況	未更新等の経過期間(3区分)
					2019~2021	2022~2024	2025~2027					実績	2022実績(令和4年度)	2023予定(令和5年度)	2024予定(令和6年度)			
産業施設	5	旭川工業技術センター研究・機械工作棟 延床面積 2,651.47㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	8年	更新(塗装)	更新(塗装)		A	-	屋上・屋根	Ⅲ:未更新のまま						指摘なし	-
			外壁	9年	-	-	-	A	-	外壁	-						指摘なし	-
			受変電	30年	更新(受変電)			A	-	受変電	I:計画通り実施(予定を含む)		更新(受変電)				指摘なし	-
			非常電源							非常電源								
			空調	9年	-	-	-	A	-	空調	-						指摘なし	-
			衛生	30年	更新(屋外給水管)			A	-	衛生	Ⅲ:未更新のまま						指摘なし	5年以内
			防災	30年	未更新(ポンプ)			A	10年以内	防災	Ⅲ:未更新のまま						指摘なし	10年超え
			昇降							昇降								
			概算費用(千円)		9,756	7,200	-			区分	3						1	
産業施設	6	市営牧場格納庫 延床面積 286.11㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	35年						屋上・屋根	Ⅲ:未更新のまま						指摘なし	10年超え
			外壁	35年						外壁	Ⅲ:未更新のまま						指摘なし	10年超え
			受変電							受変電								
			非常電源							非常電源								
			空調							空調								
			衛生							衛生								
			防災							防災								
			昇降							昇降								
			概算費用(千円)							区分	3						1	
産業施設	7-1	農業センター複合施設 延床面積 1,397.28㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	22年	未更新(防水)		更新(屋根)	A	5年以内	屋上・屋根	Ⅱ:一部実施(予定を含む)		一部更新(防水)	一部更新(防水)		要是正	10年以内	
			外壁	22年	未更新(塗装等)			A	5年以内	外壁	Ⅲ:未更新のまま					指摘なし	10年以内	
			受変電							受変電								
			非常電源							非常電源								
			空調	22年	未更新(熱源機)		更新(空調配管)	A	5年以内	空調	Ⅲ:未更新のまま					要是正	10年以内	
			衛生	22年	-	-	更新(給排水管)	A	5年以内	衛生	Ⅱ:一部実施(予定を含む)	更新(給湯管)				指摘なし	10年以内	
			防災	22年	未更新(中央監視)			A	5年以内	防災	Ⅲ:未更新のまま					要是正	10年以内	
			昇降							昇降								
			概算費用(千円)		38,448	-	46,086			区分	3						3	

旭川市公共施設等総合管理計画

第1期アクションプログラム 施設保全計画表取組状況【令和5年度版】

※未更新等の経過期間は、更新周期を経過していないものは「-」とした。  
 ※主な更新周期は各施設の長期修繕計画を参考とした。

【施設保全計画表】(平成31年3月時点)										令和5年4月1日の状況									
大分類	No.	施設(建物名)	予防保全部位	更新後の経過年数 ~2018	第1期アクションプログラム期間(H31~R9)			施設の状況	未更新等の経過期間 (3区分)	予防保全部位	2023(令和5年) 4月1日の更新状況	2019~2021年度		2022~2024年度の内容			施設の状況	未更新等の経過期間 (3区分)	
					2019~2021	2022~2024	2025~2027					実績	2022実績 (令和4年度)	2023予定 (令和5年度)	2024予定 (令和6年度)				
産業施設	7-2	農業センター 展示温室棟・温室棟 延床面積 1,026.00㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	22年			更新(防水)	A	-	屋上・屋根	-						指摘なし	-	
			外壁	22年	未更新(塗装等)				A	5年以内	外壁	Ⅲ:未更新のまま						指摘なし	10年以内
			受変電								受変電								
			非常電源								非常電源								
			空調	4年	-	-	-		A	-	空調	-						指摘なし	-
			衛生	22年	-	-	更新(給排水管)		A	-	衛生	-						指摘なし	-
			防災								防災								
			昇降								昇降								
			概算費用(千円)		975	-	17,542				区分	3						1	
			産業施設	7-3	農業センター 農場管理棟 延床面積 550.00㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	22年	-	-	更新(防水等)	A	-	屋上・屋根	I:計画通り実施(予定を含む)	雨漏り修繕(屋根)				
外壁	22年	未更新(塗装等)							A	5年以内	外壁	Ⅲ:未更新のまま						指摘なし	10年以内
受変電											受変電								
非常電源											非常電源								
空調	22年	未更新(熱源機)							A	5年以内	空調	Ⅲ:未更新のまま						指摘なし	10年以内
衛生	22年	-				-	更新(給排水管)		A	-	衛生	-						指摘なし	-
防災											防災								
昇降											昇降								
概算費用(千円)		8,187				-	25,226				区分	3						1	
子育て支援系施設	1	北門児童センター 延床面積 420.00㎡ 目標使用年数 65年				屋上・屋根	4年				A	-	屋上・屋根	-					
			外壁	33年	未更新(塗装等)				A	10年超え	外壁	Ⅲ:未更新のまま						指摘なし	10年超え
			受変電								受変電								
			非常電源								非常電源								
			空調	33年	未更新(空調配管)				A	5年以内	空調	Ⅲ:未更新のまま						指摘なし	10年以内
			衛生	33年	未更新(給排水管)				A	5年以内	衛生	Ⅲ:未更新のまま						指摘なし	10年以内
			防災								防災								
			昇降								昇降								
概算費用(千円)		4,957	-	-				区分	3						1				

旭川市公共施設等総合管理計画

第1期アクションプログラム 施設保全計画表取組状況【令和5年度版】

※未更新等の経過期間は、更新周期を経過していないものは「-」とした。  
 ※主な更新周期は各施設の長期修繕計画を参考とした。

【施設保全計画表】（平成31年3月時点）										令和5年4月1日の状況									
大分類	No.	施設(建物名)	予防保全部位	更新後等の経過年数～2018	第1期アクションプログラム期間(H31～R9)			施設の状況	未更新等の経過期間(3区分)	予防保全部位	2023(令和5年4月1日の更新状況)	2019-2021年度		2022～2024年度の内容			施設の状況	未更新等の経過期間(3区分)	
					2019-2021	2022-2024	2025-2027					実績	2022実績(令和4年度)	2023予定(令和5年度)	2024予定(令和6年度)				
子育て支援系施設	2	春光住民児童センター 延床面積 493.10㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	30年	未更新(屋根、防水)			A	5年以内	屋上・屋根	Ⅲ:未更新のまま						指摘なし	5年以内	
			外壁	30年	未更新(塗装等)				A	10年以内	外壁	Ⅲ:未更新のまま						指摘なし	10年超え
			受変電								受変電								
			非常電源								非常電源								
			空調	30年	未更新(空調配管)				A	5年以内	空調	Ⅲ:未更新のまま						指摘なし	5年以内
			衛生	30年	未更新(給排水管)				A	5年以内	衛生	Ⅲ:未更新のまま						指摘なし	5年以内
			防災								防災								
			昇降								昇降								
			概算費用(千円)		23,568	-	-				区分	3						1	
子育て支援系施設	3	北彩都子ども活動センター 延床面積 682.22㎡ 目標使用年数 80年	屋上・屋根	3年	-	-	-	A	-	屋上・屋根	-						指摘なし	-	
			外壁	3年	-	-	-	A	-	外壁	-						指摘なし	-	
			受変電								受変電								
			非常電源								非常電源								
			空調	3年	-	-	-	A	-	空調	-						指摘なし	-	
			衛生	3年	-	-	-	A	-	衛生	-						指摘なし	-	
			防災								防災								
			昇降								昇降								
			概算費用(千円)		-	-	-				区分	-						1	
保健・福祉系施設	1	いきいきセンター 新旭川 延床面積 994.97㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	1年	-	-	-	A	-	屋上・屋根	-						指摘なし	-	
			外壁	25年	未更新(塗装等)	-	-		C	5年以内	外壁	Ⅲ:未更新のまま					要是正	10年以内	
			受変電								受変電								
			非常電源								非常電源								
			空調	9年	-	更新(空調配管)			A	-	空調	-			更新(空調配管)		指摘なし	-	
			衛生	25年	未更新(ポンプ)	更新(給排水管)			A	5年以内	衛生	Ⅲ:未更新のまま			更新(給排水管)		指摘なし	10年以内	
			防災								防災								
			昇降								昇降								
			概算費用(千円)		10,825	29,064	-				区分	3						3	



旭川市公共施設等総合管理計画

第1期アクションプログラム 施設保全計画表取組状況【令和5年度版】

※未更新等の経過期間は、更新周期を経過していないものは「-」とした。  
 ※主な更新周期は各施設の長期修繕計画を参考とした。

【施設保全計画表】(平成31年3月時点)										令和5年4月1日の状況								
大分類	No.	施設(建物名)	予防保全部位	更新後等の経過年数~2018	第1期アクションプログラム期間(H31~R9)			施設の状況	未更新等の経過期間(3区分)	予防保全部位	2023(令和5年)4月1日の更新状況	2019-2021年度		2022~2024年度の内容			施設の状況	未更新等の経過期間(3区分)
					2019-2021	2022-2024	2025-2027					実績	2022実績(令和4年度)	2023予定(令和5年度)	2024予定(令和6年度)			
保健・福祉系施設	2	いきいきセンター神楽 延床面積 1,727.50㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	10年	-	-	-	A	-	屋上・屋根	-					指摘なし	-	
			外壁	10年	-	-	-	A	-	外壁	-					要是正	-	
			受変電	10年	-	-	-	A	-	受変電	-					指摘なし	-	
			非常電源							非常電源								
			空調	10年	-	-	-	A	-	空調	-					指摘なし	-	
			衛生	10年	-	-	-	A	-	衛生	-					指摘なし	-	
			防災							防災								
			昇降							昇降								
			概算費用(千円)		-	-	-			区分	-						3	
保健・福祉系施設	3	北部老人福祉センター 延床面積 928.89㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	39年	未更新(防水等)			A	10年以内	屋上・屋根	Ⅲ:未更新のまま					要是正	10年超え	
			外壁	18年	更新(タイル塗装等)				A	-	外壁	Ⅲ:未更新のまま			硝子コーキング	要是正	5年以内	
			受変電	1年	-	-	-			-	受変電	-				指摘なし	-	
			非常電源							非常電源								
			空調	39年	未更新(一部空調管)	-	-		A	10年以内	空調	Ⅲ:未更新のまま				要是正	10年超え	
			衛生	10年	-	-	-		A	-	衛生	Ⅱ:一部実施(予定を含む)			給湯用膨張タンク更新	要是正	-	
			防災								防災							
			昇降								昇降							
			概算費用(千円)		25,478	-	-			区分	3						3	
保健・福祉系施設	4	東部老人福祉センター 延床面積 946.00㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	18年	-	-	-	A	-	屋上・屋根	-					指摘なし	-	
			外壁	23年	未更新(塗装等)		更新(サイディング)		A	5年以内	外壁	Ⅲ:未更新のまま				指摘なし	10年以内	
			受変電	38年	未更新(受変電)				A	10年以内	受変電	Ⅰ:計画通り実施(予定を含む)	更新(受変電)				指摘なし	-
			非常電源								非常電源							
			空調	14年	-	-	-		-	-	空調	-				指摘なし	-	
			衛生	16年	-	更新(ポンプ)	更新(給湯機)		A	-	衛生	-			更新(ポンプ)		指摘なし	5年以内
			防災								防災							
			昇降								昇降							
			概算費用(千円)		8,442	1,878	5,845			区分	3						1	

旭川市公共施設等総合管理計画

第1期アクションプログラム 施設保全計画表取組状況【令和5年度版】

※未更新等の経過期間は、更新周期を経過していないものは「-」とした。  
 ※主な更新周期は各施設の長期修繕計画を参考とした。

【施設保全計画表】(平成31年3月時点)										令和5年4月1日の状況										
大分類	No.	施設(建物名)	予防保全部位	更新後等の経過年数~2018	第1期アクションプログラム期間(H31~R9)			施設の状況	未更新等の経過期間(3区分)	予防保全部位	2023(令和5)年4月1日の更新状況		2019-2021年度		2022~2024年度の内容			施設の状況	未更新等の経過期間(3区分)	
					2019-2021	2022-2024	2025-2027				実績	2022実績(令和4年度)	2023予定(令和5年度)	2024予定(令和6年度)						
保健・福祉系施設	5	旧神居デイサービスセンター 延床面積 1,728.88㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	22年	-	-	更新(防水等)	A	-	屋上・屋根	-							指摘なし	-	
			外壁	22年	未更新(塗装等)				A	5年以内	外壁	Ⅲ:未更新のまま							指摘なし	10年以内
			受変電								受変電									
			非常電源								非常電源									
			空調	22年	-	-	更新(熱源機)	A	-	空調	-								指摘なし	-
			衛生	22年	-	-	更新(給排水管)	A	-	衛生	-								指摘なし	-
			防災								防災									
			昇降								昇降									
			概算費用(千円)			26,712	-	76,044			区分	3							1	
保健・福祉系施設	6	近文市民ふれあいセンター 延床面積 3,398.66㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	22年	未更新(防水)		更新(屋根)	A	5年以内	屋上・屋根	Ⅲ:未更新のまま			屋上防水工事			要是正	10年以内		
			外壁	22年	未更新(塗装等一部)				B	5年以内	外壁	Ⅲ:未更新のまま						要是正	10年以内	
			受変電	22年	-	-	更新(受変電)	A	-	受変電	-							指摘なし	-	
			非常電源								非常電源									
			空調	22年	未更新(熱源機)		更新(熱源機等)	A	5年以内	空調	Ⅲ:未更新のまま							指摘なし	10年以内	
			衛生	22年	未更新(ポンプ)		更新(給排水管)	A	5年以内	衛生	I:計画通り実施(予定を含む)	更新(ポンプ)						指摘なし	10年以内	
			防災	22年	未更新(ポンプ)				A	5年以内	防災	Ⅲ:未更新のまま						指摘なし	10年以内	
			昇降	22年	-	-	更新(エレベーター)	A	-	昇降	-							指摘なし	-	
			概算費用(千円)			47,098	-	150,292			区分	3						3		
保健・福祉系施設	7	障害者福祉センター 延床面積 5,692.41㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	17年	更新(防水)			A	-	屋上・屋根	Ⅲ:未更新のまま						指摘なし	5年以内		
			外壁	17年	更新(塗装等)				A	-	外壁	Ⅲ:未更新のまま						要是正	5年以内	
			受変電	17年	-				A	-	受変電	-						指摘なし	-	
			非常電源	17年	更新(電源装置)				B	-	非常電源	Ⅲ:未更新のまま						指摘なし	5年以内	
			空調	17年	更新(冷房熱源等)				A	-	空調	Ⅱ:一部実施(予定を含む)	修繕済み(ACU-2) 更新(ACU-1)					指摘なし	-	
			衛生	17年	更新(ポンプ)				A	-	衛生	Ⅲ:未更新のまま						要是正	5年以内	
			防災	17年	更新(中央監視)				A	-	防災	Ⅱ:一部実施(予定を含む)	更新済み(中央監視)					指摘なし	5年以内	
			昇降	17年	-				A	-	昇降	-						指摘なし	-	
			概算費用(千円)			131,321	-	-			区分	3						3		

旭川市公共施設等総合管理計画

第1期アクションプログラム 施設保全計画表取組状況【令和5年度版】

※未更新等の経過期間は、更新周期を経過していないものは「-」とした。  
 ※主な更新周期は各施設の長期修繕計画を参考とした。

【施設保全計画表】(平成31年3月時点)										令和5年4月1日の状況									
大分類	No.	施設(建物名)	予防保全部位	更新後等の経過年数~2018	第1期アクションプログラム期間(H31~R9)			施設の状況	未更新等の経過期間(3区分)	予防保全部位	2023(令和5年)4月1日の更新状況	2019~2021年度		2022~2024年度の内容			施設の状況	未更新等の経過期間(3区分)	
					2019~2021	2022~2024	2025~2027					実績	2022実績(令和4年度)	2023予定(令和5年度)	2024予定(令和6年度)				
保健・福祉系施設	8	愛育センター 延床面積 2,782.70㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	37年	未更新(防水)			A	10年以内	屋上・屋根	Ⅲ:未更新のまま						要是正	10年超え	
			外壁	37年	未更新(塗装)				A	10年超え	外壁	Ⅲ:未更新のまま						要是正	10年超え
			受変電	0年	-	-	-	-	A	-	受変電	-						指摘なし	-
			非常電源	37年	未更新(発電機)				A	10年以内	非常電源	Ⅱ:一部実施(予定を含む)						指摘なし	10年超え
			空調	1年	-	-	-	-	A	-	空調	-						指摘なし	-
			衛生	37年	未更新(排水管)				A	10年以内	衛生	Ⅱ:一部実施(予定を含む)	更新(暖房設備配管の一部)	屋内外ガス埋設配管一部取替				要是正	10年超え
			防災	37年	未更新(ポンプ)				A	10年超え	防災	Ⅱ:一部実施(予定を含む)	更新(非常用放送回線)					指摘なし	10年超え
			昇降								昇降								
概算費用(千円)				129,353	-	-			区分	3						3			
行政系施設	1	江丹別支所 延床面積 948.13㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	18年	-	-	-	A	-	屋上・屋根	-	長尺鋼板屋根部分のみ葺き替え実施					指摘なし	-	
			外壁	18年	更新(塗装等)				A	-	外壁	Ⅲ:未更新のまま						指摘なし	5年以内
			受変電	18年	-	-	-	-	A	-	受変電	-						指摘なし	-
			非常電源								非常電源								
			空調	18年	-	-	-	-	A	-	空調	-						指摘なし	-
			衛生	18年	更新(ポンプ)				A	-	衛生	Ⅲ:未更新のまま						指摘なし	5年以内
			防災								防災								
			昇降								昇降								
概算費用(千円)				9,657	-	-			区分	3						1			
行政系施設	2	永山支所 延床面積 5,200.58㎡ 目標使用年数 80年	屋上・屋根	24年	-	更新(防水)		A	-	屋上・屋根	-				更新(防水)	指摘なし	-		
			外壁	24年	未更新(塗装等)				D	5年以内	外壁	Ⅲ:未更新のまま					指摘なし	10年以内	
			受変電	24年	-	更新(受変電)			A	-	受変電	-				更新(受変電)	指摘なし	-	
			非常電源	24年	未更新(電源装置)	更新(発電機)			A	5年以内	非常電源	Ⅱ:一部実施(予定を含む)	一部更新(自家発電装置)	一部更新(自家発電装置)	更新(発電機)	指摘なし	10年以内		
			空調	24年	未更新(冷温水熱源)	更新(暖房熱源等)			A	5年以内	空調	Ⅱ:一部実施(予定を含む)	一部更新済(電動バスター等) 一部更新済(冷発装置等)	一部更新(ダンパモータ等)	更新(冷却塔)	更新(暖房熱源等)	指摘なし	10年以内	
			衛生	24年	未更新(ポンプ)	更新(給排水管)			A	5年以内	衛生	Ⅱ:一部実施(予定を含む)	一部更新済(給排水ポンプ) 一部更新済(給湯配管用タンク取替)	一部更新(給水配管の一部、ポンプ部品の交換等)	更新(給排水管)	要是正	10年以内		
			防災	24年	未更新(ポンプ)				A	5年以内	防災	Ⅱ:一部実施(予定を含む)	一部更新済(SIPポンプ等)	一部更新済(非常灯球交換)	一部更新(スプリンクラー設備、火災報知設備等)	指摘なし	10年以内		
			昇降	24年	-	更新(エレベーター)			A	-	昇降	-	一部更新済(作動油等) 一部更新済(ガイドローラ等) 一部更新済(インターフォン/バッテリー等)			更新(エレベーター)	指摘なし	-	
概算費用(千円)				74,513	320,601	-			区分	3						3			

旭川市公共施設等総合管理計画

第1期アクションプログラム 施設保全計画表取組状況【令和5年度版】

※未更新等の経過期間は、更新周期を経過していないものは「-」とした。  
 ※主な更新周期は各施設の長期修繕計画を参考とした。

【施設保全計画表】（平成31年3月時点）										令和5年4月1日の状況								
大分類	No.	施設(建物名)	予防保全部位	更新後等の経過年数～2018	第1期アクションプログラム期間(H31～R9)			施設の状況	未更新等の経過期間(3区分)	予防保全部位	2023(令和5年4月1日)の更新状況	2019-2021年度		2022～2024年度の内容			施設の状況	未更新等の経過期間(3区分)
					2019-2021	2022-2024	2025-2027					実績	2022実績(令和4年度)	2023予定(令和5年度)	2024予定(令和6年度)			
行政系施設	3	東鷹栖地域センター 延床面積 1,418.58㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	19年	-	-	-	A	-	屋上・屋根	-					指摘なし	-	
			外壁	19年	更新(シーリング)				C	-	外壁	Ⅲ:未更新のまま					指摘なし	5年以内
			受変電	19年	-	-	-	A	-	受変電	-						指摘なし	-
			非常電源								非常電源							
			空調	19年	更新(熱源機)				A	-	空調	Ⅱ:一部実施(予定を含む)	修繕(燃焼設備)				指摘なし	-
			衛生	19年	更新(給湯機)				A	-	衛生	Ⅱ:一部実施(予定を含む)	修繕【燃料設備】				指摘なし	-
			防災								防災							
			昇降	19年	-	-	-	A	-	昇降	-						指摘なし	-
			概算費用(千円)		5,676						区分	3					1	
行政系施設	4	東部まちづくりセンター 延床面積 982.11㎡ 目標使用年数 80年	屋上・屋根	4年	-	-	-	A	-	屋上・屋根	-					要是正	-	
			外壁	4年	-	-	-	A	-	外壁	-					指摘なし	-	
			受変電								受変電							
			非常電源								非常電源							
			空調	4年	-	-	-	A	-	空調	-					指摘なし	-	
			衛生	4年	-	-	-	A	-	衛生	-					指摘なし	-	
			防災								防災							
			昇降								昇降							
			概算費用(千円)		-						区分	-					3	
行政系施設	5	南消防署神楽出張所 延床面積 866.28㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	16年	-	更新(防水一部)		A		屋上・屋根	Ⅱ:一部実施(予定を含む)		更新(防水一部)		指摘なし	-		
			外壁	16年	-	更新(塗装等)		A		外壁	Ⅱ:一部実施(予定を含む)		更新(塗装等)		要是正	5年以内		
			受変電								受変電							
			非常電源								非常電源							
			空調	16年	-	-	-	A	-	空調	-					指摘なし	-	
			衛生	16年	-	-	-	A	-	衛生	-					指摘なし	-	
			防災								防災							
			昇降								昇降							
			概算費用(千円)		-	4,279					区分	2					3	

旭川市公共施設等総合管理計画

第1期アクションプログラム 施設保全計画表取組状況【令和5年度版】

※未更新等の経過期間は、更新周期を経過していないものは「-」とした。  
 ※主な更新周期は各施設の長期修繕計画を参考とした。

【施設保全計画表】(平成31年3月時点)										令和5年4月1日の状況									
大分類	No.	施設(建物名)	予防保全部位	更新後等の経過年数~2018	第1期アクションプログラム期間(H31~R9)			施設の状況	未更新等の経過期間(3区分)	予防保全部位	2023(令和5年4月1日)の更新状況	2019~2021年度		2022~2024年度の内容			施設の状況	未更新等の経過期間(3区分)	
					2019~2021	2022~2024	2025~2027					実績	2022実績(令和4年度)	2023予定(令和5年度)	2024予定(令和6年度)				
行政系施設	6-1	北消防署 延床面積 1,918.36㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	27年	更新(防水)			A	-	屋上・屋根	Ⅲ:未更新のまま					指摘なし	5年以内		
			外壁	27年	未更新(塗装等)				A	10年以内	外壁	Ⅲ:未更新のまま					要是正	10年超え	
			受変電	27年	更新(受変電)				A	-	受変電	Ⅲ:未更新のまま				部分改修予定	要是正	5年以内	
			非常電源								非常電源								
			空調	27年	更新(熱源機等)				A	-	空調	Ⅲ:未更新のまま				暖房用温水ボイラー改修予定	要是正	5年以内	
			衛生	27年	更新(給排水管)				A	-	衛生	Ⅲ:未更新のまま					要是正	5年以内	
			防災								防災								
			昇降								昇降								
			概算費用(千円)				105,254	-	-			区分	3					3	
			行政系施設	6-2	北消防署 附属体育館棟 延床面積 437.29㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	27年	未更新(防水)			A	10年以内	屋上・屋根	Ⅲ:未更新のまま					指摘なし
外壁	27年	未更新(塗装等)							A	10年以内	外壁	Ⅲ:未更新のまま					要是正	10年超え	
受変電											受変電								
非常電源											非常電源								
空調	27年	更新(空調配管)							A	-	空調	Ⅲ:未更新のまま					指摘なし	5年以内	
衛生	27年	更新(給排水管)							A	-	衛生	Ⅲ:未更新のまま					指摘なし	5年以内	
防災											防災								
昇降											昇降								
概算費用(千円)							19,232	-	-			区分	3					3	
行政系施設	7-1	クリーンセンター 事業所 延床面積 1,282.92㎡ 目標使用年数 65年				屋上・屋根	38年						屋上・屋根	Ⅲ:未更新のまま					指摘なし
			外壁	38年						外壁	Ⅲ:未更新のまま					要是正	10年超え		
			受変電	38年			作成中				受変電	Ⅲ:未更新のまま					指摘なし	10年超え	
			非常電源	38年							非常電源								
			空調	38年							空調	Ⅲ:未更新のまま					指摘なし	10年超え	
			衛生	38年							衛生	Ⅱ:一部実施(予定を含む)				給湯ボイラー更新	要是正	10年超え	
			防災	38年							防災	Ⅲ:未更新のまま					指摘なし	10年超え	
			昇降	38年							昇降								
			概算費用(千円)									区分	3					3	

旭川市公共施設等総合管理計画

第1期アクションプログラム 施設保全計画表取組状況【令和5年度版】

※未更新等の経過期間は、更新周期を経過していないものは「-」とした。  
 ※主な更新周期は各施設の長期修繕計画を参考とした。

【施設保全計画表】（平成31年3月時点）										令和5年4月1日の状況										
大分類	No.	施設(建物名)	予防保全部位	更新後等の経過年数～2018	第1期アクションプログラム期間(H31～R9)			施設の状況	未更新等の経過期間(3区分)	予防保全部位	2023(令和5年)4月1日の更新状況	2019-2021年度		2022～2024年度の内容			施設の状況	未更新等の経過期間(3区分)		
					2019-2021	2022-2024	2025-2027					実績	2022実績(令和4年度)	2023予定(令和5年度)	2024予定(令和6年度)					
行政系施設	7-2	クリーンセンター車庫 延床面積 1,534.54㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	38年						屋上・屋根	Ⅲ:未更新のまま						要是正	10年超え		
			外壁	38年						外壁	Ⅲ:未更新のまま							指摘なし	10年超え	
			受変電	38年				作成中			受変電	Ⅲ:未更新のまま							指摘なし	10年超え
			非常電源	38年							非常電源									
			空調	38年							空調	Ⅲ:未更新のまま							指摘なし	10年超え
			衛生	38年							衛生	Ⅲ:未更新のまま							指摘なし	10年超え
			防災	38年							防災									
			昇降	38年							昇降									
			概算費用(千円)									区分	3						3	
			行政系施設	8-1	土木事業所管理棟 延床面積 1,031.45㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	37年						屋上・屋根	Ⅲ:未更新のまま						指摘なし
外壁	37年							作成中			外壁	Ⅲ:未更新のまま						指摘なし	10年超え	
受変電	37年										受変電	I:計画通り実施(予定を含む)	更新(受変電)					要是正	10年超え	
非常電源	37年										非常電源	Ⅲ:未更新のまま						指摘なし	10年超え	
空調	37年										空調	Ⅱ:一部実施(予定を含む)		給湯ボイラー更新	温水ボイラー本体の一部改修	温水ボイラー配管更新		指摘なし	10年超え	
衛生	37年										衛生	Ⅲ:未更新のまま						指摘なし	10年超え	
防災	37年										防災									
昇降	37年										昇降									
概算費用(千円)												区分	3						3	
行政系施設	8-2	土木事業所整備場 延床面積 605.85㎡ 目標使用年数 65年				屋上・屋根	37年						屋上・屋根	Ⅲ:未更新のまま						指摘なし
			外壁	37年						外壁	Ⅲ:未更新のまま						指摘なし	10年超え		
			受変電	37年				作成中			受変電									
			非常電源	37年							非常電源									
			空調	37年							空調									
			衛生	37年							衛生									
			防災	37年							防災									
			昇降	37年							昇降									
			概算費用(千円)									区分	3						1	

旭川市公共施設等総合管理計画

第1期アクションプログラム 施設保全計画表取組状況【令和5年度版】

※未更新等の経過期間は、更新周期を経過していないものは「-」とした。  
 ※主な更新周期は各施設の長期修繕計画を参考とした。

【施設保全計画表】（平成31年3月時点）										令和5年4月1日の状況										
大分類	No.	施設(建物名)	予防保全部位	更新後等の経過年数～2018	第1期アクションプログラム期間(H31～R9)			施設の状況	未更新等の経過期間(3区分)	予防保全部位	2023(令和5)年4月1日の更新状況		2019～2021年度		2022～2024年度の内容			施設の状況	未更新等の経過期間(3区分)	
					2019～2021	2022～2024	2025～2027				実績	2022実績(令和4年度)	2023予定(令和5年度)	2024予定(令和6年度)						
行政系施設	8-3	土木事業所 車庫 延床面積 324.00㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	29年						屋上・屋根	Ⅲ:未更新のまま						指摘なし	5年以内		
			外壁	29年						外壁	Ⅲ:未更新のまま						指摘なし	10年超え		
			受変電	29年						受変電										
			非常電源	29年						非常電源										
			空調	29年						空調										
			衛生	29年						衛生										
			防災	29年						防災										
			昇降	29年						昇降										
			概算費用(千円)								区分	3						1		
行政系施設	9-1	北海道エアポート(株) 旭川空港事務所 延床面積 1,124.96㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	37年	未更新(屋根)				C	-	屋上・屋根	Ⅱ:一部実施(予定を含む) 一部更新(部分補修)					要是正	10年超え		
			外壁	37年	未更新(塗装等)					C	-	外壁	Ⅱ:一部実施(予定を含む) 一部更新(部分補修)					要是正	10年超え	
			受変電	37年	未更新(受変電)					A	/	受変電	Ⅱ:一部実施(予定を含む) 更新済み(VCB等のみ) 一部更新(部分補修)	一部更新(部分補修)				指摘なし	10年超え	
			非常電源	37年	未更新(発電機)					A	/	非常電源	Ⅱ:一部実施(予定を含む) 一部更新(部分補修)					指摘なし	10年超え	
			空調								-	空調								
			衛生	37年	未更新(給排水管)					A	-	衛生	Ⅱ:一部実施(予定を含む) 一部更新(部分補修)	一部更新(部分補修)	一部更新(部分補修)				指摘なし	10年超え
			防災	37年	未更新(ポンプ)					A	/	防災	Ⅲ:未更新のまま						指摘なし	10年超え
			昇降								/	昇降								
			概算費用(千円)		195,783		-		-			区分	3					3		
行政系施設	9-2	旭川空港 消防車庫A棟 延床面積 333.50㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	7年	-				A	-	屋上・屋根	-					指摘なし	-		
			外壁	7年	-				A	-	外壁	-					指摘なし	-		
			受変電								/	受変電								
			非常電源								/	非常電源								
			空調	7年	-				A	-	空調	-						指摘なし	-	
			衛生	7年	-				A	-	衛生	-						指摘なし	-	
			防災								/	防災								
			昇降								/	昇降								
			概算費用(千円)		-		-		-			区分	-					1		

旭川市公共施設等総合管理計画

第1期アクションプログラム 施設保全計画表取組状況【令和5年度版】

※未更新等の経過期間は、更新周期を経過していないものは「-」とした。  
 ※主な更新周期は各施設の長期修繕計画を参考とした。

【施設保全計画表】(平成31年3月時点)										令和5年4月1日の状況								
大分類	No.	施設(建物名)	予防保全部位	更新後等の経過年数~2018	第1期アクションプログラム期間(H31~R9)			施設の状況	未更新等の経過期間(3区分)	予防保全部位	2023(令和5年4月1日)の更新状況	2019~2021年度		2022~2024年度の内容			施設の状況	未更新等の経過期間(3区分)
					2019~2021	2022~2024	2025~2027					実績	2022実績(令和4年度)	2023予定(令和5年度)	2024予定(令和6年度)			
行政系施設	9-3	旭川空港 消防車庫B棟 延床面積 792.07㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	23年	-	-	更新(防水)	A	-	屋上・屋根	-					指摘なし	-	
			外壁	23年	未更新(塗装等)				A	5年以内	外壁	Ⅲ:未更新のまま					指摘なし	10年以内
			受変電	23年	-	-	更新(受変電)	A	-	受変電	-						指摘なし	-
			非常電源								非常電源							
			空調	23年	未更新(熱源機)			更新(空調配管)	A	5年以内	空調	Ⅲ:未更新のまま					指摘なし	10年以内
			衛生	23年	-	-	更新(給排水管)	A	-	衛生	-						指摘なし	-
			防災								防災							
			昇降								昇降							
			概算費用(千円)			9,702	-	21,839			区分	3					1	
行政系施設	9-4	旭川空港 除雪車庫1号棟 延床面積 557.01㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	22年	-	-	更新(防水)	A	-	屋上・屋根	-					指摘なし	-	
			外壁	22年	未更新(塗装等)				A	5年以内	外壁	Ⅲ:未更新のまま					指摘なし	10年以内
			受変電								受変電							
			非常電源								非常電源							
			空調								空調							
			衛生								衛生							
			防災								防災							
			昇降								昇降							
			概算費用(千円)			5,706	-	11,537			区分	3					1	
行政系施設	9-5	旭川空港 除雪車庫2号棟 延床面積 499.50㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	5年	-	-	-	A	-	屋上・屋根	-					指摘なし	-	
			外壁	21年	未更新(塗装等)				A	5年以内	外壁	Ⅲ:未更新のまま					指摘なし	10年以内
			受変電								受変電							
			非常電源								非常電源							
			空調								空調							
			衛生	21年	-	-	更新(給排水管)	A	-	衛生	-						指摘なし	-
			防災								防災							
			昇降								昇降							
			概算費用(千円)			6,711	-	2,439			区分	3					1	



旭川市公共施設等総合管理計画

第1期アクションプログラム 施設保全計画表取組状況【令和5年度版】

※未更新等の経過期間は、更新周期を経過していないものは「-」とした。  
 ※主な更新周期は各施設の長期修繕計画を参考とした。

【施設保全計画表】（平成31年3月時点）										令和5年4月1日の状況								
大分類	No.	施設(建物名)	予防保全部位	更新後等の経過年数 ~2018	第1期アクションプログラム期間(H31~R9)			施設の状況	未更新等の経過期間 (3区分)	予防保全部位	2023(令和5年) 4月1日の更新状況	2019-2021年度		2022~2024年度の内容			施設の状況	未更新等の経過期間 (3区分)
					2019-2021	2022-2024	2025-2027					実績	2022実績 (令和4年度)	2023予定 (令和5年度)	2024予定 (令和6年度)			
行政系施設	9-6	旭川空港 除雪車庫3号棟 延床面積 553.87㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	20年	-	-	-	A	-	屋上・屋根	-					指摘なし	-	
			外壁	20年	未更新(塗装等)				A	5年以内	外壁	Ⅲ:未更新のまま					指摘なし	5年以内
			受変電								受変電							
			非常電源								非常電源							
			空調								空調							
			衛生	20年	-	-	-	A	-	衛生	-						指摘なし	-
			防災								防災							
			昇降								昇降							
			概算費用(千円)				4,798	-	-			区分	3					1
行政系施設	10	旭川市総合防災 センター 延床面積 4,959.45㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	10年	-	-	-	A	-	屋上・屋根	Ⅱ:一部実施(予定を含む)			塔屋ルーフトレイン閉鎖及び 漏水は改善済み		要是正	-	
			外壁	10年	-	-	-	A	-	外壁	Ⅱ:一部実施(予定を含む)			排気塔クラックは修 繕済み		要是正	-	
			受変電	10年	-	-	-	A	-	受変電	-					指摘なし	-	
			非常電源	10年	-	-	-	A	-	非常電源	-					指摘なし	-	
			空調	10年	-	-	-	A	-	空調	-					指摘なし	-	
			衛生	10年	-	-	-	A	-	衛生	-					指摘なし	-	
			防災	10年	-	-	-	A	-	防災	-					指摘なし	-	
			昇降	10年	-	-	-	A	-	昇降	-					指摘なし	-	
			概算費用(千円)				-	-	-			区分	2					3
行政系施設	11	4条西文書庫 延床面積 998.00㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	10年						屋上・屋根	Ⅲ:未更新のまま					指摘なし	10年超え	
			外壁	10年						外壁	-					指摘なし	-	
			受変電	10年						受変電								
			非常電源	10年						非常電源								
			空調	10年						空調								
			衛生	10年						衛生	Ⅲ:未更新のまま					指摘なし	10年以内	
			防災	10年						防災								
			昇降	10年						昇降								
			概算費用(千円)				-	-	-			区分	3					1

旭川市公共施設等総合管理計画

第1期アクションプログラム 施設保全計画表取組状況【令和5年度版】

※未更新等の経過期間は、更新周期を経過していないものは「-」とした。  
 ※主な更新周期は各施設の長期修繕計画を参考とした。

【施設保全計画表】(平成31年3月時点)										令和5年4月1日の状況								
大分類	No.	施設(建物名)	予防保全部位	更新後等の経過年数~2018	第1期アクションプログラム期間(H31~R9)			施設の状況	未更新等の経過期間(3区分)	予防保全部位	2023(令和5年4月1日の更新状況)	2019~2021年度		2022~2024年度の内容			施設の状況	未更新等の経過期間(3区分)
					2019~2021	2022~2024	2025~2027					実績	2022実績(令和4年度)	2023予定(令和5年度)	2024予定(令和6年度)			
供給処理施設	1	中国廃棄物最終処分場 汚水処理棟 延床面積 543.23㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	17年	-	-	-	A	-	屋上・屋根	-					要是正	-	
			外壁	17年	-	-	-	A	-	外壁	-					指摘なし	-	
			受変電	17年	未更新(受変電)				A	10年超え	受変電	-					要是正	-
			非常電源								非常電源							
			空調	17年	更新(熱源機)				A	-	空調	Ⅲ:未更新のまま					指摘なし	5年以内
			衛生	17年	更新(ポンプ)				A	-	衛生	-					指摘なし	-
			防災								防災							
			昇降								昇降							
			概算費用(千円)		20,700	-	-				区分	3					3	
供給処理施設	2	環境センター 管理棟・ポンプ室 延床面積 3,177.54㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	28年	未更新(防水)			A	10年以内	屋上・屋根	Ⅲ:未更新のまま					要是正	10年超え	
			外壁	28年	未更新(塗装等)				A	10年以内	外壁	Ⅲ:未更新のまま					要是正	10年超え
			受変電	28年	更新(受変電)				A	-	受変電	Ⅲ:未更新のまま					要是正	5年以内
			非常電源								非常電源							
			空調	28年	更新(熱源機等)				A	-	空調	Ⅲ:未更新のまま					要是正	10年超え
			衛生	28年	更新(ポンプ)				A	-	衛生	Ⅲ:未更新のまま					要是正	10年超え
			防災	28年	更新(ポンプ)				A	-	防災	Ⅲ:未更新のまま					指摘なし	10年超え
			昇降								昇降							
			概算費用(千円)		-	-					区分	3					3	
供給処理施設	3	廃棄物処分場 浸出水処理棟・管理棟 延床面積 3,197.52㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	16年	-	-	-	A	-	屋上・屋根	-					要是正	-	
			外壁	16年	-	更新(塗装等)			A	-	外壁	-					要是正	5年以内
			受変電	16年	-	-	-		A	-	受変電	-	引込柱~受電キュービクル間 高圧ケーブル改修				要是正	-
			非常電源	16年	-	-	-		A	-	非常電源	-					指摘なし	5年以内
			空調	16年	-	-	-		A	-	空調	-	管理棟エアコン一部改修	管理等エアコン一部改修			要是正	-
			衛生	16年	-	-	-		A	-	衛生	-					指摘なし	-
			防災								防災							
			昇降								昇降							
			概算費用(千円)		-	50,000	-				区分	-					3	

旭川市公共施設等総合管理計画

第1期アクションプログラム 施設保全計画表取組状況【令和5年度版】

※未更新等の経過期間は、更新周期を経過していないものは「-」とした。  
 ※主な更新周期は各施設の長期修繕計画を参考とした。

【施設保全計画表】（平成31年3月時点）										令和5年4月1日の状況								
大分類	No.	施設(建物名)	予防保全部位	更新後等の経過年数～2018	第1期アクションプログラム期間(H31～R9)			施設の状況	未更新等の経過期間(3区分)	予防保全部位	2023(令和5年4月1日)の更新状況	2019～2021年度		2022～2024年度の内容			施設の状況	未更新等の経過期間(3区分)
					2019～2021	2022～2024	2025～2027					実績	2022実績(令和4年度)	2023予定(令和5年度)	2024予定(令和6年度)			
その他	1	旭川聖苑 延床面積 6,252.98㎡ 目標使用年数 80年	屋上・屋根	19年	-	-	-	A	-	屋上・屋根	-					指摘なし	-	
			外壁	19年	更新(塗装等)				C	-	外壁	Ⅲ:未更新のまま					指摘なし	5年以内
			受変電	19年	-	-	-	A	-	受変電	-						指摘なし	-
			非常電源	19年	-	-	-	A	-	非常電源	-	更新済み(制御盤)		更新予定(蓄電池)			指摘なし	-
			空調	19年	-				A	-	空調	Ⅲ:未更新のまま					指摘なし	5年以内
			衛生	19年	更新(ポンプ)				A	-	衛生	Ⅲ:未更新のまま					指摘なし	5年以内
			防災	19年	更新(ポンプ)				A	-	防災	Ⅲ:未更新のまま					指摘なし	5年以内
			昇降	19年	-	-	-	A	-	昇降	-						指摘なし	-
			概算費用(千円)		33,381						区分	3					1	
その他	2	動物愛護センター 延床面積 734.54㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	6年	-	-	-	A	-	屋上・屋根	-					指摘なし	-	
			外壁	6年	-	-	-	A	-	外壁	-					指摘なし	-	
			受変電								受変電							
			非常電源								非常電源							
			空調	6年	-	-	-	A	-	空調	-	Y型ストレーナ交換	プレート式熱交換器 分解洗浄作業				指摘なし	-
			衛生	6年	-	-	-	A	-	衛生	-						指摘なし	-
			防災								防災							
			昇降	6年	-	-	-	A	-	昇降	-						指摘なし	-
			概算費用(千円)		-	-	-			区分	-						1	
その他	3	旭川駅前広場駐車 駐輪場 延床面積 2,436.72㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	6年	-	-	-	A	-	屋上・屋根	-	一部修繕(屋上)				指摘なし	-	
			外壁	6年	-	-	-	A	-	外壁	-					指摘なし	-	
			受変電								受変電							
			非常電源								非常電源							
			空調								空調							
			衛生	6年	-	-	-	A	-	衛生	-						指摘なし	-
			防災								防災							
			昇降								昇降							
			概算費用(千円)		-	-	-			区分	-						1	
