

中園廃棄物最終処分場

令和6年 11 月 埋 立 地 内 施 設 点 検 表（チェックシート）

施設		点検項目	点検結果	点検日	特記事項
貯留構造物	重力式コンクリート	盛土との接合部のクラック、剥離、劣化	☒ 問題なし ☐ 問題有り	11月27日	
		天端管理用道路の陥没	☒ 問題なし ☐ 問題有り	11月27日	
		下流側コンクリート面のクラック、漏水	☒ 問題なし ☐ 問題有り	11月27日	
		重力式コンクリート天端の高さ	別紙記載	11月27日	
		堰堤の位置	別紙記載	11月27日	
雨水集排水施設	雨水・外周排水路	施設の損傷及び不当沈下の有無	☒ 問題なし ☐ 問題有り	11月27日	
		U字溝、減勢工、集水枡、接続枡、呑口工などの土砂の堆積状況	☒ 問題なし ☐ 問題有り	11月27日	
		溢流箇所や滞水箇所の有無及び状況	☒ 問題なし ☐ 問題有り	11月27日	
		周辺部からの水及び土砂の流入状況	☒ 問題なし ☐ 問題有り	11月27日	
		周辺部の雑草の生育状況	☒ 問題なし ☐ 問題有り	11月27日	
		雨水の流下状況	☒ 問題なし ☐ 問題有り	11月27日	
道路設備	搬入道路部	舗装面の破損の有無	☒ 問題なし ☐ 問題有り	11月27日	
		倒木・土砂流入による交通傷害	☒ 問題なし ☐ 問題有り	11月27日	
		搬入車両からの落下物	☒ 問題なし ☐ 問題有り	11月27日	
		搬入車両による道路の汚染	☒ 問題なし ☐ 問題有り	11月27日	
埋立地平面部		現地盤の陥没、沈下による滞水の状況	☒ 問題なし ☐ 問題有り	11月27日	
埋処理ガ施設	露出箇所	ガス抜き設備の不具合	☒ 問題なし ☐ 問題有り	11月27日	

(備考)

.....

.....

.....


.....

点検者 石 動 絢 暉

中園廃棄物最終処分場
重力式コンクリート測定

令和 6年 11月

H17-T29
H=126.674

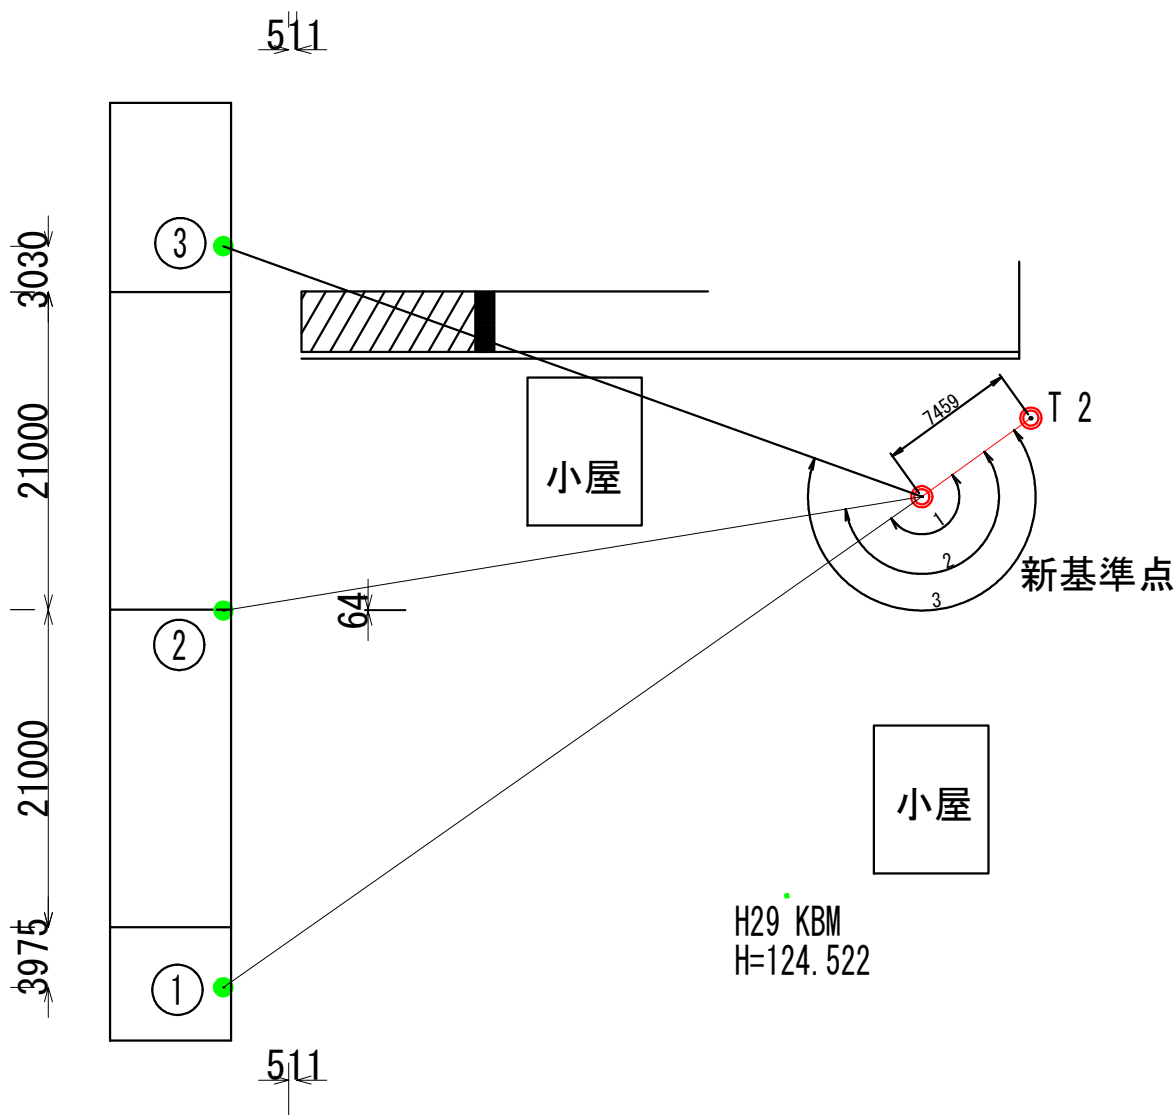

	①		②		③		備考
月日	基準高	角度	基準高	角度	基準高	角度	
12月	129.227	202° 15' 10"	129.236	226° 59' 30"	129.229	252° 18' 20"	
4月	129.229	202° 15' 10"	129.237	226° 59' 30"	129.231	252° 18' 30"	
5月	129.228	202° 15' 20"	129.235	226° 59' 40"	129.229	252° 18' 30"	
6月	129.228	202° 15' 10"	129.237	226° 59' 30"	129.230	252° 18' 20"	
7月	129.227	202° 15' 00"	129.236	226° 59' 30"	129.229	252° 18' 30"	
8月	129.229	202° 15' 10"	129.237	226° 59' 40"	129.228	252° 18' 10"	
9月	129.228	202° 15' 20"	129.235	226° 59' 20"	129.230	252° 18' 20"	
10月	129.227	202° 15' 10"	129.237	226° 59' 30"	129.228	252° 18' 10"	
11月	129.229	202° 15' 10"	129.235	226° 59' 20"	129.231	252° 18' 20"	
