



15m³以上を使用したことを証明する書類


1 地域材 15m³の使用及び産地の証明に必要な書類

構造材の材積（使用長さ）＋羽柄材等の材積（現場納入された定尺の数量） $\geq 15\text{m}^3$
※合板、仕上材等

	書類名	発行元	区分	数量証明	産地証明
①	売買契約書の写し	旭川市（農政部） ※市有林の場合	共通		○
②	生産地証明書	旭川市（農政部） ※市有林の場合	共通		○
③ a	納品書兼合法木材証明書 （産地記載）	製材業者	共通	○（羽柄材）	○
③ b	納品書兼合法木材証明書 （産地記載）	集成材製造業者	構造材		○
③ c	納品書兼合法木材証明書 （産地記載）	プレカット業者	構造材		○
④	木取表又は木拾いリスト（産地記載） ※材積（使用長さ）を算出、記載	プレカット業者	構造材	○	○
⑤	プレカット図 （番付け入、産地記載）	プレカット業者	構造材	○	○
⑥	数量明細書（産地記載） ※材積（定尺）を記載	プレカット業者	羽柄材	○	○
⑦	数量根拠資料（施工図、詳細図、仕様書など数量を算出する際に使用したもの）	プレカット業者	羽柄材	○	


※道産材の場合は①、②を除く。

【地域材及び書類の流れ（旭川産材の場合）】

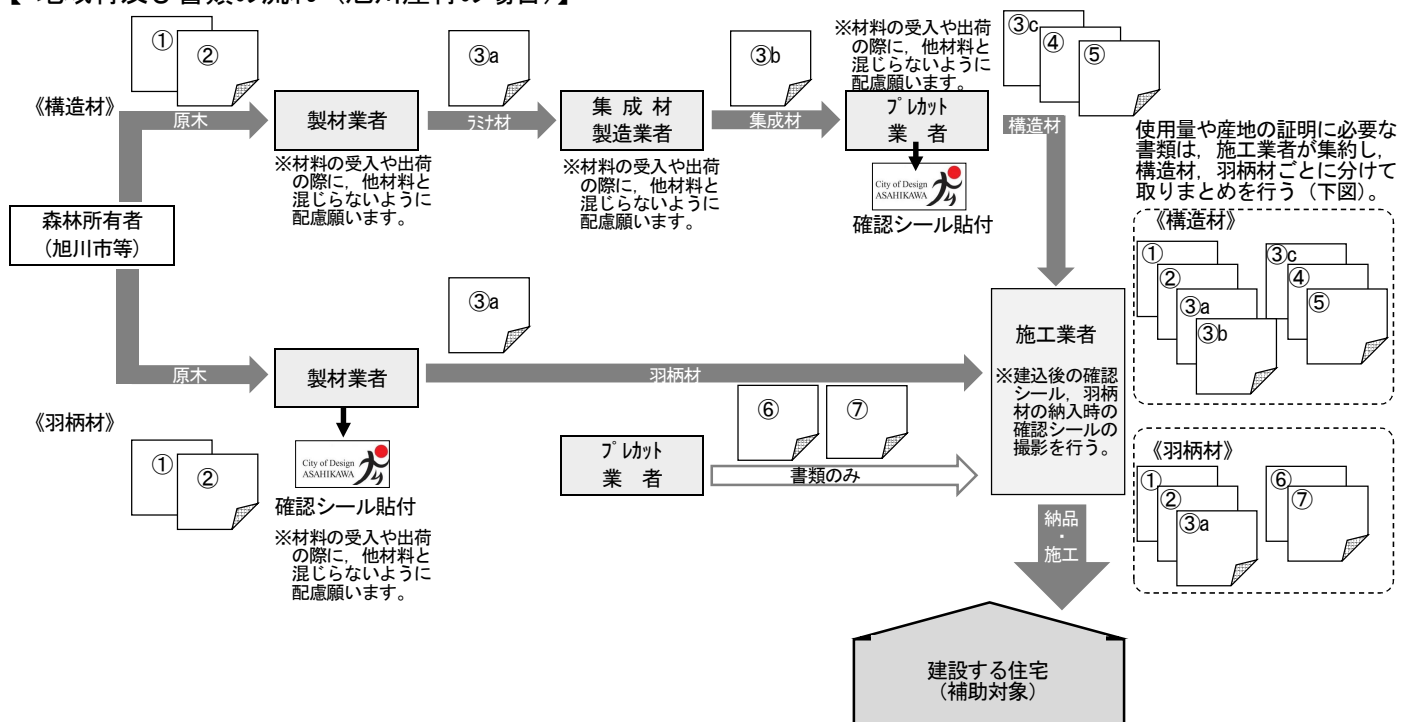

- 【旭川産材確認シールについて】
- ・補助対象とする旭川産材の建材のみに貼り付けます。
 - ・旭川産材以外の道内産材及び外国産材には貼付できません。


構 造 材

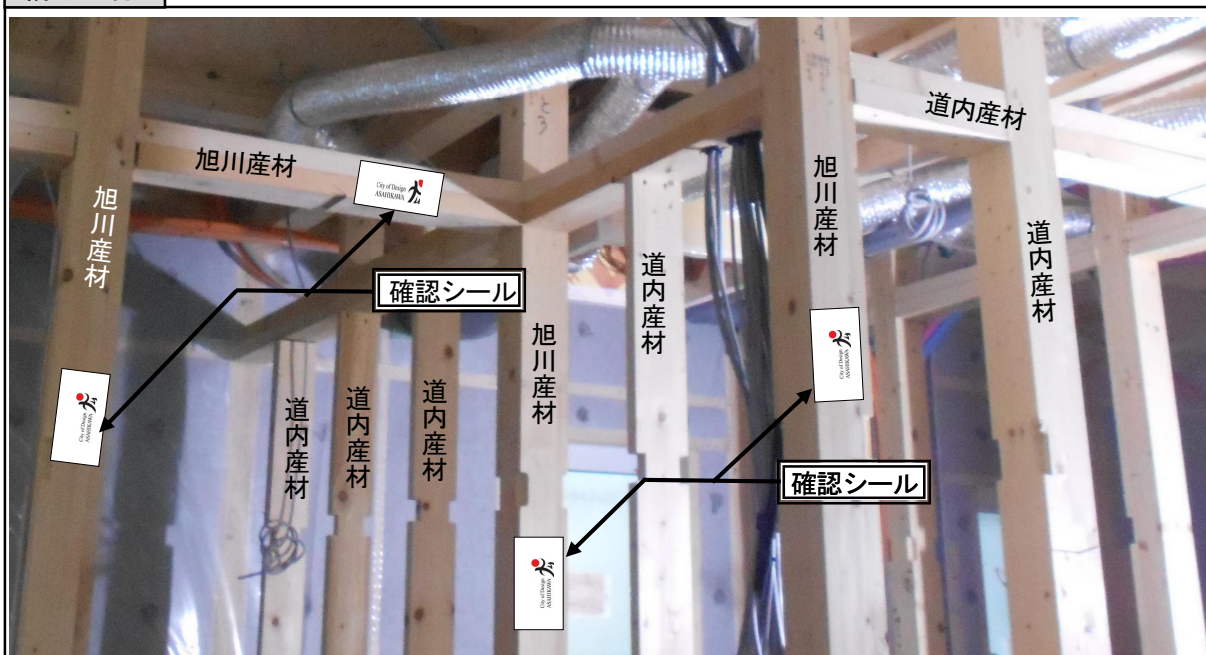

【旭川産材確認シール貼付に当たってのお願い】

- ・プレカット図や木拾いリスト(木取表)で決めた旭川産材の使用建材に旭川産材確認シールを貼り付けてください。
- ・構造材への貼付は、旭川産材の使用建材に適切に貼り付けを行うため、プレカット業者が行ってください。
- ・土台、柱、梁などの使用部位にバランス良く貼り付けをお願いします。
- ・写真は、現場搬入時と建て方完了時に撮影してください。建て方完了時の写真については、壁、天井、床の仕上材で覆う前に、貼り付けた面（横・上・下の各方向）全体がわかるように2箇所以上撮影してください。

羽 柄 材

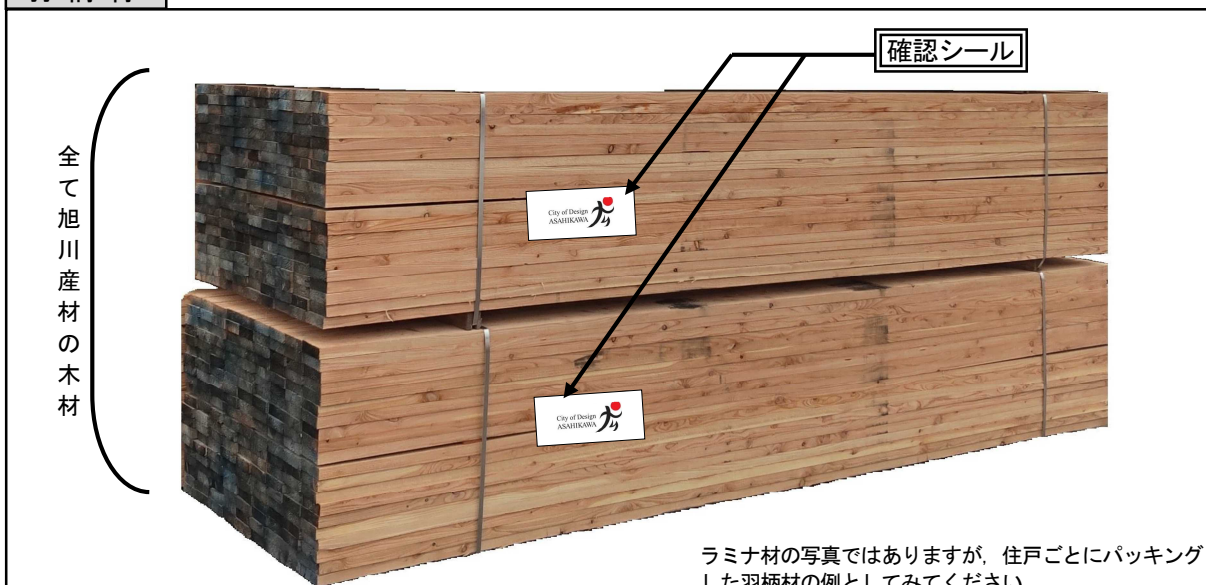

【旭川産材確認シール貼付に当たってのお願い】

- ・羽柄材への確認シールの貼付は、住戸ごとに出荷するパッキングの外側に貼り付けます。使用建材1本ごとへの貼付は不要です。
- ・羽柄材への貼付は、旭川産材と他建材を明確に区分するため、製材業者が行ってください。
- ・写真は、現場搬入時（上記写真）と建て方完了時に撮影してください。建て方完了時の写真については、羽柄材を施工した部位（壁下地、床下地、天井下地等）ごとに、断熱材や仕上材で覆う前の写真を撮影してください。

公有財産売買契約書

売出人 旭川市（以下「甲」という。）と買受人（以下「乙」という。）とは、次の条項により旭川市公有財産の売買契約を締結する。

この契約の締結を証するため本契約書2通を作成し、両者記名押印の上、各自がその1通を保有するものとする。

令和6年 月 日

甲（売出人） 旭川市7条通9丁目48番地
旭川市長 今 津 寛 介

乙（買受人）

（信義誠実の義務）

第1条 甲、乙両者は、信義を重んじ誠実に本契約を履行しなければならない。

（売買物件）

第2条 売買物件（丸太）は次のとおりとする。

- | | | | |
|---------|-----------------|-----|------|
| 1 樹種、数量 | トドマツ（素材L=3.65m） | 〇〇本 | 〇〇m3 |
| | トドマツ（素材L=2.80m） | 〇〇本 | 〇〇m3 |
| | 針葉樹パルプ原料材 トドマツ | 〇〇本 | 〇〇m3 |
| | 広葉樹パルプ原料材 | 〇〇本 | 〇〇m3 |
| 2 物件の所在 | 旭川市 | | |

（売買代金）

第3条 売買代金は金 円とする。

（うち消費税及び地方消費税の額 金 円）

（契約保証金）

第4条 免除とする。

※売買契約書は3枚1セット

生産地証明申請書

令和 6 年 6 月〇日

旭川市長 殿

申請者 住所 旭川市〇条〇〇丁目〇〇－〇
氏名 〇〇〇〇株式会社
代表取締役 〇〇 〇〇

令和 6 年 6 月〇〇日に引渡しを受けた次の物件について、生産地証明を申請します。

申請物件 (単位：m 3)

物件所在地	樹 種	材 積	備 考
旭川市〇〇町〇〇番地 (〇〇林班〇〇小班)	トドマツ	〇〇〇 m3	

生産地証明書

令和 6 年 6 月〇日

〇〇〇〇株式会社
代表取締役 〇〇 〇〇 様

上記申請物件の物件所在地において生産された木材であることを証明します。

旭川市長 今津 寛介

納品書

〒
旭川市
〇〇〇〇株式会社
TEL
FAX

本品は合法木材です。合法木材供給事業者認定 道木連 第 号

下記の物件は、持続可能な森林経営を行っている森林から、合法的に伐採された木材及び間伐材を原料としていること及び産地（原木の伐採地）を証明します。

納品書 (合法木材証明書)

株式会社〇〇工務店 御中

工事名 : 工事

令和 月 日

工事場所 :

〒 〇〇〇〇株式会社

納品日 :

TEL FAX


構造材内訳

	樹種	品名	等級	長さm	厚さcm	巾cm	数量	材積	認証名称	備考
1	米ヒバ集成材	土台	構造用	4.00	10.5	10.5	6	0.2646	合法木材	外国材
2	"	"	"	3.65	10.5	10.5	10	0.4020	"	"
3	トドマツ集成材	梁	"	3.65	10.5	39.0	1	0.1495	"	旭川産材
4	"	"	"	4.60	10.5	27.0	1	0.1304	"	"
5	"	"	"	3.65	10.5	27.0	9	0.9315	"	"
6	"	"	"	4.60	10.5	24.0	1	0.1159	"	"
7	"	"	"	4.00	10.5	24.0	2	0.2016	"	"
8	"	"	"	3.65	10.5	24.0	2	0.1840	"	"
9	"	"	"	2.80	10.5	24.0	8	0.5648	"	"
10	"	"	"	4.00	10.5	21.0	1	0.0882	"	"
11	"	"	"	3.65	10.5	21.0	1	0.0805	"	"
12	"	"	"	3.65	10.5	18.0	1	0.0690	"	"
13	"	"	"	2.80	10.5	18.0	1	0.0529	"	"
14	"	"	"	4.00	10.5	15.0	1	0.0630	"	"
15	"	"	"	3.65	10.5	15.0	4	0.2300	"	"
16	"	"	"	2.80	10.5	15.0	1	0.0441	"	"
17	"	桁	"	4.00	10.5	10.5	2	0.0882	"	"
18	"	"	"	3.65	10.5	10.5	25	1.0050	"	"
19	"	柱	"	3.65	10.5	21.0	1	0.0805	"	"
20	"	"	"	2.80	10.5	15.0	1	0.0441	"	"
21	"	"	"	4.00	10.5	10.5	2	0.0882	"	"
22	"	"	"	3.00	10.5	10.5	33	1.0923	"	"
23	"	"	"	2.80	10.5	10.5	40	1.2360	"	"
24	トドマツ	梁	"	4.00	12.0	42.0	1	0.2016	"	"
合 計								7.4079		

産地を記載
して下さい

口木材使用量

		材積 m3	使用割合	判定
土台	使用量	0.67		
	うち認証材	0.67	100%	
柱	使用量	2.54		
	うち認証材	2.54	100%	
梁	使用量	3.11		
	うち認証材	3.11	100%	
桁	使用量	1.09		
	うち認証材	1.09	100%	
合計	使用量	7.41		
	うち認証材	7.41	100%	Ok

※但し、上記明細書の「認証名称」に「合法」及び
「産地証明」と明記された木材に対し合法木材で
ある事を証明いたします。

木拾いリスト
(木取表)

			A			B			C			A×B×C		
部位	素材種別					木取り部品			使用長さ	残材長さ	使用材積	備考		
	樹種	等級	断面		長さ	層	No.	長さ						
土台	トドマツ集成	E95	105	105	4,000	1	18	3,923.0	3,923.0	77.0	0.0433	道内産		
	トドマツ集成	E95	105	105	4,000	1	3	3,850.5	3,850.5	149.5	0.0425	〃		
	トドマツ集成	E95	105	105	4,000	1	5	3,850.5	3,850.5	149.5	0.0425	〃		
	トドマツ集成	E95	105	105	4,000	1	12	3,850.5	3,850.5	149.5	0.0425	〃		
	トドマツ集成	E95	105	105	4,000	1	14	3,850.5	3,850.5	149.5	0.0425	〃		
	トドマツ集成	E95	105	105	4,000	1	16	3,850.5	3,850.5	149.5	0.0425	〃		
	トドマツ集成	E95	105	105	4,000	1	2	3,775.0	3,775.0	225.0	0.0416	〃		
	トドマツ集成	E95	105	105	4,000	1	6	3,775.0	3,775.0	225.0	0.0416	〃		
	トドマツ集成	E95	105	105	4,000	1	7	3,775.0	3,775.0	225.0	0.0416	〃		
	トドマツ集成	E95	105	105	4,000	1	10	3,775.0	3,775.0	225.0	0.0416	〃		
	トドマツ集成	E95	105	105	4,000	1	21	3,775.0	3,775.0	225.0	0.0416	〃		
	トドマツ集成	E95	105	105	4,000	1	36	3,775.0	3,775.0	225.0	0.0416	〃		
	トドマツ集成	E95	105	105	4,000	1	37	3,775.0	3,775.0	225.0	0.0416	〃		
	トドマツ集成	E95	105	105	3,650	1	15	3,601.0	3,601.0	49.0	0.0397	〃		
	トドマツ集成	E95	105	105	3,650	1	30	3,601.0	3,601.0	49.0	0.0397	〃		
	トドマツ集成	E95	105	105	3,650	1	1	3,598.0	3,598.0	52.0	0.0397	〃		
	トドマツ集成	E95	105	105	3,650	1	17	3,598.0	3,598.0	52.0	0.0397	〃		
	トドマツ集成	E95	105	105	3,650	1	19	3,598.0	3,598.0	52.0	0.0397	〃		
	トドマツ集成	E95	105	105	3,650	1	35	3,598.0	3,598.0	52.0	0.0397	〃		
	トドマツ集成	E95	105	105	3,650	1	8	3,525.5	3,525.5	124.5	0.0389	〃		
	トドマツ集成	E95	105	105	3,650	1	9	3,525.5	3,525.5	124.5	0.0389	〃		
	トドマツ集成	E95	105	105	3,650	1	34	2,865.0	3,585.0	65.0	0.0395	〃		
						1	23	720.0			0.0000	〃		
	トドマツ集成	E95	105	105	3,650	1	29	2,763.5	3,483.5	166.5	0.0384	〃		
						1	24	720.0			0.0000	〃		
	トドマツ集成	E95	105	105	3,650	1	4	1,853.5	3,634.5	15.5	0.0401	〃		
						1	31	1,781.0			0.0000	〃		
	トドマツ集成	E95	105	105	2,730	1	26	2,540.0	2,540.0	190.0	0.0280	〃		
	トドマツ集成	E95	105	105	2,730	1	22	2,103.0	2,103.0	627.0	0.0232	〃		
	トドマツ集成	E95	105	105	2,730	1	11	2,030.5	2,030.5	699.5	0.0224	〃		
軒桁・梁桁・枕梁	トドマツ集成	E95	105	420	5,424	2	64	5,424.0	5,424.0	0.0	0.2392	旭川産		
	トドマツ集成	E95	105	420	4,514	2	56	4,514.0	4,514.0	0.0	0.1991	旭川産		
	トドマツ集成	E95	105	420	3,852	2	34	3,852.0	3,852.0	0.0	0.1699	旭川産		
	トドマツ集成	E95	105	390	5,565	2	47	5,565.0	5,565.0	0.0	0.2279	旭川産		
	トドマツ集成	E95	105	390	5,495	2	55	5,495.0	5,495.0	0.0	0.2250	旭川産		
	トドマツ集成	E95	105	390	5,425	2	48	5,425.0	5,425.0	0.0	0.2222	旭川産		
	トドマツ集成	E95	105	390	5,425	2	51	5,425.0	5,425.0	0.0	0.2222	旭川産		
	トドマツ集成	E95	105	390	5,425	2	53	5,425.0	5,425.0	0.0	0.2222	旭川産		
	トドマツ集成	E95	105	390	5,425	2	57	5,425.0	5,425.0	0.0	0.2222	旭川産		
	トドマツ集成	E95	105	390	5,425	2	62	5,425.0	5,425.0	0.0	0.2222	旭川産		


産地を記載
して下さい

使用した材積

道内産材	計	m3
旭川産材	計	m3

※産地別に使用長さ（カット後）の材積を算出，
集計し，木材実績数量表に記載

使用する建材に産地
を記載して下さい。

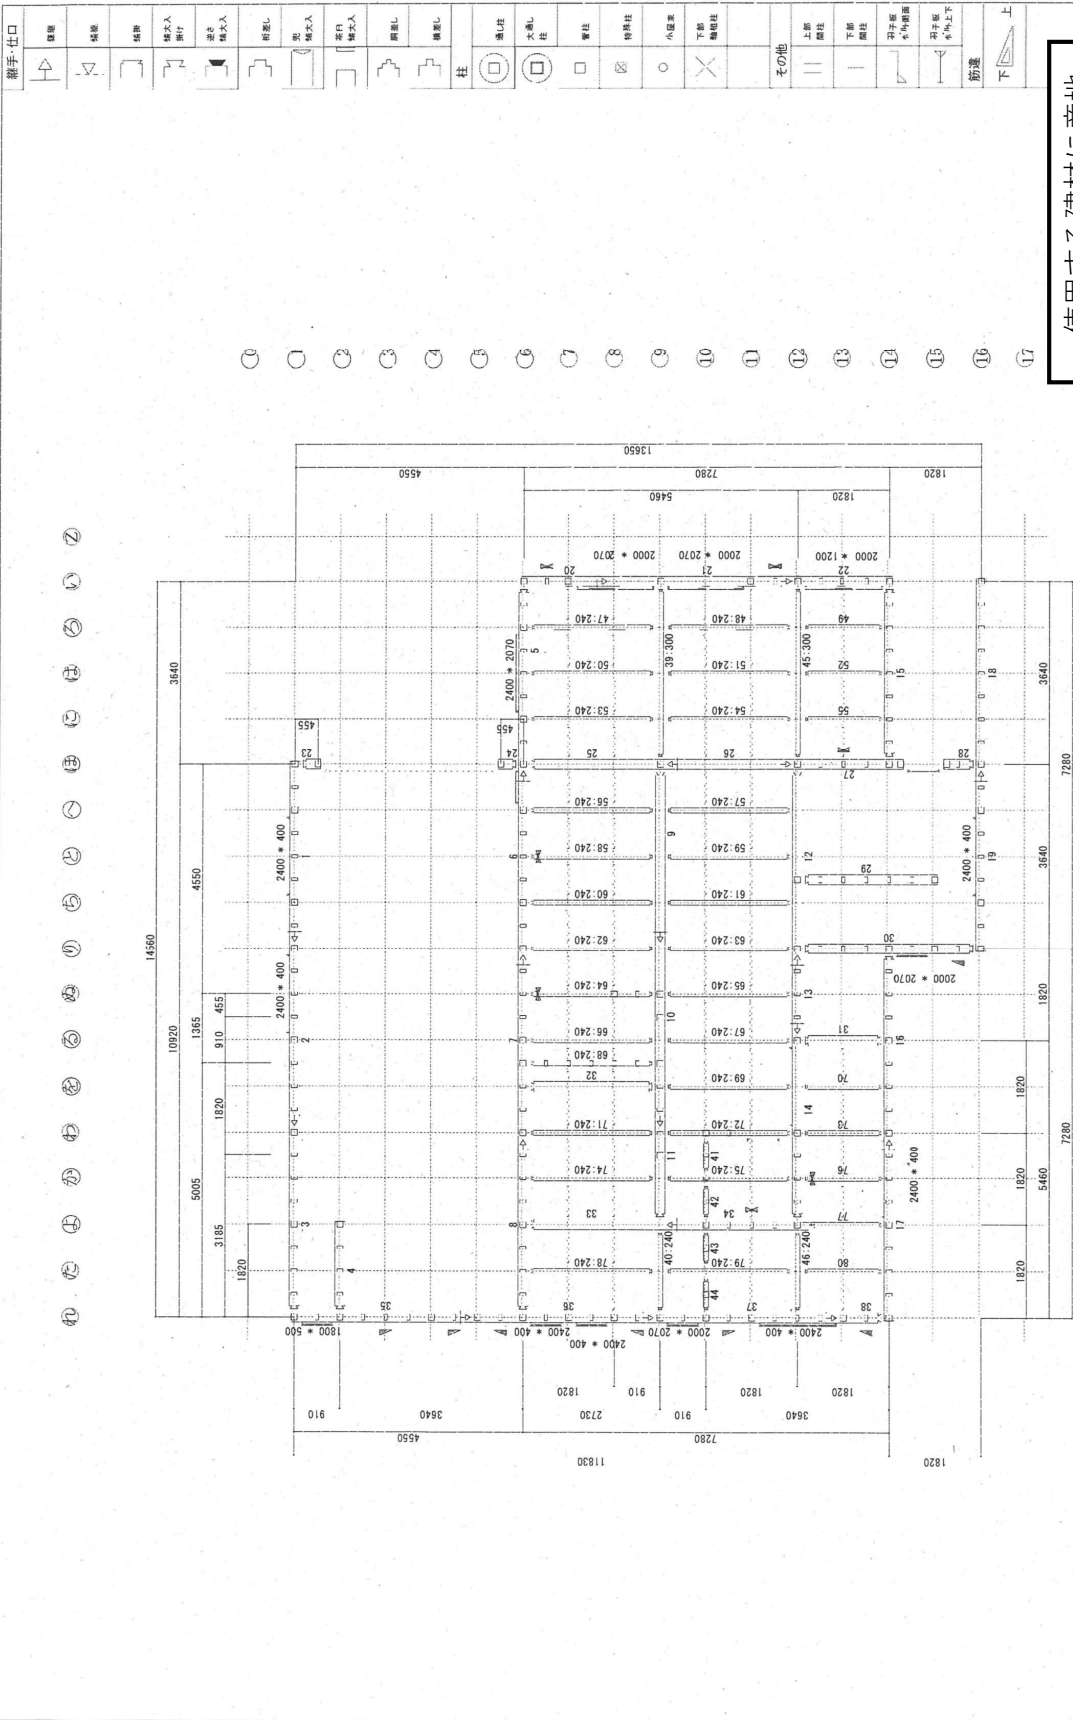

工事名称	1階床構造平面図	1/85	基本ピッチ	910.0	特記ナキ部材	105*105	階高	1階:2985 2階:2805
図面名称	1階床構造平面図	1/85	屋根勾配	図面に表示	図面作成日時	2024-02-07 17:26	CAD	

下地材明細書

No.2

受注先:

現場名:

材 種	長さ	厚さ	巾	数 量	材 積	単 価	金 額	
人乾材								
建方	3.65	3.0	10.5	10	0.1150 m3		0	道産材
"	3.65	4.5	10.5	3	0.0516 m3		0	"
ファイアーストップ	3.65	4.5	10.5	15	0.2580 m3		0	旭川産材
開口	3.65	4.5	10.5	4	0.0688 m3		0	"
筋ガイ	3.65	4.5	10.5	7	0.1204 m3		0	"
小屋筋交	3.65	1.8	10.5	30	0.2070 m3		0	"
外壁下地	3.65	1.8	10.5	40	0.2760 m3		0	"
"	3.65	1.8	4.5	115	0.3450 m3		0	"
エアホール	3.65	1.8	4.5		0.0000 m3		0	"
"	3.65	1.8	10.5		0.0000 m3		0	"
仮筋ガイ	3.65	1.8	10.5		0.0000 m3		0	"
内壁下地	3.65	1.8	4.5	80	0.2400 m3		0	"
"	3.65	1.8	10.5	5	0.0345 m3		0	"
天井下地	3.65	4.5	4.5	118	0.8732 m3		0	"
吊木	3.65	4.5	4.5	8	0.0592 m3		0	"
" 受	3.65	4.5	10.5	20	0.3440 m3		0	"
下地材	3.65	4.5	4.5	12	0.0888 m3		0	"
"	3.65	3.0	10.5	10	0.1150 m3		0	"
"	3.65	4.5	10.5	12	0.2064 m3		0	"
イーブス受45*88	3.65	4.5	10.5	7	0.1204 m3		0	"
淀	3.65	1.8	4.5	10	0.0300 m3		0	"
付加断受け	3.65	3.0	10.5	20	0.2300 m3		0	"
窓廻下地	3.65	1.8	10.5	20	0.1380 m3		0	"
窓廻下地27*45	3.65	3.0	4.5	20	0.0980 m3		0	"
乾燥量					4.0193 m3		0	
プレーナ料					4.0193 m3		0	
シャクリ加工料					0.0000 m3		0	
生材								
野地垂木	3.65	4.5	6.0	65	0.6435 m3		0	旭川産材
破風	3.65	3.0	18.0	10	0.1970 m3		0	"
笠木	3.65	4.5	22.3	7	0.2562 m3		0	"
土台水切	3.65	4.5	9.0	11	0.1628 m3		0	"
野地合板4☆	12mm	910×1820		45	0.8943 m3		0	道産材
ネタレス合板	24mm	910×1820		62	2.4644 m3		0	"
OSB合板	9mm	910×3000		73			0	
ネタレスカット料	(24mm	910×1820)		62			0	
No.2 計				93	5.2788		0	
合 計					15.4073		0	

定尺の材積

道内産材 計 m3
旭川産材 計 m3

産地を記載
して下さい

※産地別に定尺の材積を集計し、木材実績数量表に記載

