

第6回 旭川駅周辺かわまちづくり計画 推進WG

説明資料

令和7年6月12日

(1) 昨年度WGについて

昨年度推進WGの実施概要

第1回推進WG

【開催日及び開催場所】 令和6年6月5日（水）18:00～19:30 旭川市役所 総合庁舎7階 大会議室B
【議事】 昨年度検討会・昨年度成果・計画に関連する事業・今年度の活動・今後のスケジュールについて



第2回推進WG

【開催日及び開催場所】 令和6年9月3日（火）18:00～20:00 旭川市役所 総合庁舎7階 大会議室B
【議事】 各事業の報告・令和6年度重点活動方針の状況・施設設計・今後のスケジュール等について



第3回推進WG

【開催日及び開催場所】 令和6年11月21日（木）18:00～20:00 旭川合同庁舎 東館1階 入札執行室
【議事】 施設設計・各事業の報告・今後のスケジュール等について



第4回推進WG

【開催日及び開催場所】 令和7年1月21日（火）18:00～20:00 旭川合同庁舎 東館1階 入札執行室
【議事】 施設設計・各事業の報告・次年度の取り組み・今後のスケジュール等について



第5回推進WG

【開催日及び開催場所】 令和7年3月4日（火）18:00～20:30 旭川合同庁舎 東館1階 入札執行室
【議事】 施設設計・各事業の報告・次年度の取り組み・今後のスケジュール等について



(2) 昨年度の成果と課題

昨年度の成果と課題

令和6年度の成果

- ①親水広場（ツインハーブ橋上流）、側帯、路面標示の設計の合意
- ②サイクリングマップの公開
- ③水辺利用ルールの公開 <https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/kurashi/329/336/d081304.html>

昨年度WGにおける課題

- ・ 親水広場（神楽岡公園、旭川駅南口）の設計について、WGでは産卵場所の保全、河道整正の必要性等に関する意見があり、合意には至らなかった。
- ・ WGにおける議論の大部分がハード整備に関する内容になっており、維持管理や利活用といった運用面に関する議論が十分に行われなかった。



【課題への対応】

- ◆より専門的な視点から検討を行うための体制づくり
⇒分科会の設置（親水広場の設計の合意形成、運用面に関する議論の推進を図る）
- ◆運用面に関する活動方針の強化
⇒重点的活動方針の設定、推進工程の見直し

(3) 今年度の活動予定

ハード整備について(国:親水施設等)

これまでの「旭川駅周辺かわまちづくり計画推進WG」において、忠別川・牛朱別川で親水広場等の利活用や整備面の課題に対する方策等が議論されてきており、以下に「かわまちづくりにおける施設整備の方針等」について整理する。(※かわまちづくり計画の事業実施期間は「令和6年度～令和10年度までの5年間」。)

① 親水施設等の整備箇所(4箇所)

(1) 旭川駅南口

(3) ツインハープ橋上流



(2) 神楽岡公園

「かわまちづくりにおける親水施設等の整備箇所」は下記の通り4箇所となる。

- (1) 旭川駅南口 (2) 神楽岡公園
(3) ツインハープ橋上流 (4) 牛朱別川左岸 ※ (1)～(3)は忠別川。



(4) 牛朱別川左岸

② 各箇所の主な利活用方策と整備方策


整備箇所	利活用方策	整備方策	整備時期(予定)
旭川駅南口 (忠別川右岸側)	ラフティングやカヌーによる川下りなど	親水広場の整備 (水辺の空間創出)	令和9～10年度
神楽岡公園 (忠別川左岸側)	ラフティングやカヌーによる川下りなど	親水広場の整備 (水辺の空間創出)	令和8～9年度
ツインハープ橋上流 (忠別川右岸側)	ラフティングやカヌーによる川下りなど	親水広場・取付道路の整備 (水辺の空間創出・水辺へのアクセス性向上)	令和7年度
牛朱別川左岸 (牛朱別川左岸側)	サイクリング・フットパスコースの設定やサイクリング・ランニング大会の実施など	側帯の整備 (駐輪・休憩スペースの確保)	令和7年度

① ツインハーブ橋上流整備箇所

①-1 整備箇所の概要(親水広場・取付道路部拡幅)

◆親水広場（緩傾斜法面）整備内容

ツインハープ橋上流箇所における親水広場（緩傾斜法面）は縦断的整備とし、以下に示す平面図・縦断図・標準断面図をもとに整備する。また、親水広場の整備に伴い**工事影響範囲内の既設護岸は一度撤去し、親水広場の整備と併せて復旧する**（※護岸未施工区間を含む）。

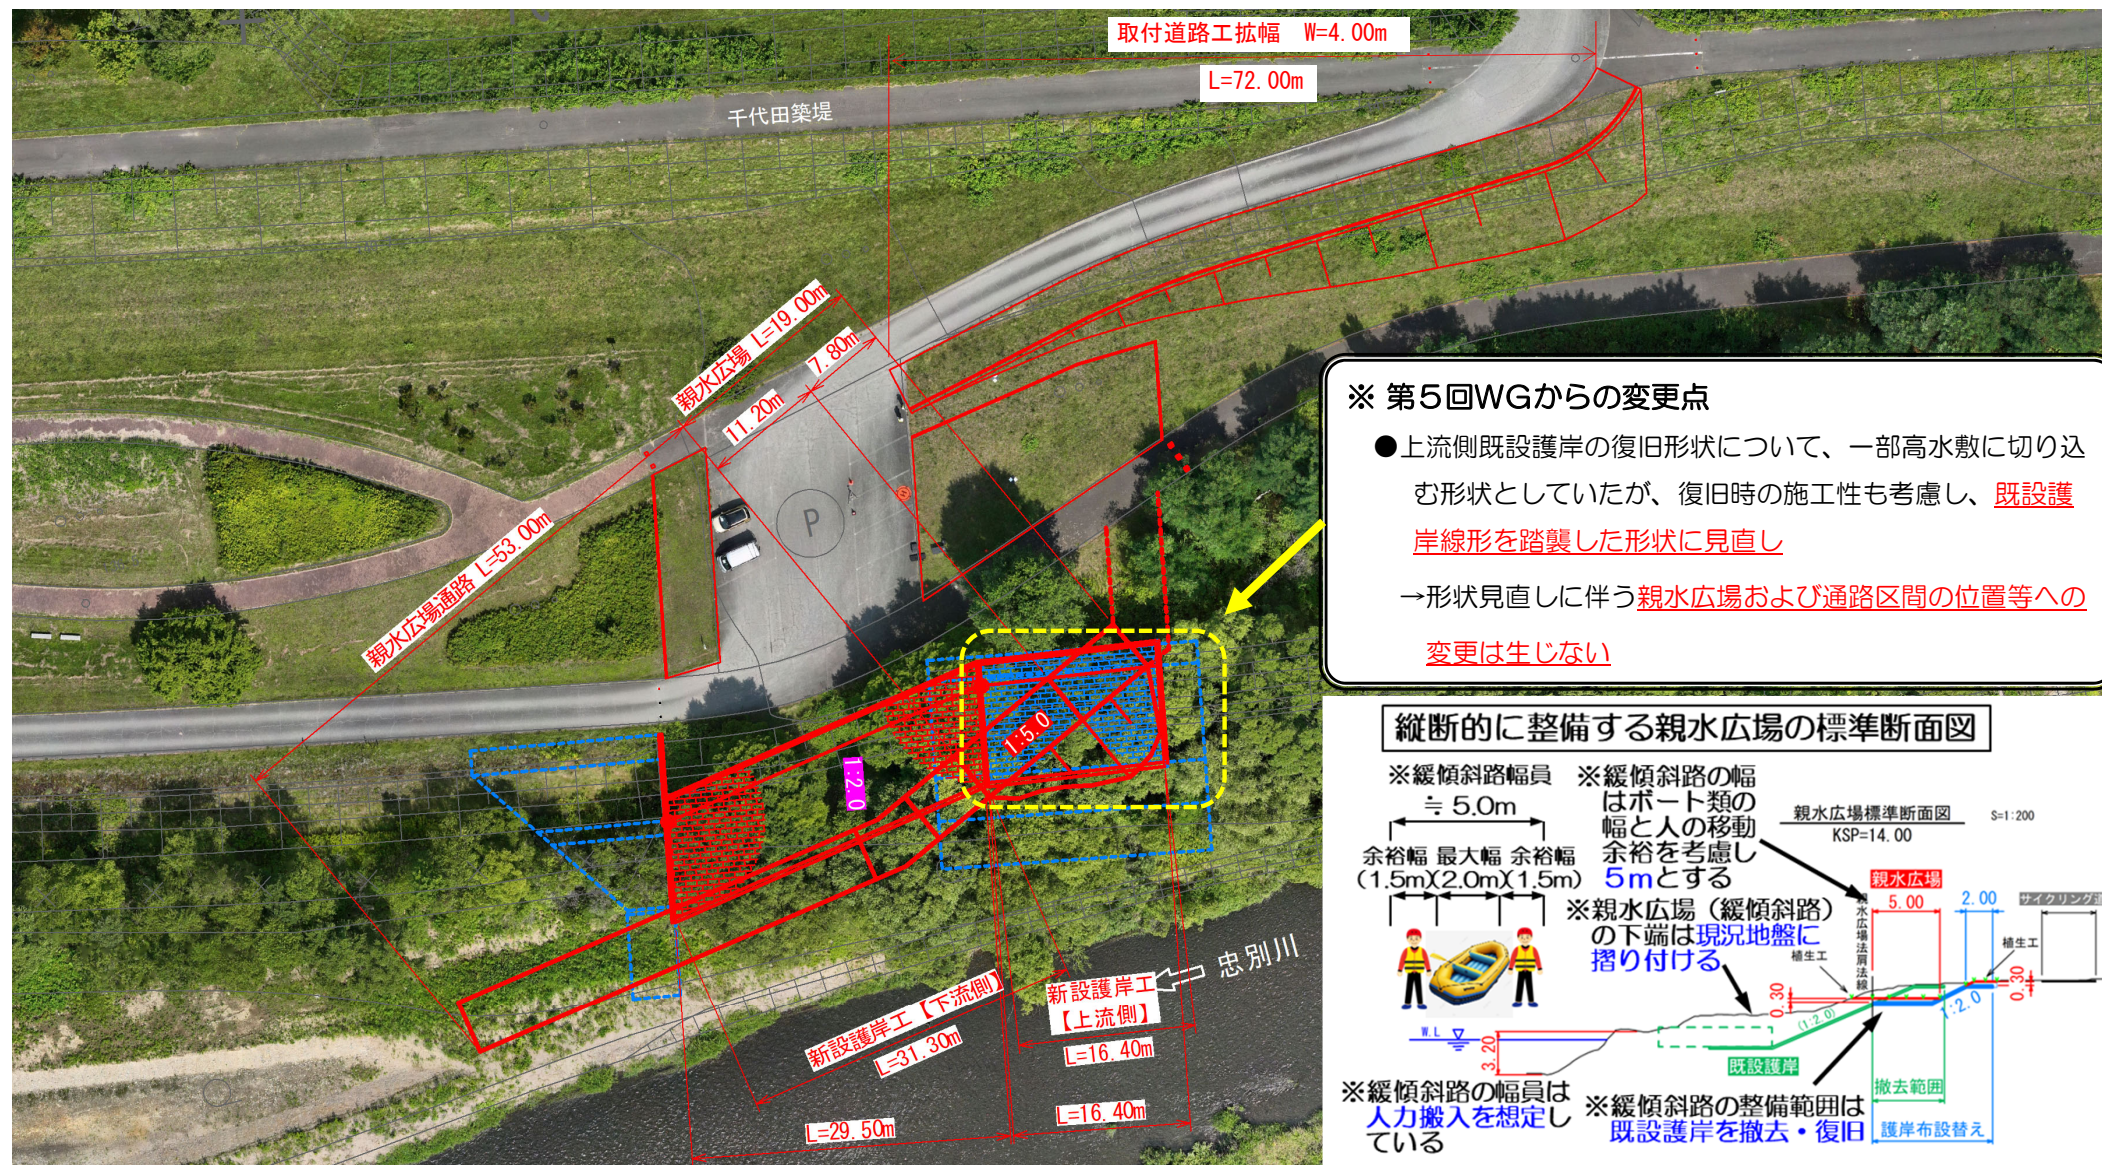

①-2 整備に伴う樹木伐採範囲

◆右岸側の親水広場整備と護岸整備に伴う樹木伐採範囲について

ツインハープ橋上流箇所で開催する右岸側の親水広場（緩傾斜路）および護岸撤去・再設置に伴う既存樹木の伐採範囲（面積）は、図示のとおり「 $\Sigma A = 1,555\text{m}^2$ 」となる。

※ 第4回WGを踏まえた既存樹木の伐採方針


- 極力、樹木は伐採しないことを念頭に、伐採する場合は最小限の範囲とする

→ 親水広場整備範囲と護岸撤去・再設置範囲のみ伐採


※ 第5回WGからの変更点

- 護岸形状の見直しに伴う精査の結果、伐採面積が変更

→ 「 $\Sigma A = 1,756\text{m}^2$ 」 → 「 $\Sigma A = 1,555\text{m}^2$ 」

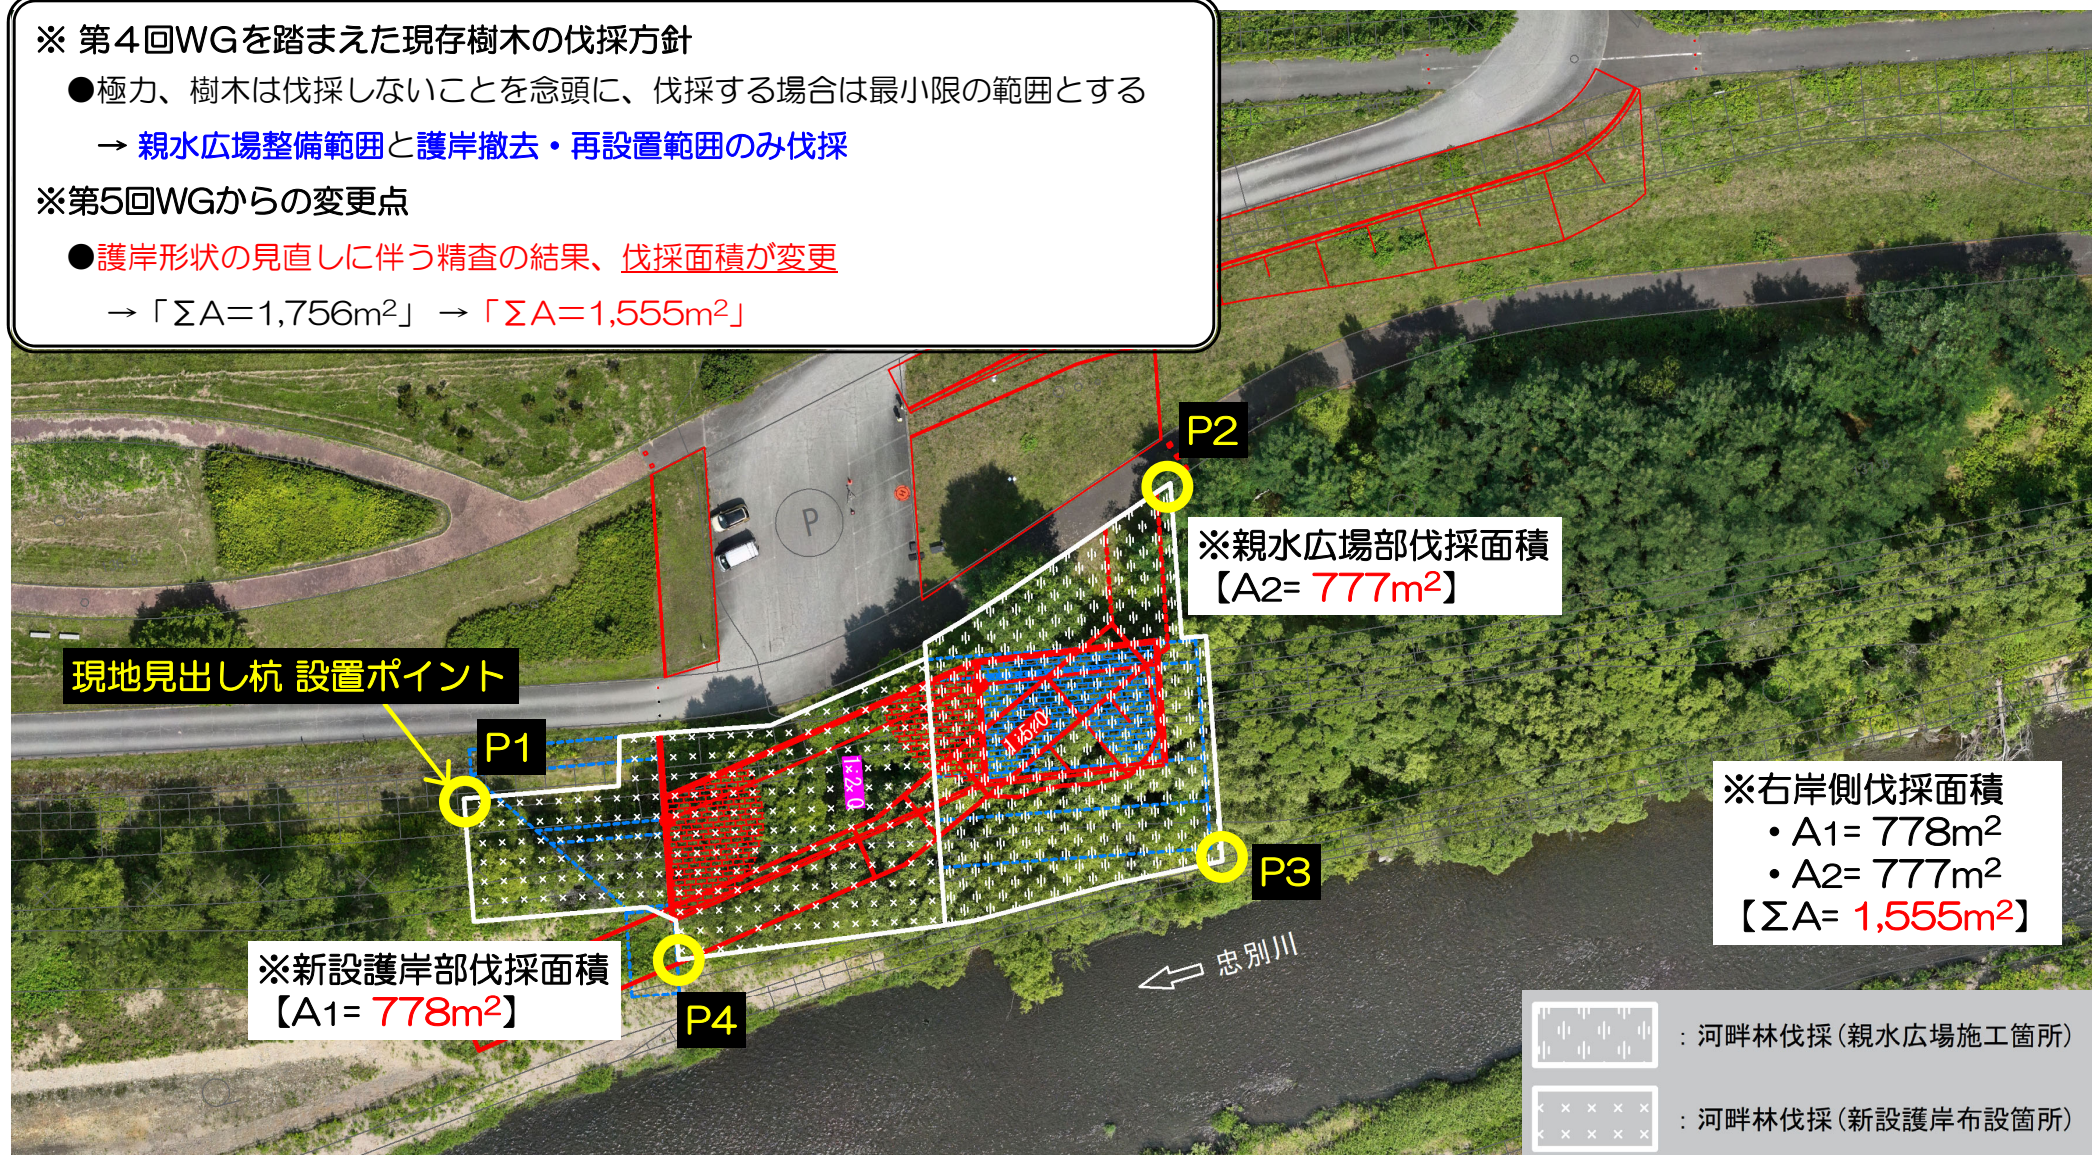


①-3 整備イメージ

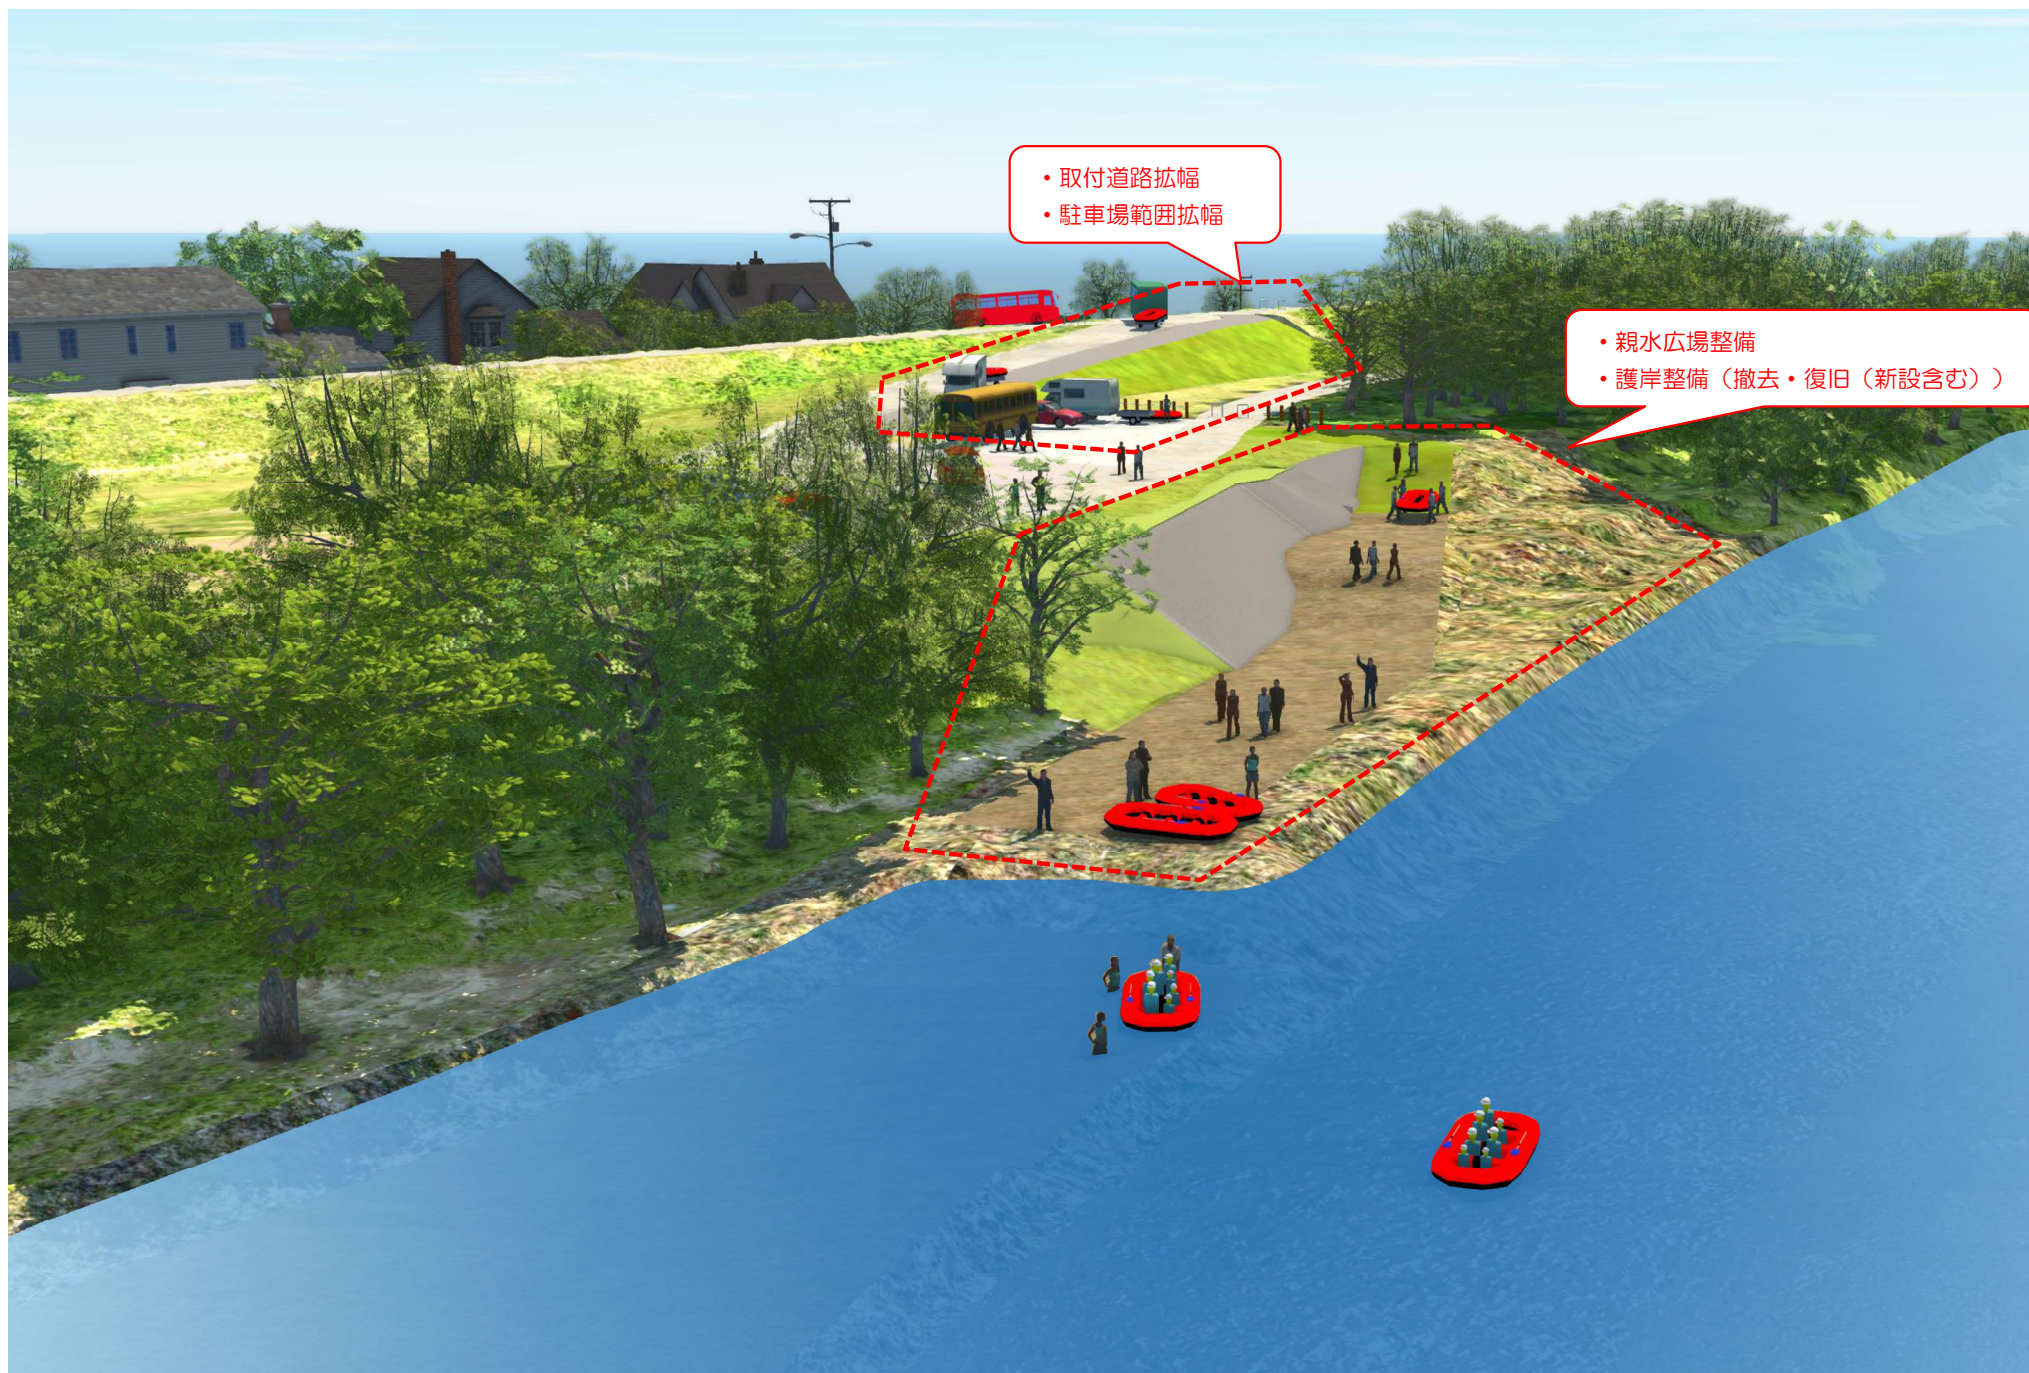

② 神樂岡公園整備箇所

②-1 整備箇所概要(左岸親水広場/右岸河道整治)

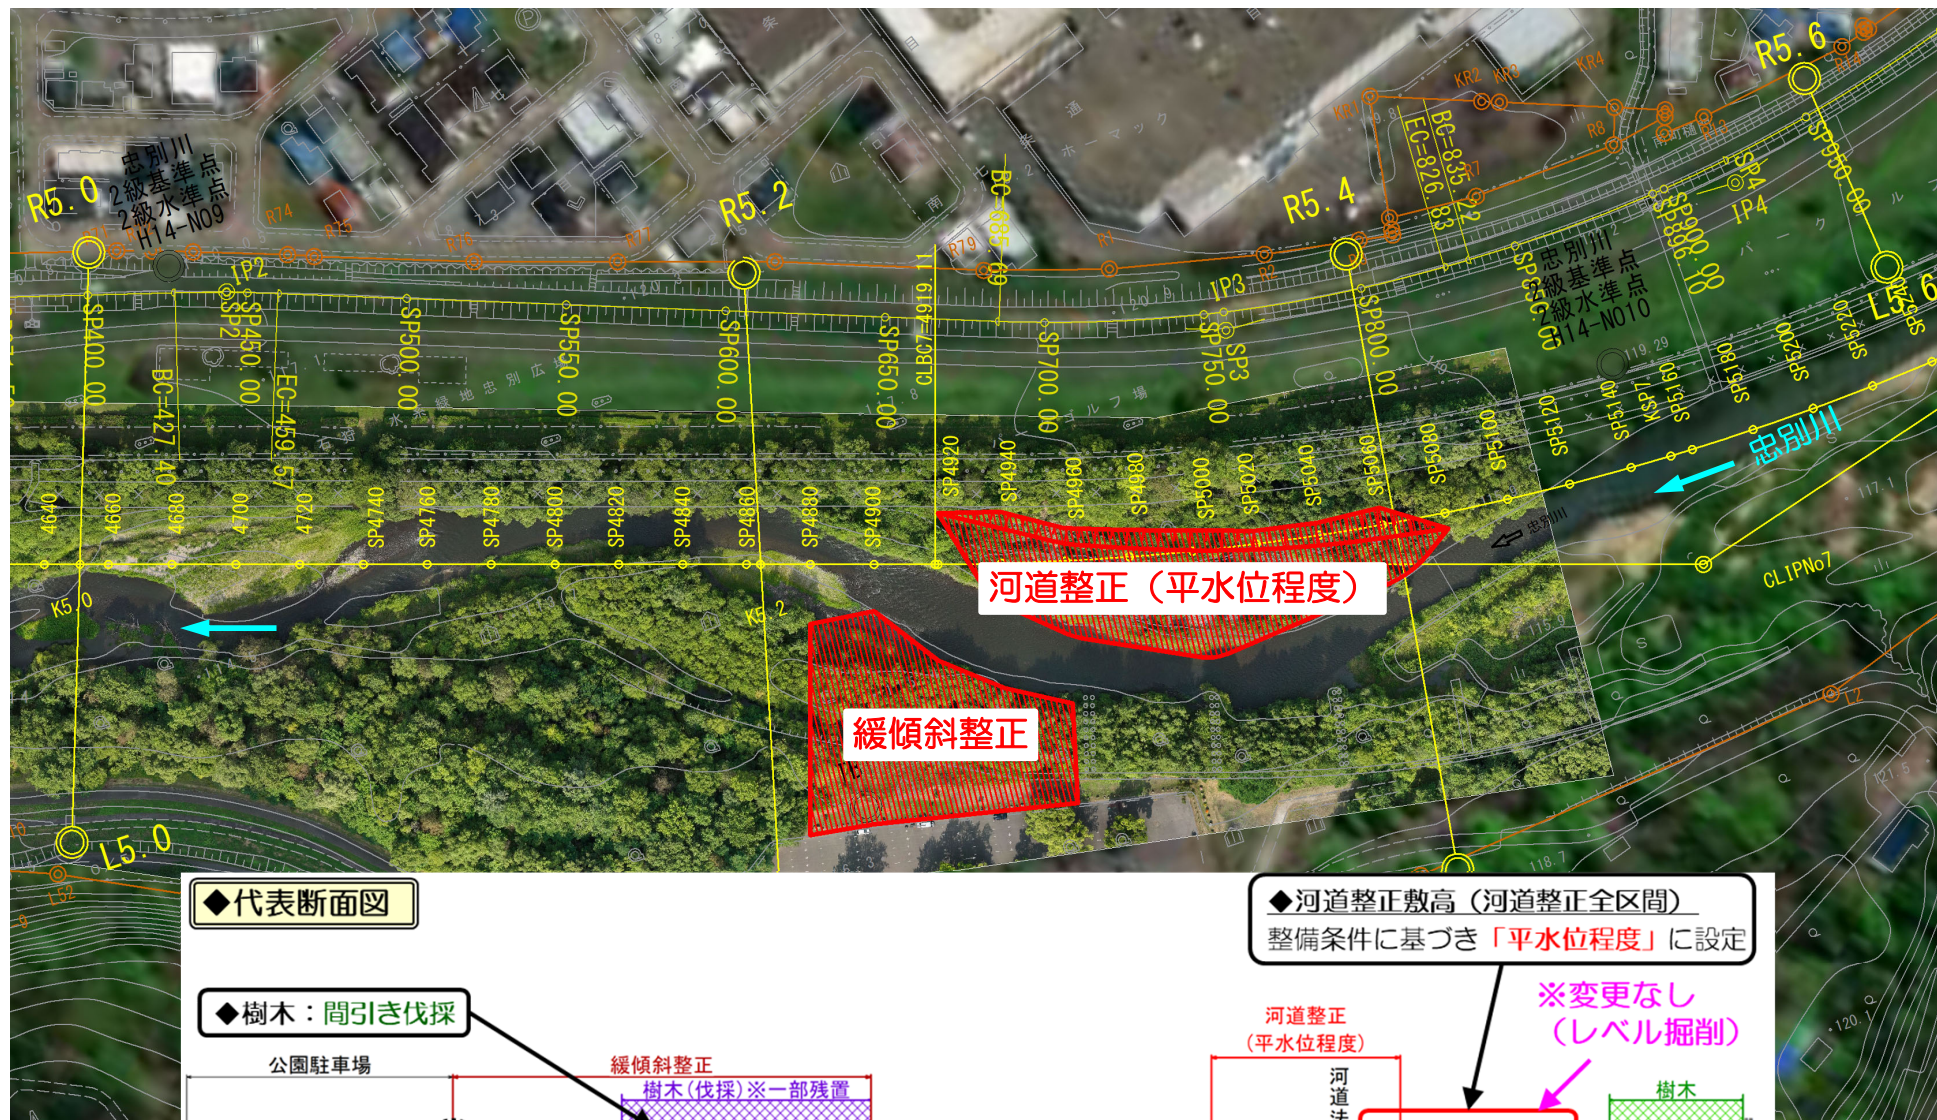

◆代表断面図

◆樹木：間引き伐採

公園駐車場

緩傾斜部

緩傾斜部
樹木(伐採)※一部残置

▽平水位

平場部
10.00m

50.00m
(維持可能な河床幅)

河道法線

掘削高=平水位程度

※変更なし
(レベル掘削)

樹木

◆緩傾斜部整正敷高

堤内側の平場端部より「駐車場端部(縁石端部)まで現地盤高程度」に設定(緑化を図る)

※平場整備範囲を「10m」程度まで広げて、遠浅な空間を創出する計画に変更

◆河道整正敷高(河道整正全区間)

整備条件に基づき「平水位程度」に設定

河道整正
(平水位程度)

河道法線

掘削高=平水位程度

◆河道整正敷幅

整備条件に基づき「50m」に設定


②-2 整備に伴う樹木伐採範囲

◆左岸側の親水広場整備と右岸側の河道整正に伴う樹木伐採範囲について

神楽岡公園箇所で整備する左岸側の親水広場（緩傾斜整正）および右岸側の河道整正に伴う既存樹木の伐採範囲（面積）は図示のとおり、左岸側が「 $A=2,443\text{m}^2$ 」となり、右岸側が「 $\Sigma A=1,610\text{m}^2$ 」となる。



②-3 整備イメージ

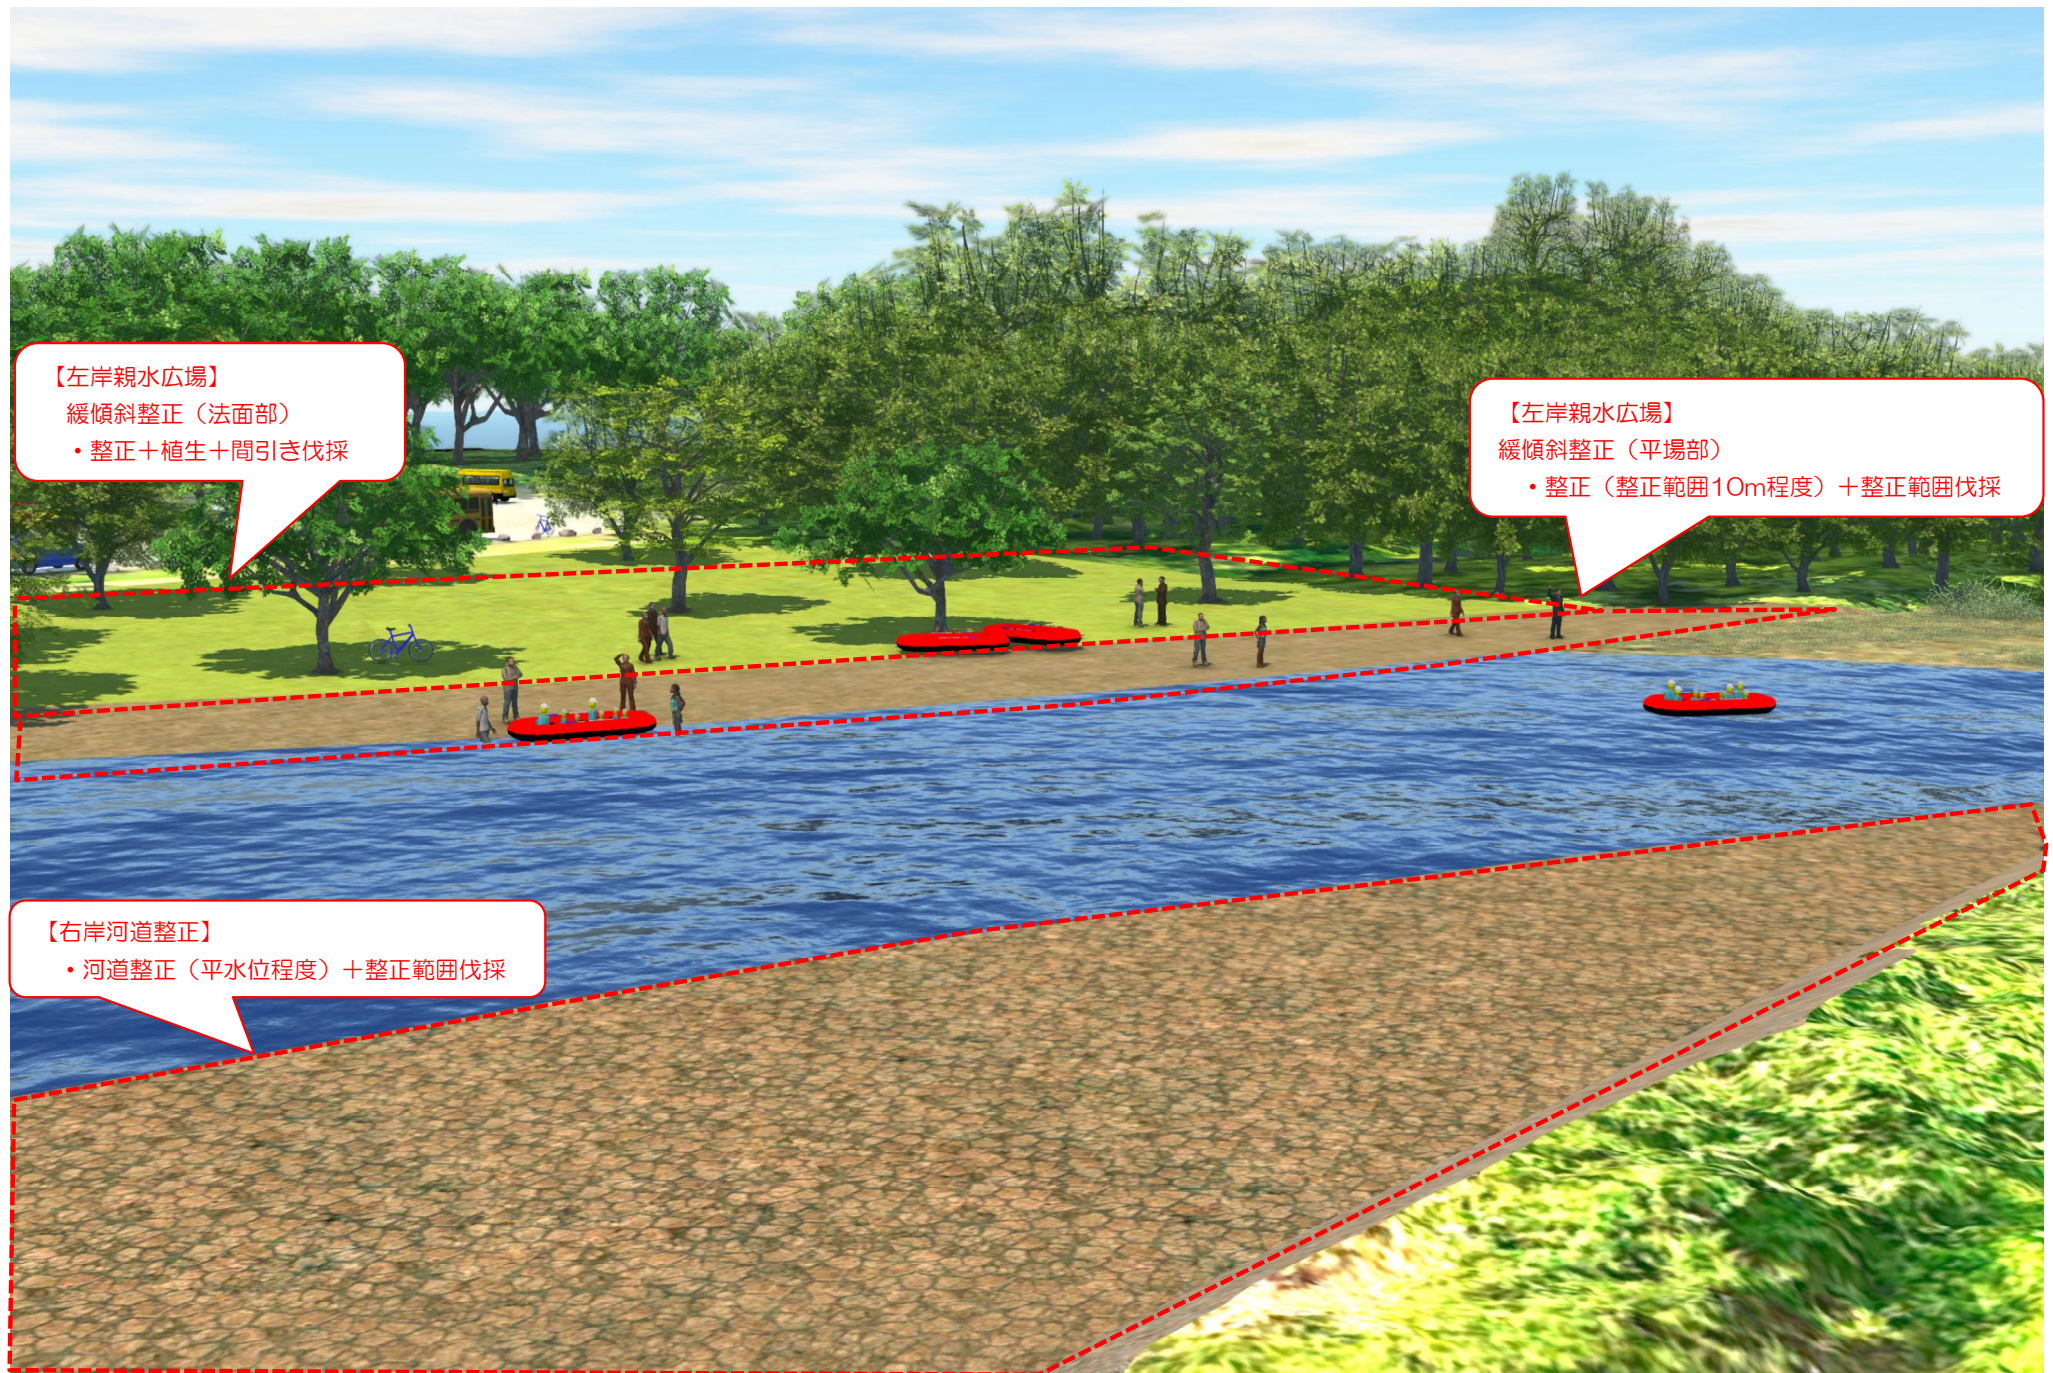

③ JR旭川駅南口整備箇所

③-1 整備箇所概要(右岸親水広場/左岸河道整治)

【整備方針】

旭川駅南口箇所における施設整備方針を、以下に示す。


- SP0(下流端)～SP180区間を目安に、伐木・除根を行う(必要により整地)
- SP180～SP500区間を目安に、河道整治を行う
- SP500～SP620区間を目安に、伐木・除根を行う(必要により整地)

【河道整治等の基本方針】


河道整治等の河道内で行う工事については、
サケの産卵時期に差し掛かる8月までに完了させる



旭川駅南口箇所では整備する右岸側の河道整正に伴う既存樹木の伐採範囲（面積）については、図示のとおり「 $\Sigma A = 8,955\text{m}^2$ 」となる。


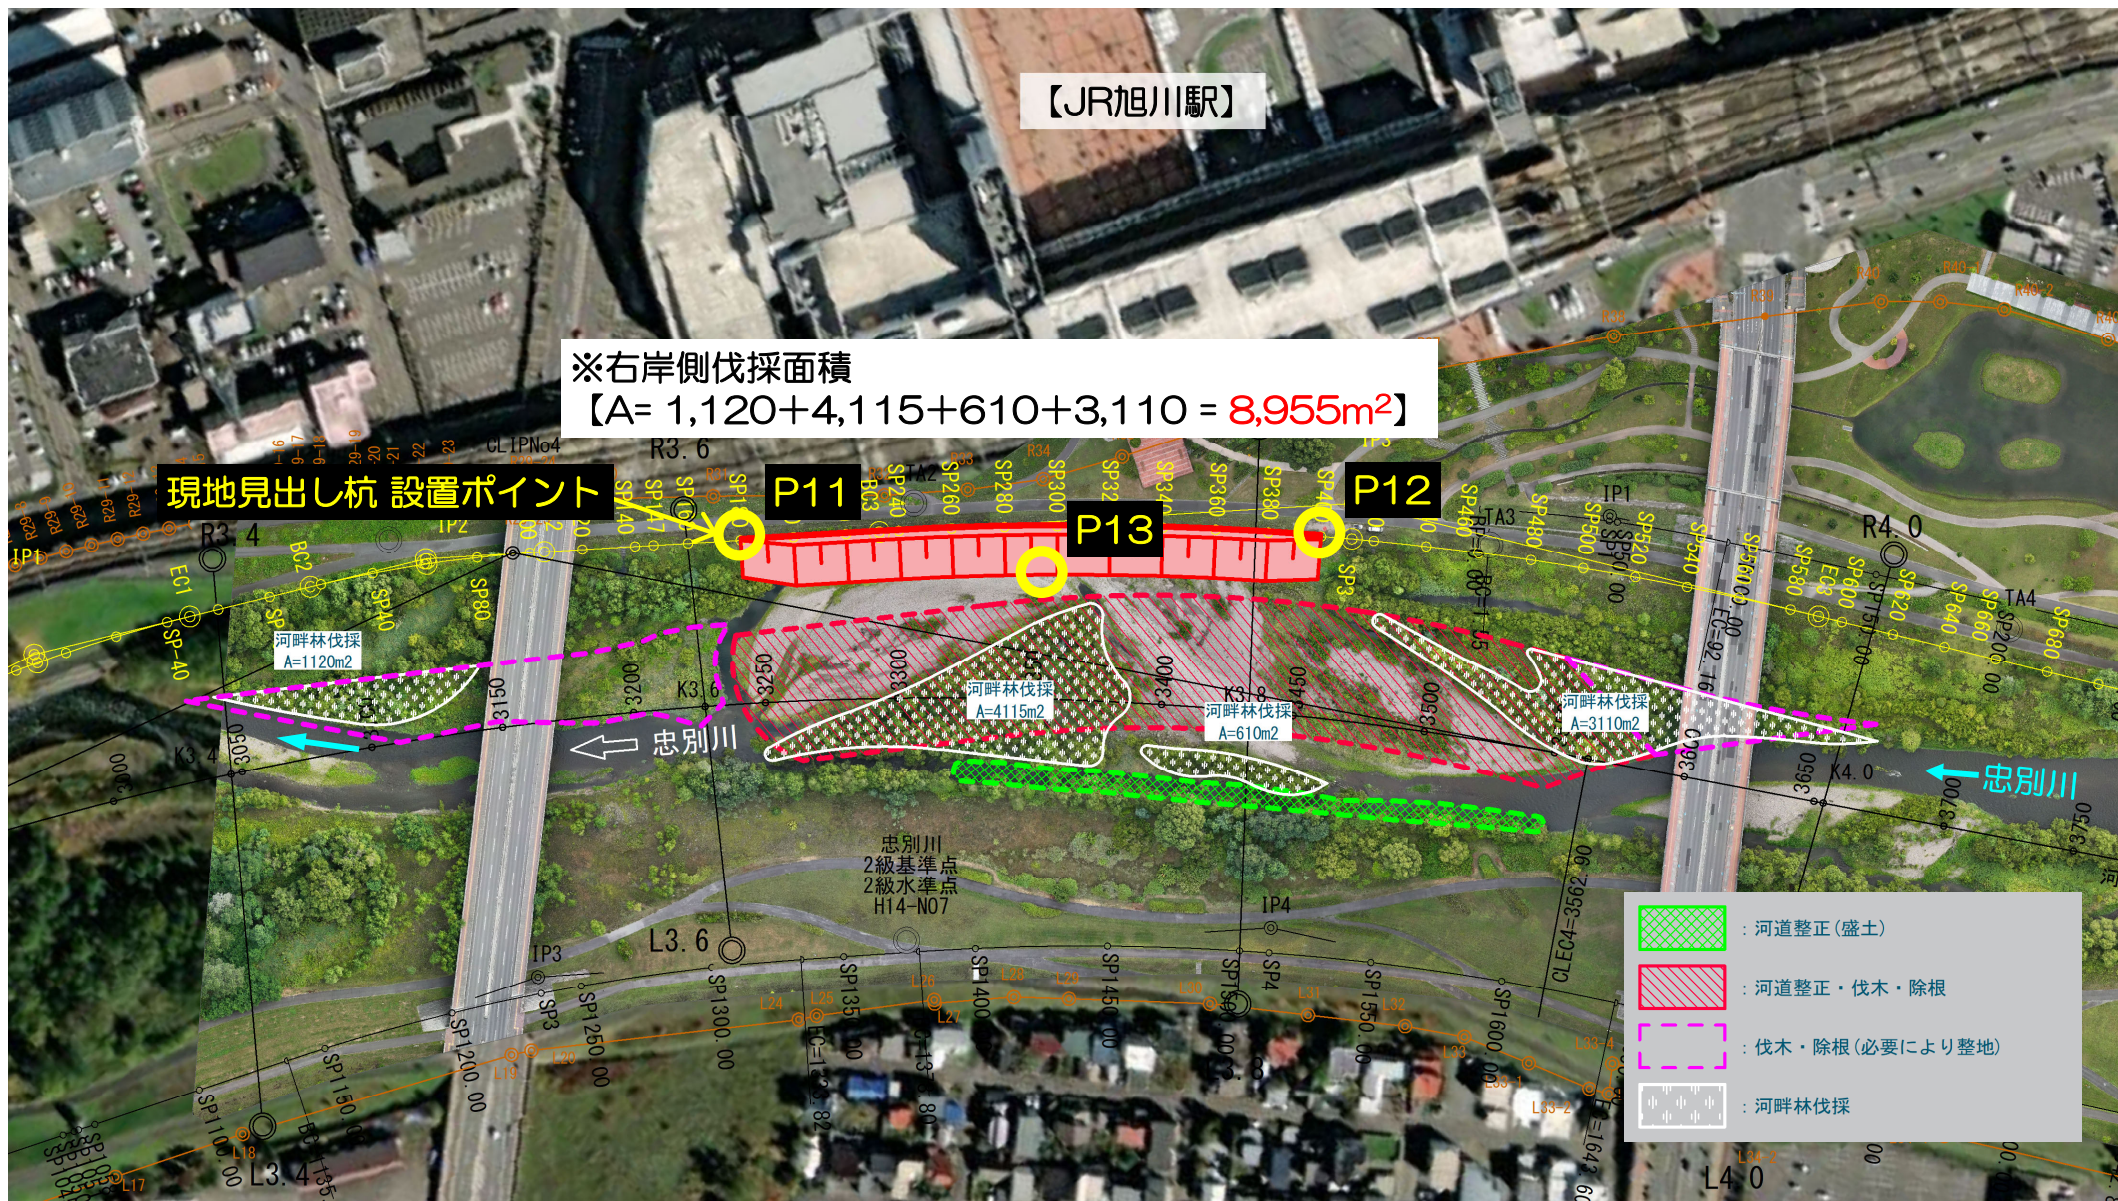


③-3 整備イメージ

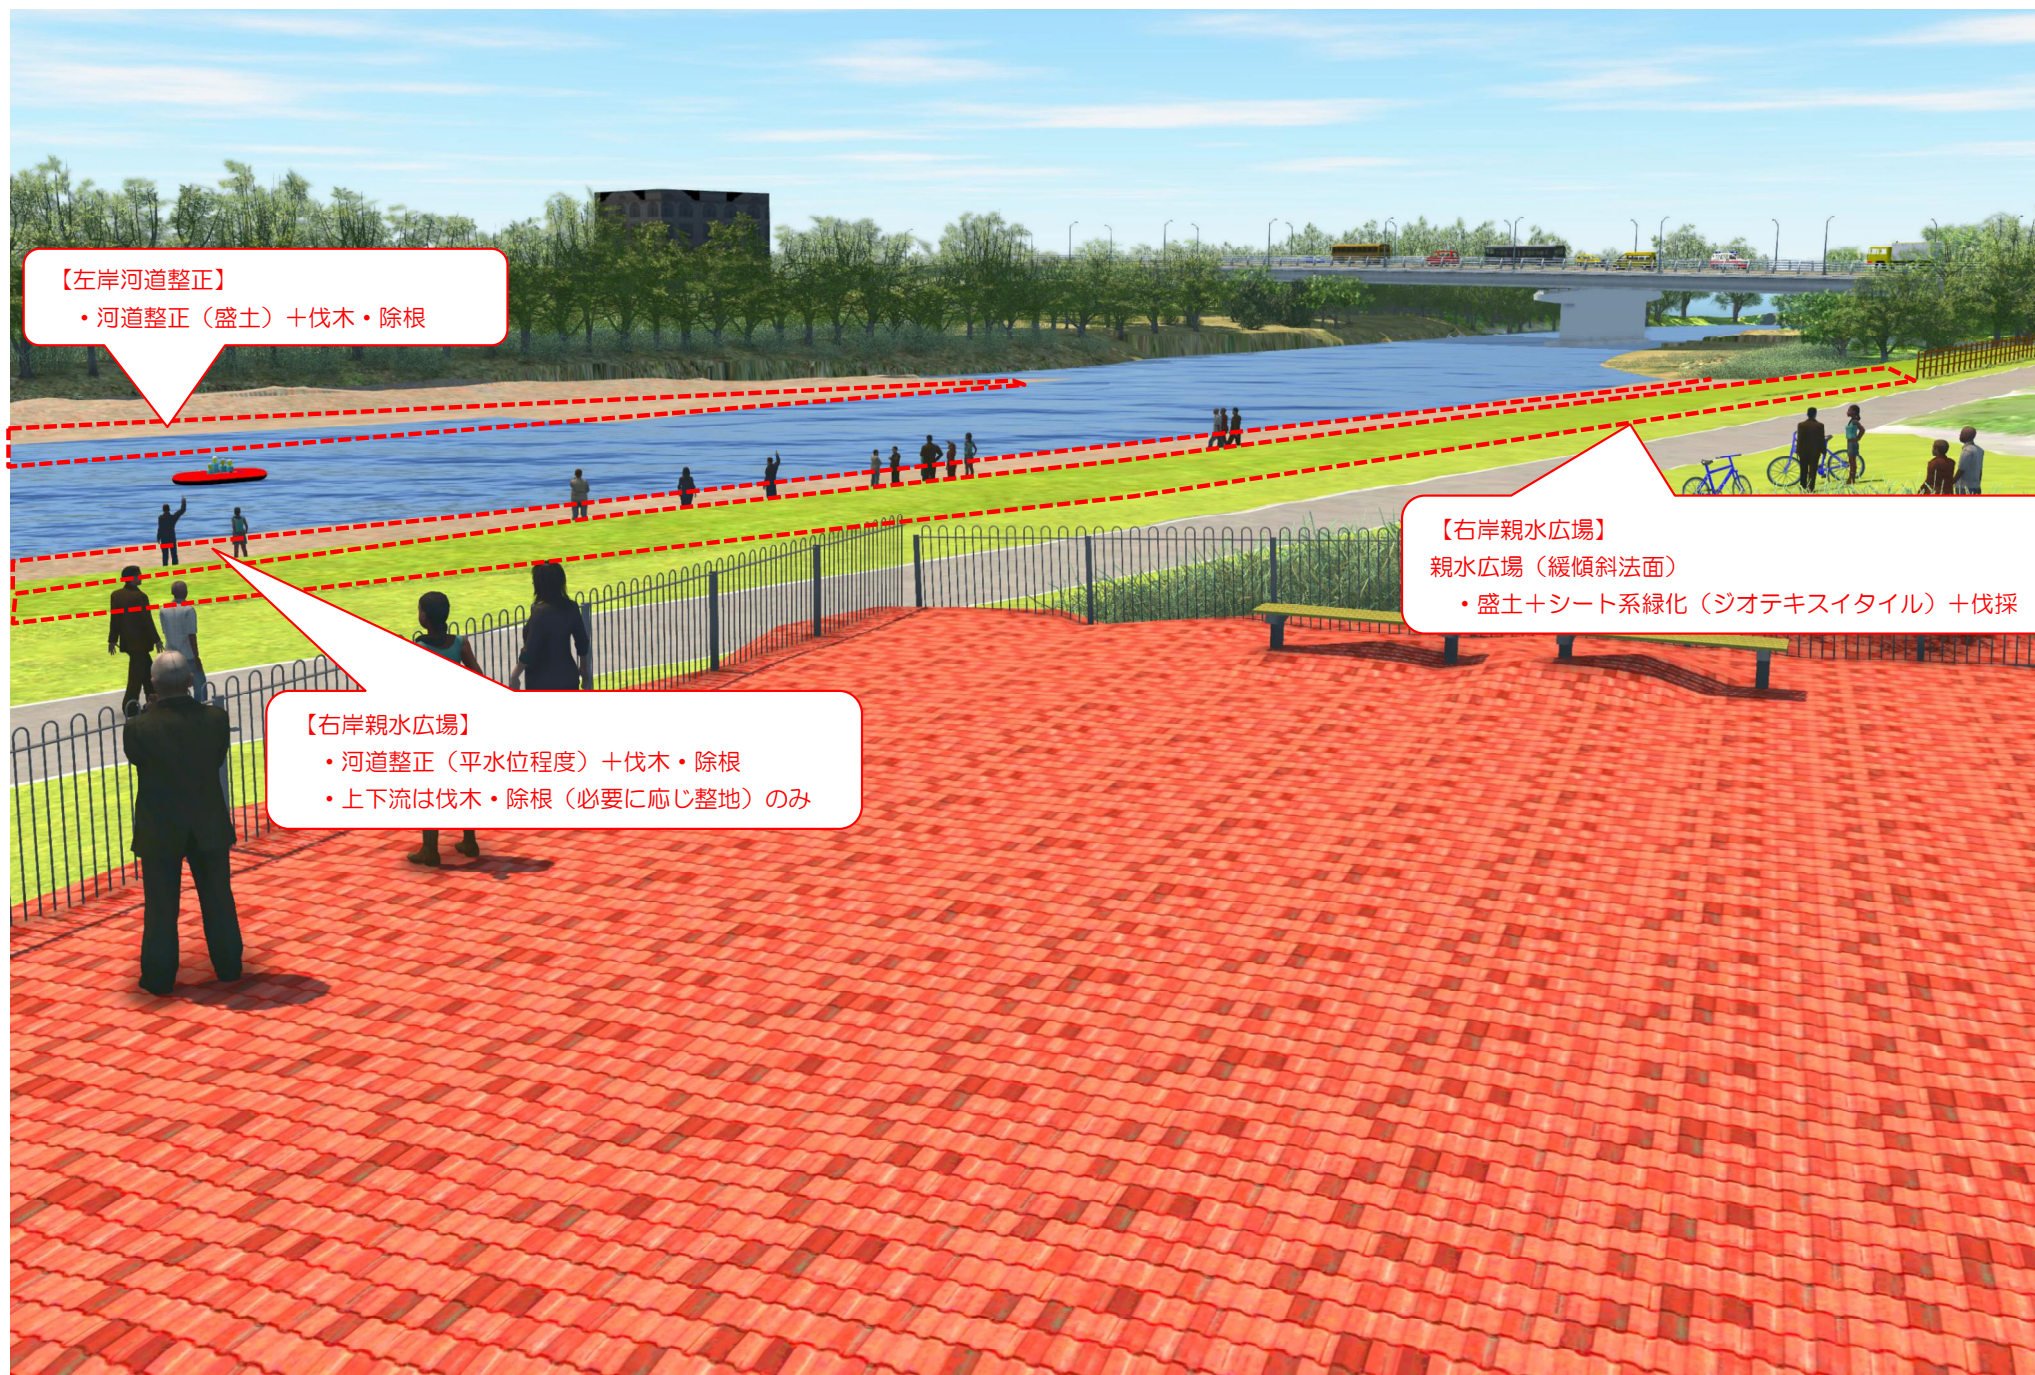


④牛朱別川左岸整備箇所

④-1 整備箇所概要(牛朱別川左岸側帯)


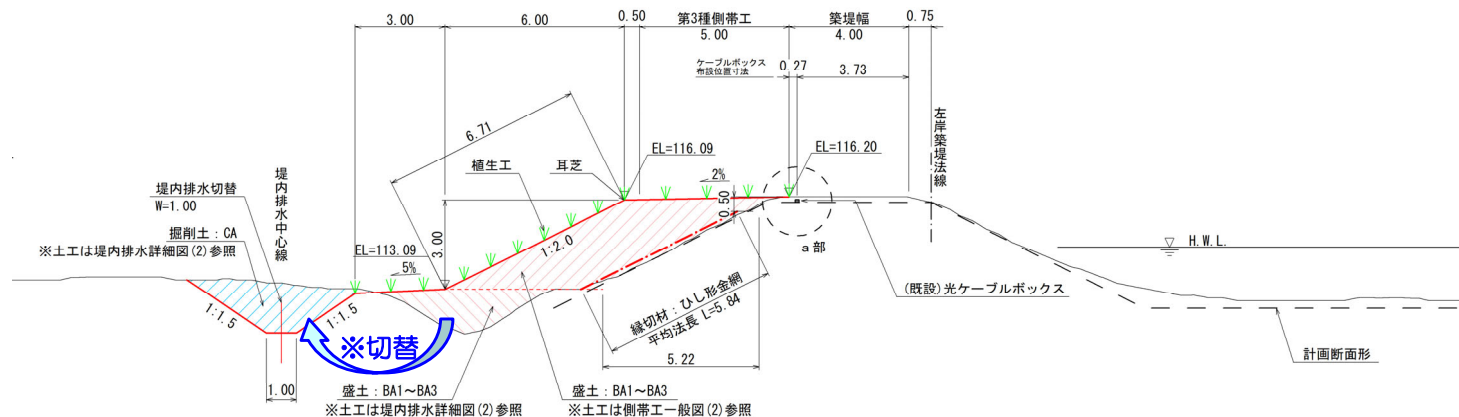
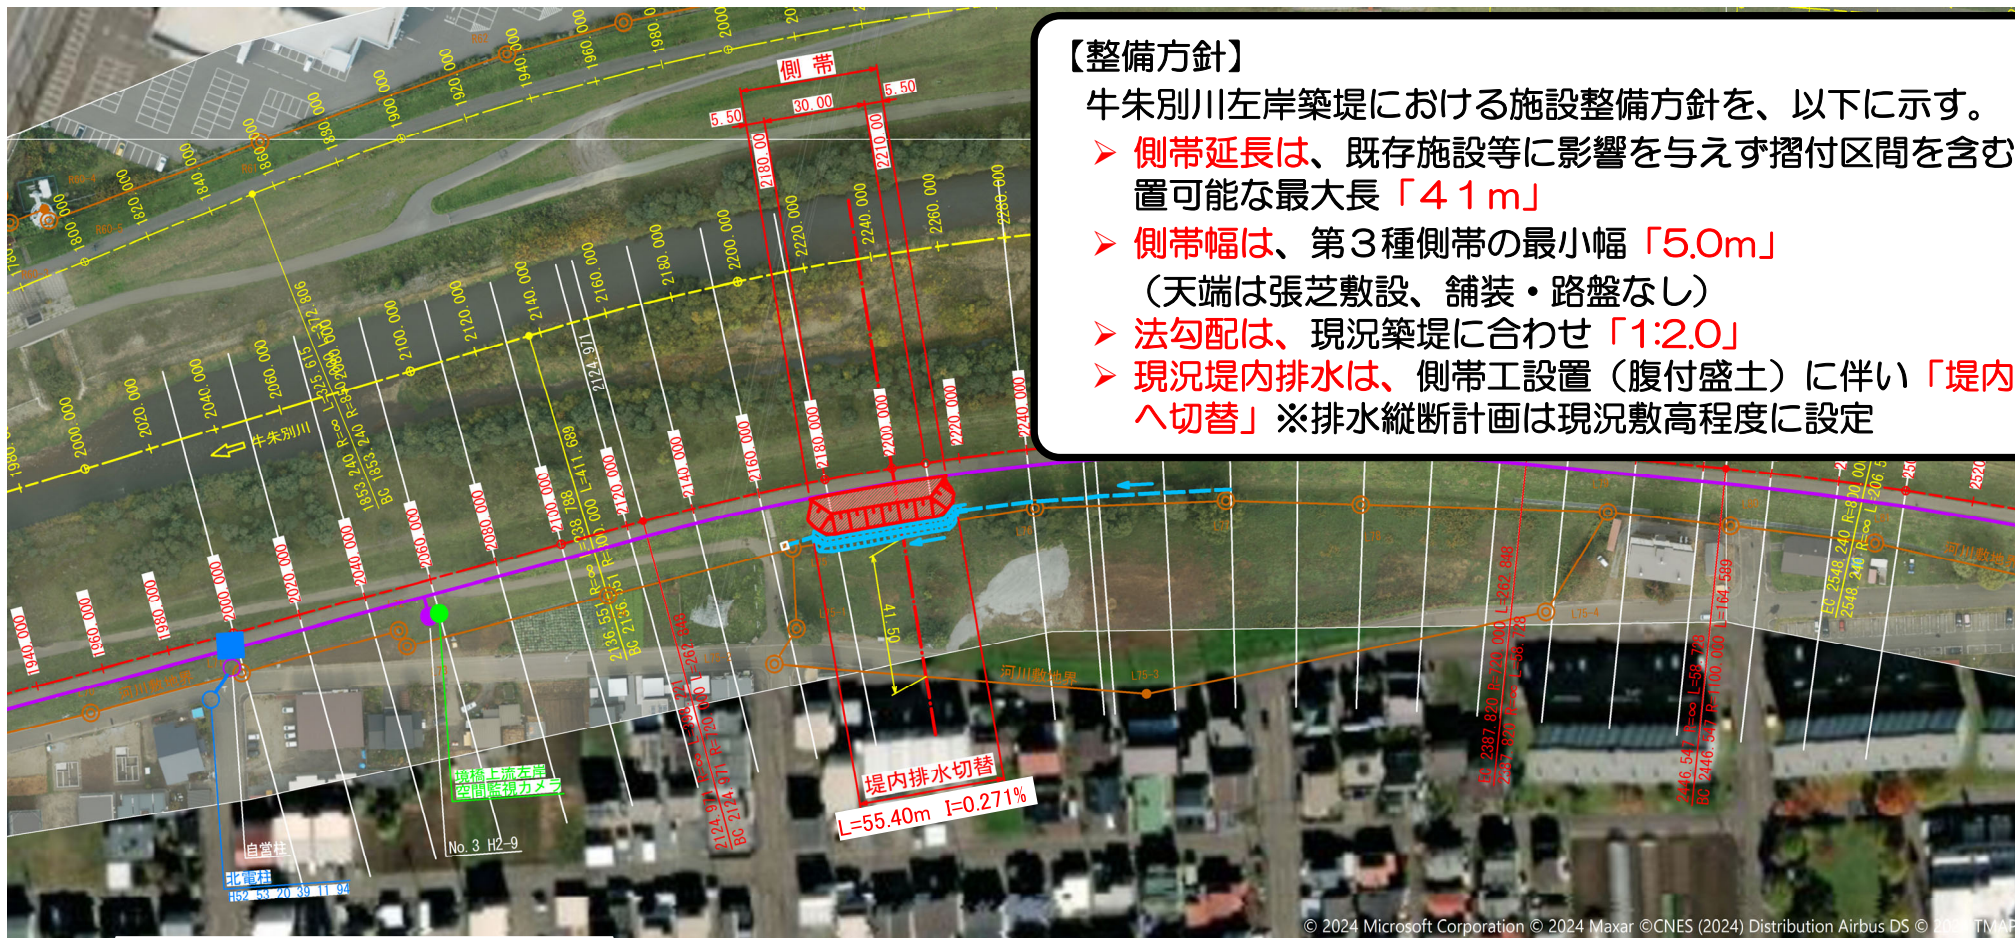


④-2 整備イメージ

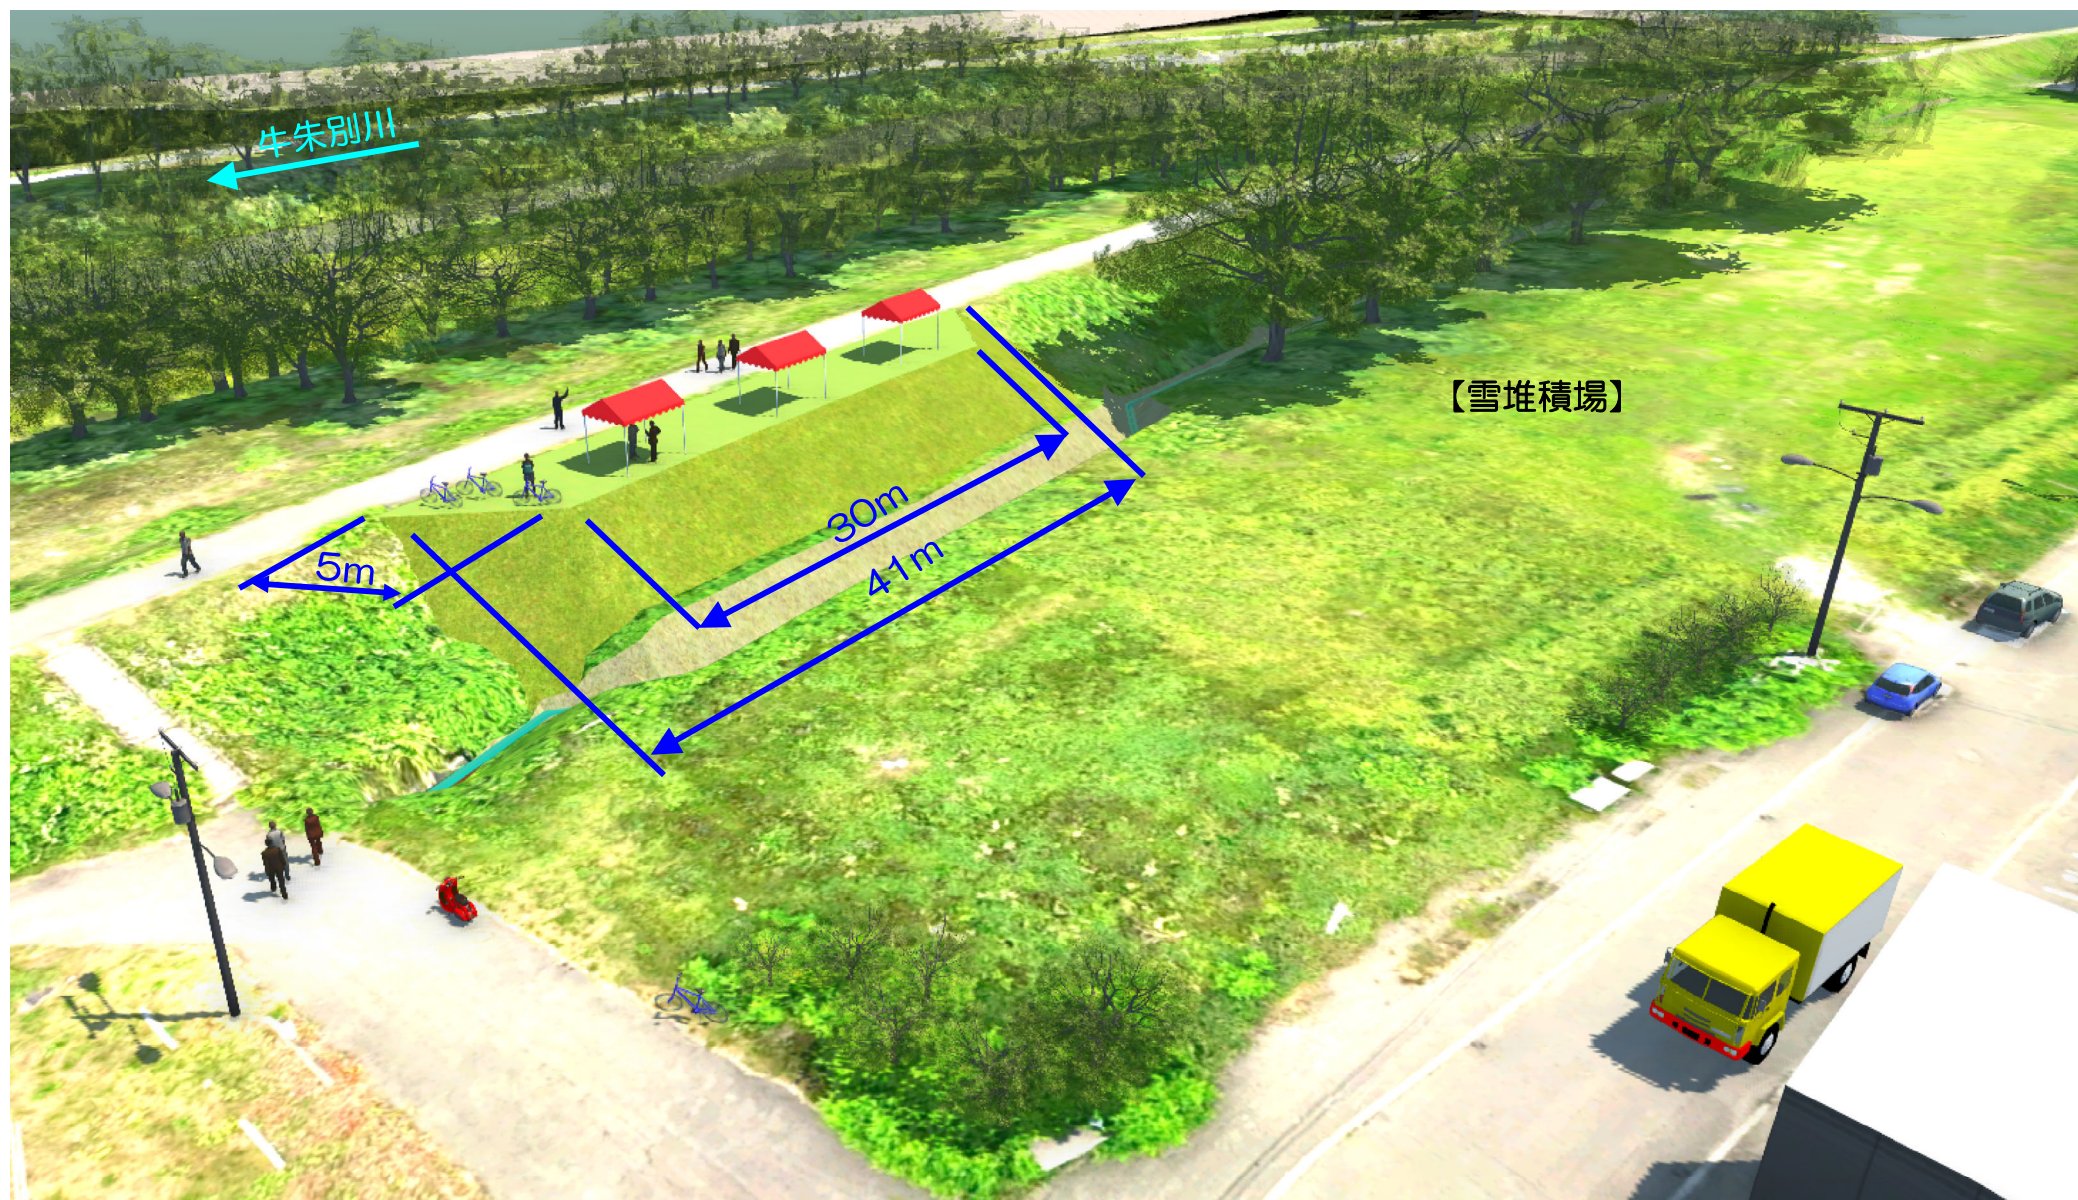

ハード整備について(市:路面標示)


路面標示のデザインと標示の位置①

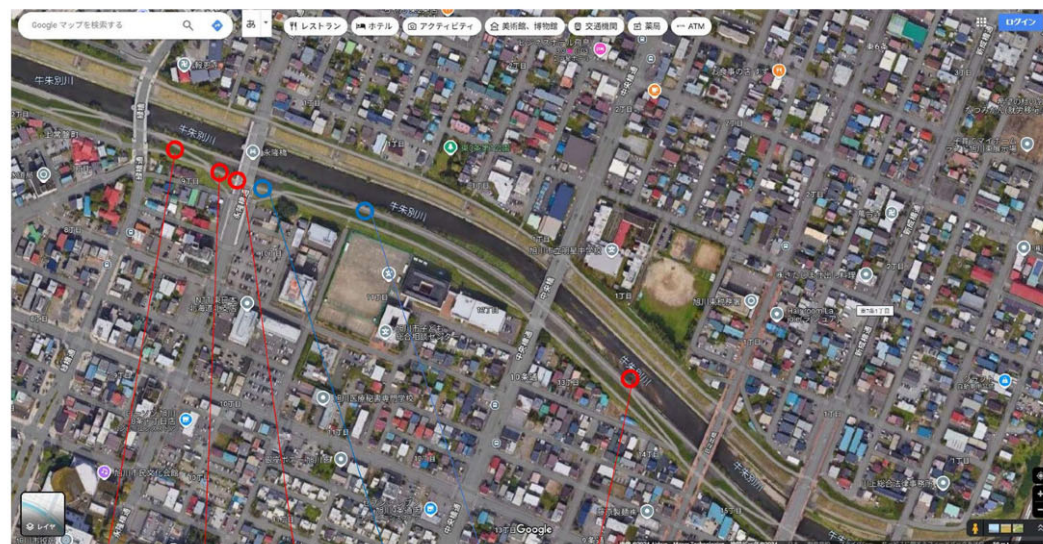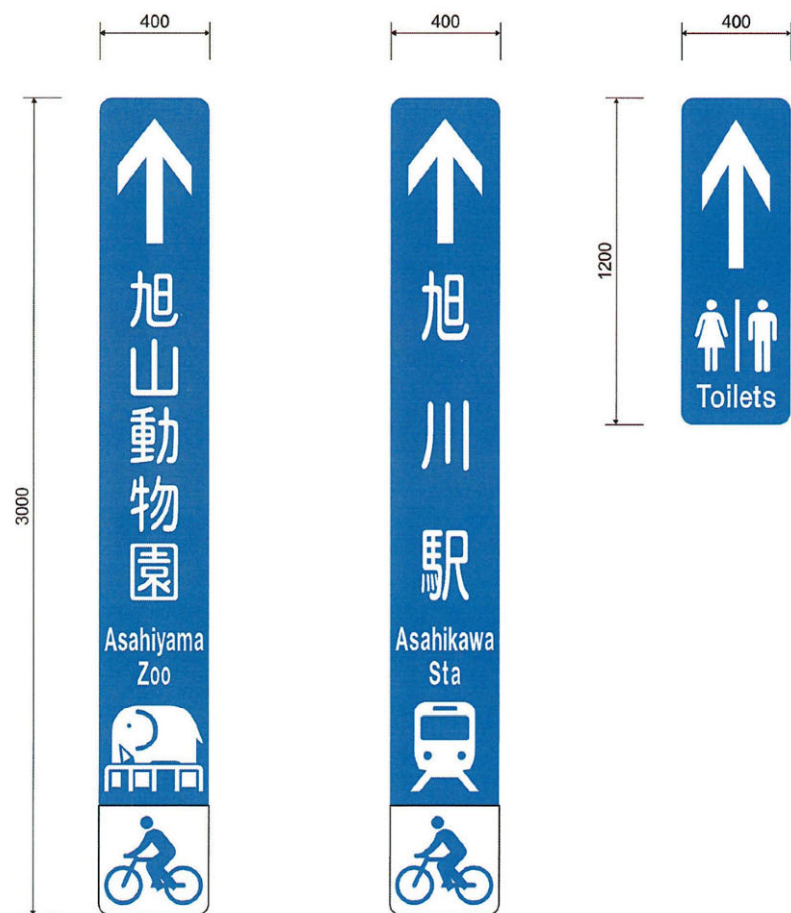

赤 (動物園行) 9
 青 (駅行) 12
 黄 (トイレ) 2
 計 23 (国 2 1 市 2)

ハード整備について(市:路面標示)

標示の位置②

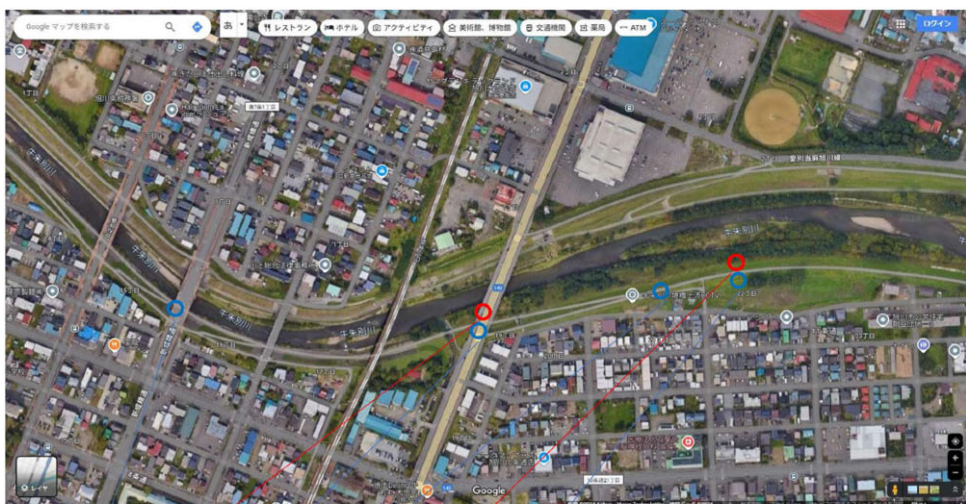


↑	↑	↑	↗	↑	↑
駅	動物園	駅	駅	動物園	駅
7	8	9	10	11	12
国	国	国	国	国	国



↑	↑	↑	↗	↻
駅	動物園	駅	トイレ	トイレ
13	14	15	16	17
国	国	国	国	国

ハード整備について(市:路面標示)

標示の位置③



【今後のスケジュール】

- 6月 工事発注・契約
- 7月 工事開始
- 8月 工事完了
- 10月 かわまちWG 現地確認

ソフト事業について

事業名	事業内容	実施時期	実施主体	実施場所
「あさひかわ子どもの水辺」サケの稚魚放流	サケの生態説明、サケの稚魚放流	4/12	あさひかわ子どもの水辺協議会 (事務局:旭川市土木部公園みどり課)	
科学館クラブ(いきもの地球クラブ)	ウグイ・フクドジョウなどの捕獲と観察	5/24, 25	旭川市科学館	忠別川(神楽橋付近)
野外活動「河原で石拾い」	様々な種類の転石を拾って観察	5/31	旭川市科学館	雨紛川(雨紛橋付近)
地学体験バスツアー	「神居古潭氈穴群」「魔人の頭」などの見学	6/1	旭川市科学館	石狩川(神居大橋付近)
科学館クラブ(いきもの地球クラブ)	トンボの幼虫「ヤゴ」の捕獲と観察	6/7, 8	旭川市科学館	伊野川支流(カムイの杜公園付近)
「あさひかわ子どもの水辺」水辺体験講習会	安全講習、川の生き物観察	6/14	あさひかわ子どもの水辺協議会 (事務局:旭川市土木部公園みどり課)	カムイの杜公園近くの伊野川
まちなかアクティビティinADW	北彩都ガーデン 鏡池周辺でのアクティビティ(カヌー、SUP、乗馬、ボディコンパット、e-bikeレンタル、ワークショップ等)	6/21, 22	大雪カムイミニタラDMO	あさひかわ北彩都ガーデン
「あさひかわ子どもの水辺」親水体験イベント 『川に学ぼう』	川下り、安全講習、川の生き物観察、防災講座	6/28	あさひかわ子どもの水辺協議会 (事務局:旭川市土木部公園みどり課)	旭橋下流左岸広場
かわまちフェス	音楽・ダンスフェス、フードトラック、水辺で乾杯	7/5	ミズベリング旭川	旭川駅南口及び北彩都ガーデン
「あさひかわ子どもの水辺」 川の指導者育成学習会	川下り、安全講習	7/12	あさひかわ子どもの水辺協議会 (事務局:旭川市土木部公園みどり課)	旭橋下流左岸広場ほか
野外活動「水辺の生きもの観察」	水生昆虫の観察	7/12	旭川市科学館	忠別川(神楽橋付近)
第3回100kmサイクリングin旭川 併設開催 第69回全国サイクリング大会、 第63回全道サイクリング大会	かわのまち旭川を走ろう(忠別川、忠別ダム、永山新川、石狩川、北彩都をめぐるサイクリング)	7/27	旭川サイクリング協会 共催:日本サイクリング協会、北海道サイクリング協会	旭川市リベラインパーク・コミュニティランド(旭橋左岸公園駐車場)
サケ案内人養成講座	座学講座	8月	大雪と石狩の自然を守る会	神楽公民館他
「あさひかわ子どもの水辺」 石ころアート体験	河原の石にペイント	8月中旬	あさひかわ子どもの水辺協議会 (事務局:旭川市土木部公園みどり課)	カムイの杜公園近くの伊野川(予定)
サケを迎える(カムイチュブノミ)	伝統儀式	9月	大雪と石狩の自然を守る会	旭橋下流左岸(R6実施場所)
第17回旭川ハーフマラソン	ハーフマラソン、10kmコース、2.5kmコースを実施	9/28	市	大雪アリーナ(スタート&ゴール)
野外活動「旭川層の観察」	河床の砂礫層「旭川層」を観察	10月中旬	旭川市科学館	石狩川(秋月橋付近)
野外活動「シロザケの産卵行動」	シロザケの産卵行動を観察	10月中旬	旭川市科学館	忠別川(未定)
サケのゆりかごづくり(人工産卵床づくり)・ 発卵眼埋設	サケの産卵床づくり	11, 12月	大雪と石狩の自然を守る会	
野外活動「冬の自然観察」	スノーシューで忠別川沿いを散策	1/24	旭川市科学館	忠別川(神楽橋～富良野線高架付近)
北彩都歩くスキーコース	歩くスキーコースの設置	1月中旬～3月中旬	市	北彩都
サケ出発式(カムイノミ)	サケの稚魚放流	3月	大雪と石狩の自然を守る会	旭橋下流左岸(R6実施場所)
旭川観光レンタサイクル	自転車のレンタル(シティサイクル、クロスバイク、電動アシスト自転車等)	4/29～10/31	旭川観光物産情報センター (アクティビティセンター旭川駅)	
川のまち旭川 歴史探索マップ	旭川駅周辺、旭川空港周辺の川のまちマップ(データ提供) https://www.atca.jp/kawanomachi/	通年	旭川観光コンベンション協会	

令和7年度における重点的な活動方針

項目	概要	対応
サイクリング	◆サイクリングマップの公開と活用 ◆サイクルステーションの検討	・関連施設にサイクリングマップを掲示する ・見どころのテーマを変えたマップを作成する ・サイクリングコース上にサイクルラックや空気入れ等を試行的に設置する ・アンケートフォームによるサイクルステーションのニーズや効果の検証を行う
アクティビティ	◆イベント・アウトドアの企画と実施 ◆親水広場等の維持管理・運営手法の検討 ◆冬のアクティビティ利用の検討	・親水広場等を活用したイベント等の検討を行う ・親水広場整備後の事業遂行に向けた、持続的な維持管理・運営手法の検討を行う ・冬期間の駅南を活用した取組の検討を行う
環境教育	◆教育機関との連携 ◆水辺事業の紹介	・旭川市立大学と連携し、学生の参画を目指す ・水辺空間を教育の場として活用してもらうため、教育機関への効果的な情報提供について検討する ・まちなかキャンパス等における、学生による水辺事業の紹介について検討する
ICT等を活用した情報提供	◆「かわ」に関する積極的な情報発信	・水辺のイベント等情報をSNSで積極的に発信する ・デジタルサイネージを活用した事業の周知を行う
水辺利用のルール	◆水辺施設における運用ルールの検討	・水辺で行うアクティビティ等の運用ルールの策定について検討する
施設設計	◆親水広場の設計 ◆橋梁表示の設計 ◆案内標識の検討	・神楽岡公園・旭川駅南口の親水広場設計について協議を継続し、基本方針の合意を目指す ・橋梁表示の表示方法や位置等について協議し、基本方針の合意を図る ・案内標識の機能やデザインについて検討する
その他	◆新たな担い手の確保・育成 ◆横の繋がりを意識した活動	・学校等との連携による若い世代の巻き込みを図る ・各種イベントにおいてかわまち情報を掲示する ・各組織のアカウントで他組織の事業を紹介する

（４）推進工程の見直し

推進工程の見直し

○追加項目

- 「親水広場等の維持管理・運用ルールの検討」
「2 忠別川・牛朱別川の水辺空間での新たなイベント・アウトドアの企画
3 冬のアクティビティプランの設定」
「（4）親水広場の活用」のPhase2に追加。
- 「旭川市立大学との連携」
「4 水辺空間を活用した環境教育の推進」
「（3）川に関する人材の登録・育成」のPhase2に追加。
- 「鏡池における清掃活動の実施」
「2 忠別川・牛朱別川の水辺空間での新たなイベント・アウトドアの企画
3 冬のアクティビティプランの設定」
「（2）既存施設の活用」のPhase2に追加。


○修正項目

- 「4 水辺空間を活用した環境教育の推進」
「（2）積極的な周知活動の実施」のPhase2「①かわまちづくりに関するパネル展示等の実施」について、昨年度「川からのまちづくり展」にて実施されたので、その旨修正。

(5) 分科会の設置

分科会の設置について

より専門的な視点から検討を行うため、WGの下部組織として分科会を設置

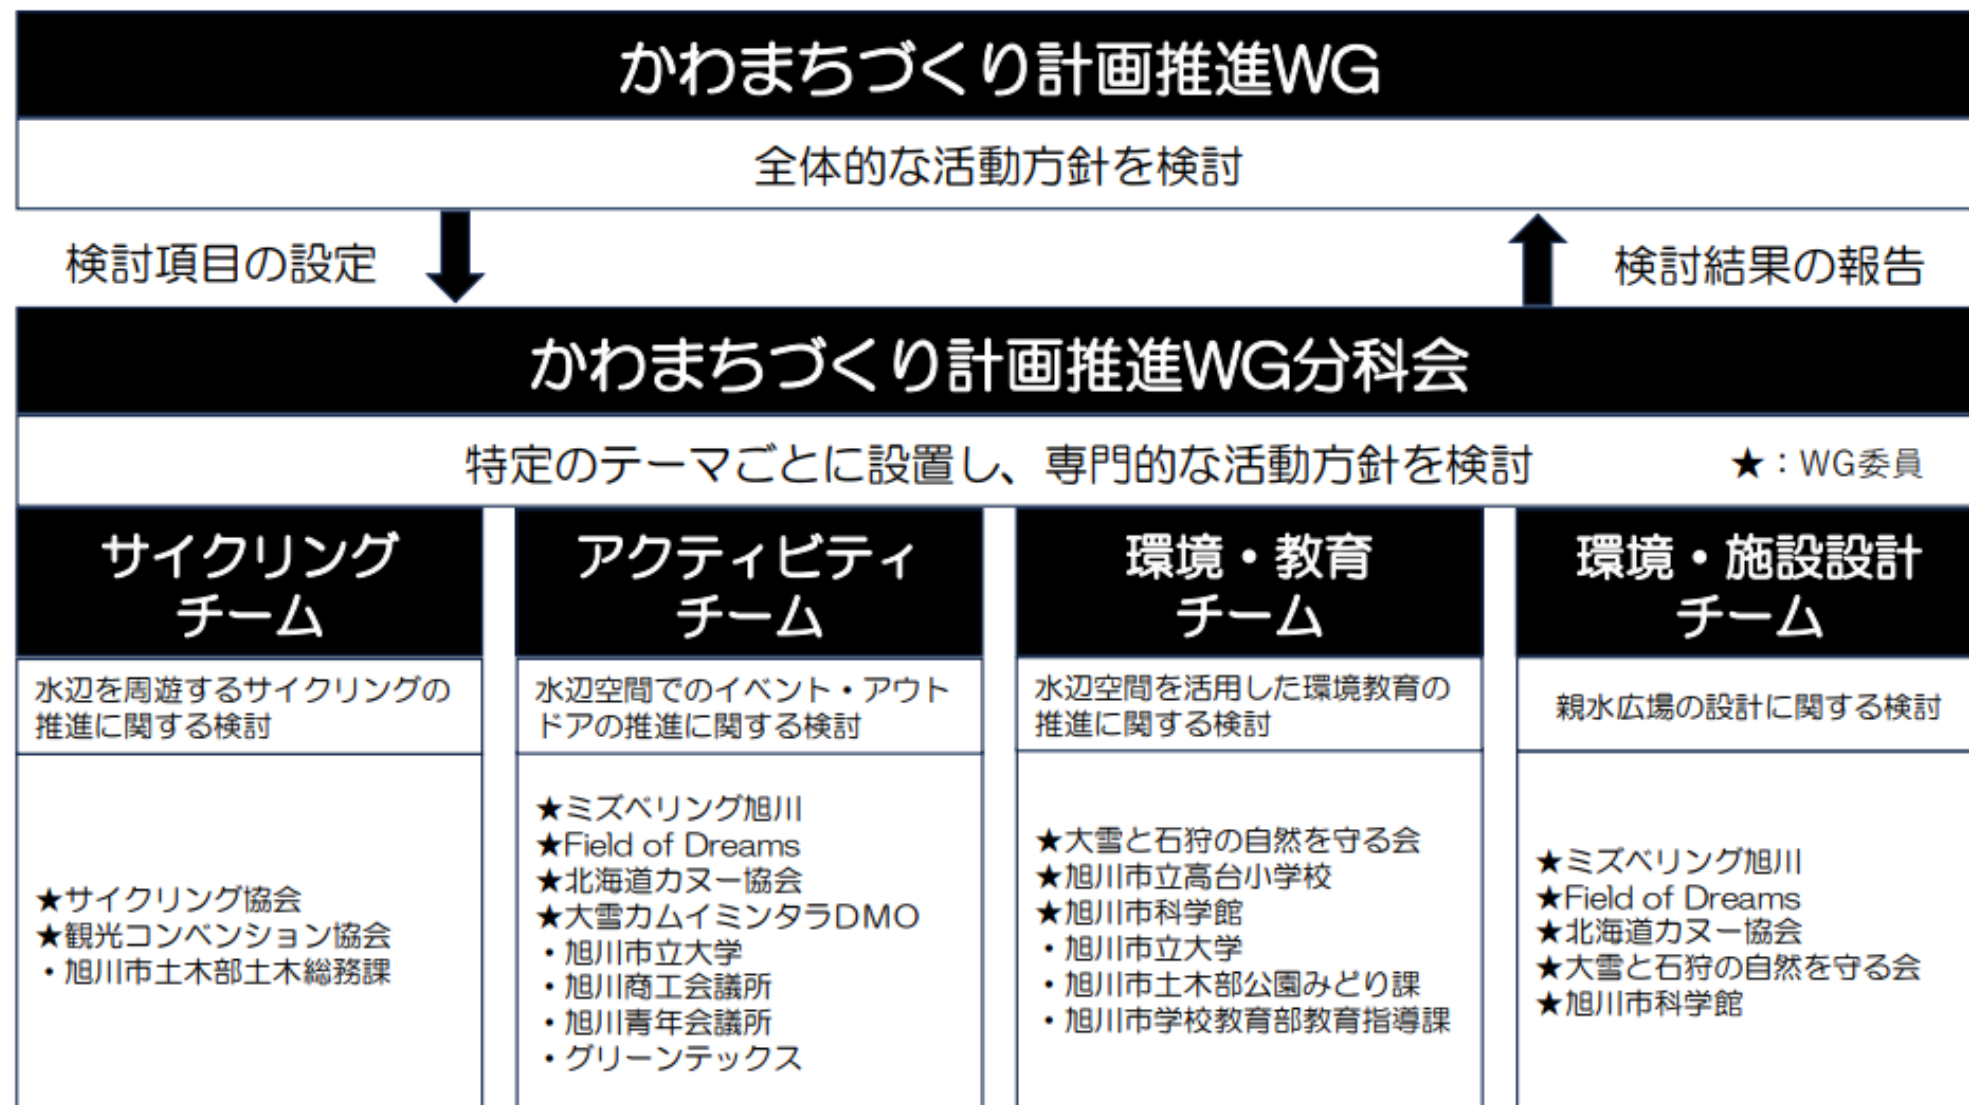

(6) 今後のスケジュール

今年度のスケジュール(案)

月	「旭川駅周辺かわまちづくり計画」推進WG	
	利活用	施設整備
4月		
5月		
6月		現地確認（ツインハープ橋上流・神楽岡公園整備予定箇所）
	第6回推進WG（当該年度の活動内容共有（ハード整備も含む）、意見交換）	
7月		
8月	第1回分科会（案件に応じて開催：施設設計チームは回数増の可能性あり）	
9月		
10月		現地確認（サイクリング路面表示箇所：施工の見直しあり）
	第7回推進WG（当該年度の活動内容共有（ハード整備も含む）、意見交換）	
11月		
12月	第2回分科会（案件に応じて開催：施設設計チームは回数増の可能性あり）	
1月		
2月	第8回推進WG（当該年度の活動実施内容共有、次年度の活動内容共有、推進方針の点検等）	
3月		
